

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

工程 监 理 周 报

(2019 年 12 月 16 日 至 2019 年 12 月 22 日)

批 准: 徐耀年

审 核: 孔令才

编 制: 孔令才

编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理部



2019 年 12 月 22 日

一、参建单位信息

建设单位：衡南煜盟新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中广达能源电力工程设计有限公司（光伏区）

衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司（外线）

施工单位：湖南中程电力工程有限公司

二、本周完成工作量

开关站：SVG 变压器、接地变、一次仓、二次仓等基础砖墙砌筑和基础梁柱混凝土浇筑，生活仓底板混凝土浇筑。

光伏区：光伏区桩位基础放点完成，4 区桩位累计钻孔 122 个、灌注桩 50 个。

三、下周计划完成工作量

开关站：一次仓、二次仓等基础顶梁钢筋绑扎和混凝土浇筑，生活仓基础立柱支模和混凝土浇筑。


光伏区：光伏区 4 区、6 区桩位钻孔和混凝土灌注。

四、存在问题


1、开关站设备和光伏区支架、组件等主要材料进场进度缓慢，已严重影响工程进度，已督促相关单位加快进度。

2、因天气等原因，施工进度缓慢，已督促相关施工单位采取措施加快施工进度。


五、工程影像资料

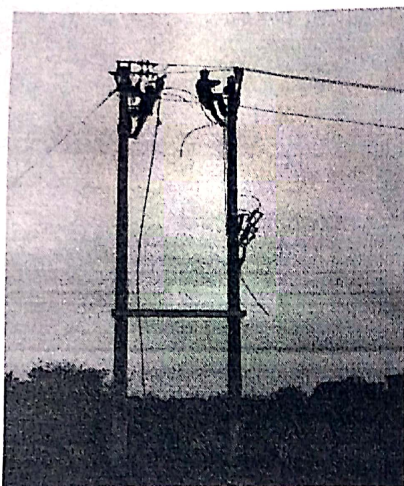

站用变外线施工

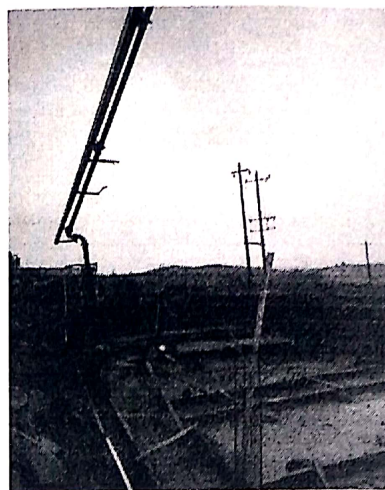

生活仓基础底板混凝土浇筑

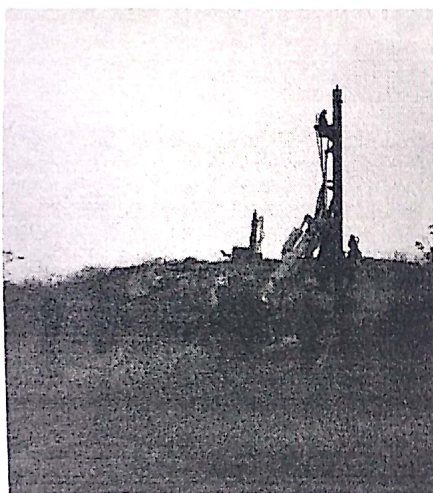

光伏区钻孔施工



生活仓接地网制作



监理人员巡视检查



进场设备检查
