

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

工程 监 理 周 报

(2019 年 12 月 2 日 至 2019 年 12 月 8 日)

批 准: 徐耀奎

审 核: 孔令才

编 制: 王峰

编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理部



2019 年 12 月 6 日



扫描全能王 创建

一、参建单位信息

建设单位：衡南煜盟新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中广达能源电力工程设计有限公司、衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司

施工单位：湖南中程电力工程有限公司

二、本周完成工作量

1、场区道路修整完成。

2、开关站变压器基础、SVG 基础、接地变基础、一次舱基础、二次舱、移交舱基础放点完成。

3、开关站变压器基础、SVG 基础、接地变基础、一次舱基础、二次舱、移交舱基础开挖完成，垫层浇筑完成。

4、召开第一次工地例会。

三、下周计划完成工作量

1、开关站变压器基础、SVG 基础、接地变基础、一次舱基础、二次舱、移交舱基础底板浇筑完成。

2、光伏区支架基础放点完成 10%。

3、支架配套材料进场。

4、箱变基础开挖。


四、存在问题

1、设计院生活舱图纸未提交，业主协调设计院尽快出图。

2、设计院箱变基础图纸未提交，业主协调设计院尽快出图。



五、工程影像资料

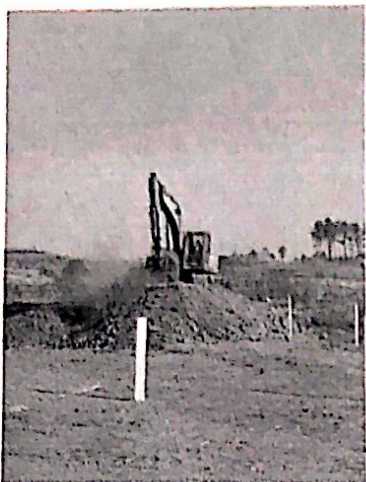


场区道路施工



开关站放点




SVG 基础开挖

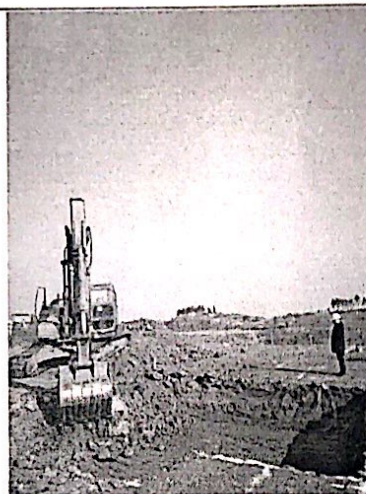

变压器基础开挖



开关站基础验槽



开关站基础垫层浇筑

