

编号: ZHJL-JLZB-20200531

监 理 周 报

(2020 年 5 月 25 日~2020 年 5 月 31 日) 第 08 期

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师:

徐耀生

监理项目部 (章)



报告日期: 2020 年 05 月 31 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

屋面桥架、维修通道、逆变器、围栏已安装完成；组件到货 2592 块因到货检测有隐裂，故暂时不让安装，待协商好后才可以安装。低压电缆、光伏电缆（缺）未到现场。

2、设计图纸情况

设计院盖章的已到项目部

3、工程资料情况

让总包单位尽快提交资料

4、需调解事宜

分包单位提供的材料不能及时到场，造成各项工作不能及时完成。尽快给出组件的处理意见。

2 本周监理工作情况

1) 到施工现场查看施工进度；

2) 由于分包单位提供的材料不能及时到场，造成每项工作不能彻底完成；

3) 总包单位施工资料不及时；

4) 对现场不符合安装要求的工序，让总包单位整改；

5) 对组件的检测进行监督；

3 工程存在问题及建议

组件问题需尽快解决；

4 下周监理工作重点

监督总包单位现场安全的落实情况；


督促总包的施工过程资料要与进度同步；

常州正衡电力工程监理有限公司

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 05 月 31 日



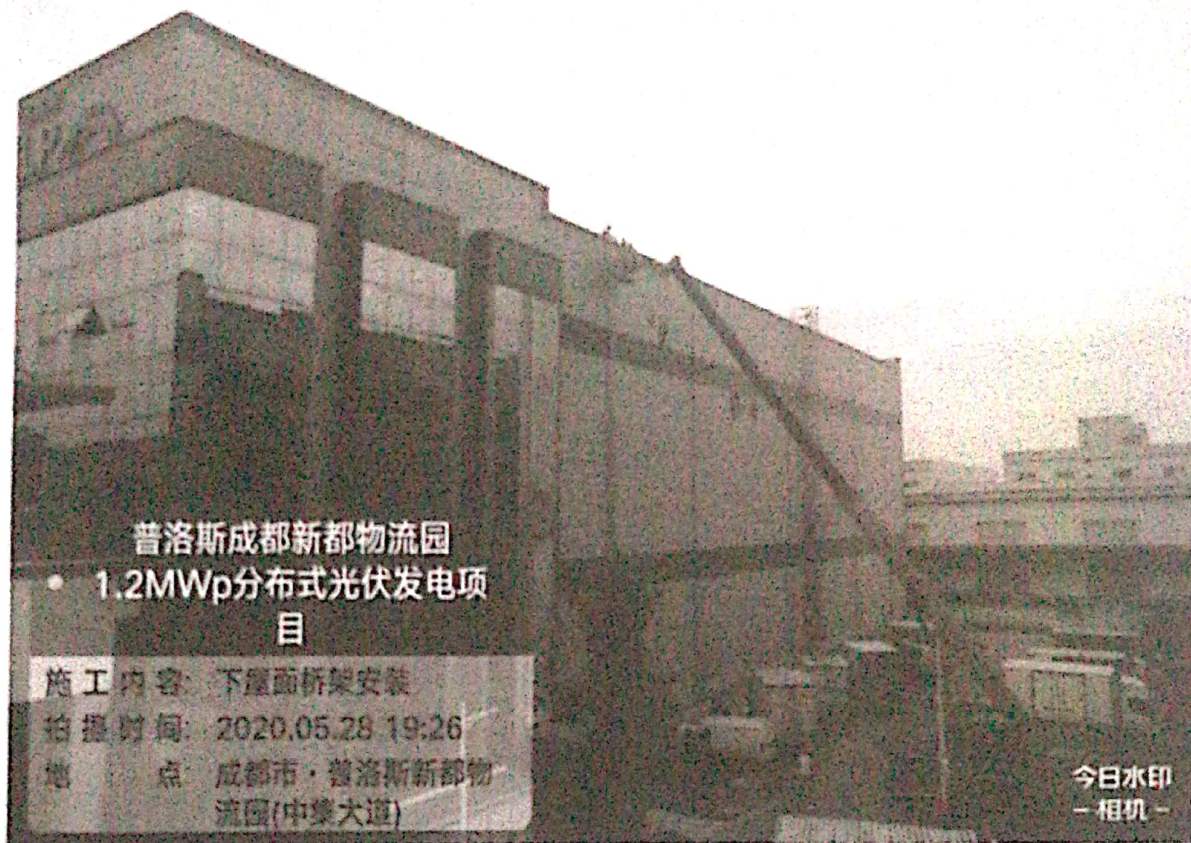

普洛斯成都新都物流园
• 1.2MWp分布式光伏发电项目

施工内容: 下屋面桥架安装
拍摄时间: 2020.05.28 19:26
地点: 成都市·普洛斯新都物流园(中集大道)

今日水印
- 相机 -



普洛斯成都新都物流园
• 1.2MWp分布式光伏发电项目

施工内容: EL测试
拍摄时间: 2020.05.31 21:51
地点: 成都市·普洛斯新都物流园(中集大道)

今日水印
- 相机 -
