

普枫建设项目监理周报

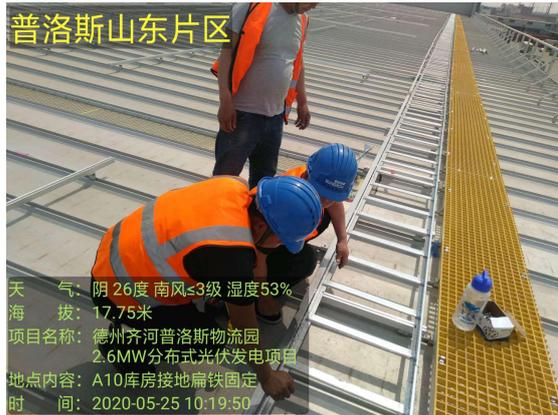
一、项目基本信息：

区域	项目及容量	状态
德州、济南	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	A10、A4 库房导轨、围栏、检修通道、接地焊接、电缆穿管、母线桥、桥架安装工作完成, 组件进场完成, 电缆敷设开始;
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	B2 库房导轨、检修通道、围栏安装、接地焊接、桥架安装、电缆敷设、母线桥安装工作完成, 组件进场完成,

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	14-27	17-27	14-31	17-27	14-29	22-33	20-34
	多云	晴	晴	晴	晴	晴	多云
原材料进场	逆变器、并网柜、支架及配件、格栅板、接地扁铁、围栏、过路穿管、电缆、桥架、组件进场						
工程进度	计划			实际完成			
	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	组件进场安装检查, 桥架安装检查, 电缆敷设检查。			A10 桥架安装完成, A4 库房桥架安装完成, 组件进场检查检测。		
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	组件进场检查、安装检查, 清洗系统安装检查			组件进场检查, 清洗系统安装完成		
质量监督	1 监理日常监督及材料抽检, 桥架安装检查;						
下周重点工作	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	做好施工人员安全、防疫工作, 组件安装检查, 电缆敷设检查。 厂家进场 EL 重新检测。					
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	做好施工人员安全、防疫工作, 组件进场检查、安装检查。					
急需协调事宜	1、组件进场 EL 检测及时出决议, 进行安装。						

一、 现场照片：

 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：阴 20度 东北风≤3级 湿度68% 海拔：12.98米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：组件进场 时间：2020-05-23 08:51:19</p>	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 27度 东北风≤3级 湿度28% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：资料审核签字 时间：2020-05-27 17:58:09</p>
<p>组件进场</p>	<p>资料审核签字</p>
 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：阴 26度 南风≤3级 湿度53% 海拔：17.75米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房接地扁铁固定 时间：2020-05-25 10:19:50</p>	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 24度 东南风≤3级 湿度59% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：组件EL检测 时间：2020-05-26 19:59:19</p>
<p>A10 接地固定</p>	<p>EL 检测</p>
 <p>普洛斯山东片区</p> <p>天气：晴 25度 东风≤3级 湿度43% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：组件安装培训 时间：2020-05-26 15:38:02</p>	
<p>组件安装培训学习</p>	<p>组件检查</p>
