

普枫建设项目监理周报

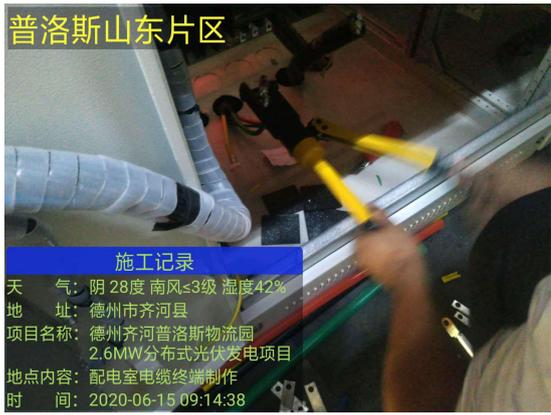
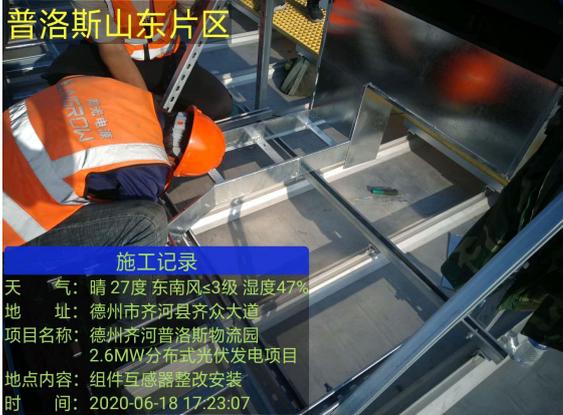
一、项目基本信息：

区域	项目及容量	状态
德州、济南	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	A10、A4 库房导轨、围栏、检修通道、接地焊接、电缆穿管、母线桥、桥架安装工作完成, 组件进场检测完成, A10 库房电缆敷设, 组件安装完成 0.7MW, 电表安装完成电缆终端制作完成 50%;
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	B2 库房导轨、检修通道、围栏安装、接地焊接、桥架安装、电缆敷设、母线桥安装工作完成, 组件进场检测完成, 并网柜改造完成, 电表二次申请完成

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	23-34	19-34	19-34	20-33	20-25	17-27	18-30
	多云	晴	中雨	中雨	中雨	中雨	晴
原材料进场	逆变器、并网柜、支架及配件、格栅板、接地扁铁、围栏、过路穿管、电缆、桥架、组件进场						
工程进度	计划			实际完成			
	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	组件安装检查, 电缆终端制作检查。A4 库房接地焊接完成检查			组件安装完成 0.7MW, 配电室电缆终端制作完成, 逆变器桥架安装完成。A4 库房接地焊接完成一半。		
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	组件安装检查。并网柜改造。			剩余组件未进场, 并网柜改造完成		
质量监督	1 监理日常监督及材料抽检, 电缆敷设检查; 组件安装检查个别存在问题, 为确保 630 并网, 存在问题并网后消缺整改完。						
下周重点工作	普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目	做好施工人员安全、防疫工作, 现场组件 3794 块安装完成。直流电缆敷设完成、交流电缆终端制作安装完成, 变电站验收完成。					
	普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目	做好施工人员安全、防疫工作, 现场组件 715 块安装完成检查。交流电缆终端制作完成, 电表安装完成。					
急需协调事宜	1、组件厂家 EL 检测完成不符合要求组件清场, 补货剩余组件未进场。2、组件安装安全培训。						

一、 现场照片：

 <p>普洛斯山东片区</p> <p>施工记录 天气：晴 30度 南风≤3级 湿度36% 地址：济南市历城区机场西路 工程项目：济南普洛斯有限公司800KW 分布式光伏发电项目 地点内容：并网柜改造 时间：2020-06-19 14:33:57</p>	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>施工记录 天气：晴 24度 南风≤3级 湿度61% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：1-4#并网柜电表安装 时间：2020-06-18 12:14:46</p>
<p>并网柜改造</p>	<p>电表安装</p>
 <p>普洛斯山东片区</p> <p>施工记录 天气：阴 26度 南风≤3级 湿度50% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：配电室电缆终端制作 时间：2020-06-16 09:10:21</p>	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>施工记录 天气：阴 28度 南风≤3级 湿度42% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：配电室电缆终端制作 时间：2020-06-15 09:14:38</p>
<p>检查电缆终端制作</p>	<p>电缆终端制作</p>
 <p>普洛斯山东片区</p> <p>施工记录 天气：多云 30度 西风≤3级 湿度39% 地址：德州市齐河县 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A10库房组件安装 时间：2020-06-15 17:25:34</p>	 <p>普洛斯山东片区</p> <p>施工记录 天气：晴 27度 东南风≤3级 湿度47% 地址：德州市齐河县齐众大道 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：组件互感器整改安装 时间：2020-06-18 17:23:07</p>
<p>组件安装</p>	<p>逆变器桥架安装</p>
