

 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

监 理 周 报

第 08 期

监理单位编制人：焦鹏飞

监理单位审核人：张建忠

编 制 时 间：2020 年 4 月 26 日

常州正衡电力工程监理有限公司

通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目监理部



 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

项目名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

建设单位：公安县通威渔光科技有限公司

设计单位：(升压站、外线)特变电工沈阳电力勘测设计有限公司

光伏区：通威新能源工程设计四川有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：特变电工国际工程有限公司公安输变电工程项目

青海驰腾电力自动化有限公司

安徽元正新能源电力有限公司

中电建湖北电力建设有限公司

一、项目概况

本光伏工程项目位于湖北省荆州市公安县藕池镇，地理中心坐标为经度 $112^{\circ} 19'$ ，纬度 $29^{\circ} 45'$ 。项目装机容量为 100MWp，建设形式为渔光一体电站，并配套建设 1 座 110KV 升压站，通过 110KV 架空线路接入 10 公里外的藕池变电站，该项目由通威新能源科技（北京）有限公司投资建设，运行周期 25 年。

二、本周材料、设备进场情况

1、光伏区：管桩到场 747 根、支架到货 3 车，组件到货 9984 片，电缆到货 3 车。

2、升压站：部分钢筋到场；GIS、主变附件到场。

三、本周施工情况

1、目前外线铁塔组立全部完成；累计完成 30 基，完成率 100%，N1-N8 引线施工完成；升压站完成 SVG 箱式基础、接地变基础钢筋绑扎、基础支



 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

模、浇筑完成；SVG 电缆支架基础开挖；电缆沟开挖、回填、基础钢筋绑扎完成 20M，完成 20%；综合楼基础基坑开挖；部分接地工程和部分回填施工；光伏区 2#打桩完成，高洪村、育苗池料场基本完成，道路基本能够通行，2#区域支架安装完成 41 组，完成 80%；组件试装一组，21#引孔 1400 根；11#试桩完成。

四、施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面，施工现场临时用电还需进一步完善，接地施工不规范，通过监督指导，基本满足设计要求。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现个别作业人员有违规现象，监理及时给予指正。

五、监理单位履行监理责任情况：

1、要求施工单位做好安全、质量管理工作，对到场材料进行送检，做好新员工进场三级安全教育培训，并对每个施工人员买人身意外保险，同时进行体检。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

3、跟踪升压站施工，要求施工单位认真审阅图纸，发现问题立即通知施工单位整改。



 正衡监理 ZhengHengSupervision	名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目
	文件名称	监理周报

4、每天对施工现场进行巡检，对外线铁塔组立安全旁站 2 次、管桩卸车安全旁站 3 次、组件到货卸车 3 次、旁站升压站 SVG、接地变设备基础浇筑、综合楼基础基坑开挖、接地施工各旁站 1 次；主持召开工程例会 1 次，督促施工单位做好资料同步，主动联系业主和施工单位，进行工作熟悉和沟通，对到场材料要求尽快见证送检，同时对施工单位提出安全 and 质量规范要求。

六、下周施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，针对的经常下雨打雷天气因素，加强对现场安全用电的管理。要求施工施工必须佩戴安全帽，穿反光背心，加强安全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

七、其它


1、升压站 24 日主变附件到场、GIS 22 日到场；

3、监理合同于 2019 年 12 月 8 日签订，2019 年 12 月 12 日监理到场进驻，业主对监理到场已确认签字。

八、项目监理周报影像文件

文字描述	11 区域试桩	主变散热片安装
		

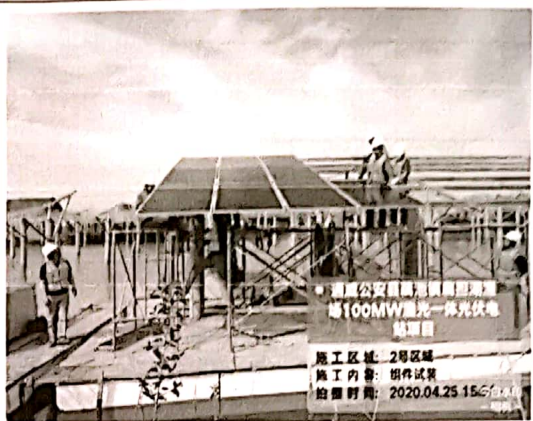

 正衡监理 ZhengHengSupervision		名称项目	通威公安县藕池镇扁担湖渔场100MW渔光一体光伏电站项目
		文件名称	监理周报
文字描述	管桩到货卸车	组件试装	
	 通威公安县藕池镇扁担湖渔场100MW渔光一体光伏电站项目 施工区域: 材料堆场 施工内容: 管桩卸车 拍摄时间: 2020.04.26 07:18	 通威公安县藕池镇扁担湖渔场100MW渔光一体光伏电站项目 施工区域: 2号区域 施工内容: 组件试装 拍摄时间: 2020.04.25 15:57	
文字描述	升压站综合楼基础基坑开挖	现场巡检	
	 通威公安县藕池镇扁担湖渔场100MW渔光一体光伏电站项目 施工区域: 升压站 施工内容: 综合楼基坑开挖 拍摄时间: 2020.04.25 08:33		
文字描述	升压站电缆沟底板浇筑	SVG 箱式基础验模	
			

