

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 02 期

项目：苏州海德新材公司屋顶 0.95MWp 分布式光伏发电项目（一期 0.65MWp）		填报周期：2019.12.19-2019.12.26		
本周工作如下： 1、支架和组件已经全部完成。 2、已开始进行接线和逆变器的安装准备并网。 需协调与帮助 1.无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装	支架已完成，组件已完成			
6、逆变器及箱变	逆变器安装 6 台			
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已出图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
	组件		2019.12.13	
11、人员/机械				


情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装	12.14		12.19	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 12: 30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人：邵浩杰 审核人：杜召栋 时间：2019 年 12 月 25 日

现场照片（含文字描述）：



组件吊装

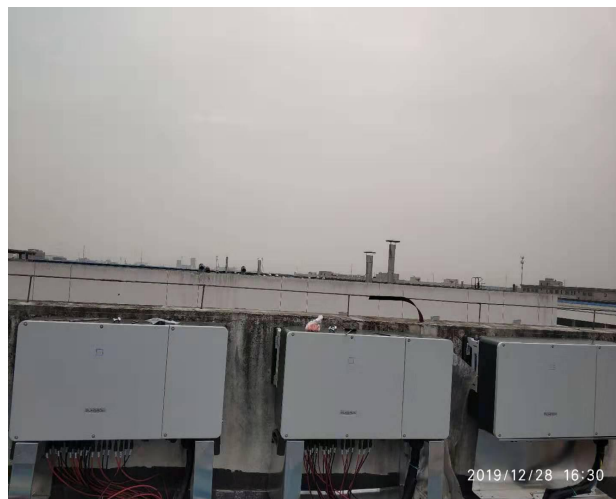

逆变器安装
