

编号: ZHJL-JLZB-20201011

监 理 周 报

(2020 年 10 月 04 日~2020 年 10 月 11 日) 第 12 期

武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师:

徐耀生

监理项目部(章)



报告日期: 2020 年 10 月 11 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

- 1) 江夏供电局已验收，等业主合同上交盖章后装表；
- 2) 横天邦送组件、逆变器、围栏、走道板、桥架安装完成、直流电缆接线完成；
- 3) 黄陂一期组件、护栏、走道板、桥架、逆变器安装完成，交、直流电缆接线完成；
- 4) 黄陂二期夹具、导轨安装完成；
- 5) 监控厂方人员到场施工；

2、设计图纸情况

加固施工图自有电子版，屋面组件图纸质版一套（施工单位）。

3、工程资料情况

项目施工资料无

4、需调解事宜

无

二、 本周监理工作情况

- 1) 到施工现场查看安全措施落实情况；
- 2) 查看施工进度、质量及文明施工情况，对不合格工序要求现场整改；
- 3) 及时了解施工的进度及人员情况，让总包单位合理安排作业时间及人员；
- 4) 召开施工进度及施工质量会议。



三、 工程存在问题及建议

施工人员不稳定

四、 下周监理工作重点

监理合同到期，整理项目监理资料准备上交！



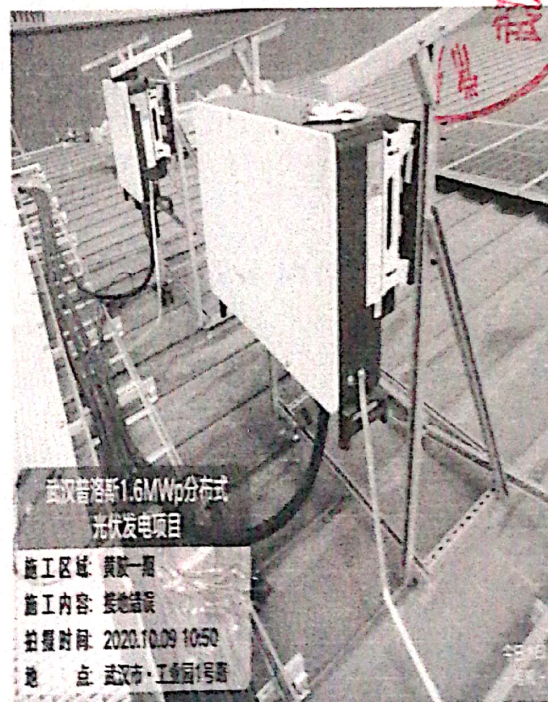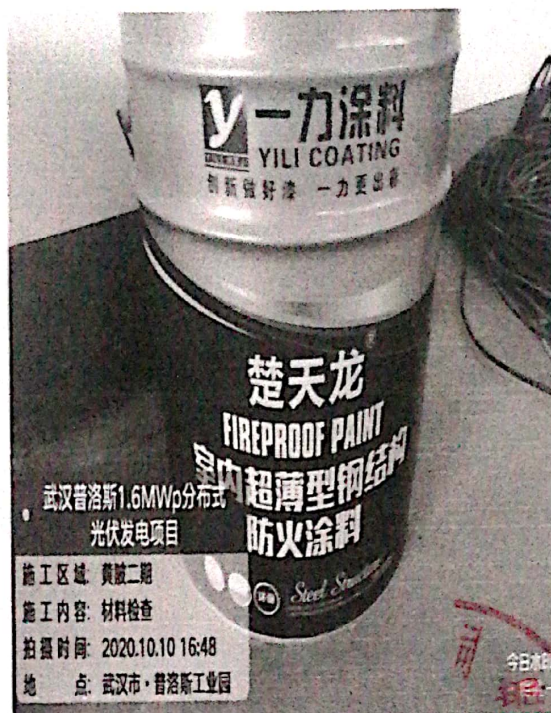

常州正衡电力工程监理有限公司

武汉监理项目部

2020年10月11日
