

编号: ZHJL-JLZB-20200830

监 理 周 报

(2020 年 08 月 24 日~2020 年 08 月 30 日) 第 06 期

武汉普洛斯物流园屋顶 1.6MWp 分布式光伏发电项目

总监理工程师: 徐耀生

监理项目部 (章)



报告日期: 2020 年 08 月 30 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

- 1) 江夏电缆敷设完成，
- 2) 并网柜与原园区配电柜连接已确定好停电时间（30日下午3点至5点），
- 3) 黄陂加固开始施工，屋面防护围栏开始施工，
- 4) 横天邦送的电缆沟已完成，等待顶管队伍进场施工，

2、设计图纸情况

加固施工图自有电子版，屋面组件图纸纸质版一套（施工单位）。

3、工程资料情况

开工报审资料还未上报到监理部

4、需调解事宜

无

二、 本周监理工作情况

- 1) 到施工现场查看安全措施落实情况；
- 2) 查看施工进度及质量，对不合格工序要求现场整改，
- 3) 及时了解施工的进度及人员情况，让总包单位合理安排人员，
- 4) 到斜撑加工处，对焊接质量进行检验，并对施工单位采购的铜排进行检验，

三、 工程存在问题及建议

现场施工人员极少，要求总包单位增加人员。

四、 下周监理工作重点



加强对现场的巡视检查，杜绝安全事故的发生，确保项目在零事故的前提下保质按时完成；要求施工单位时刻保持安全操作流程。

常州正衡电力工程监理有限公司

武汉监理项目部

2020年8月30日



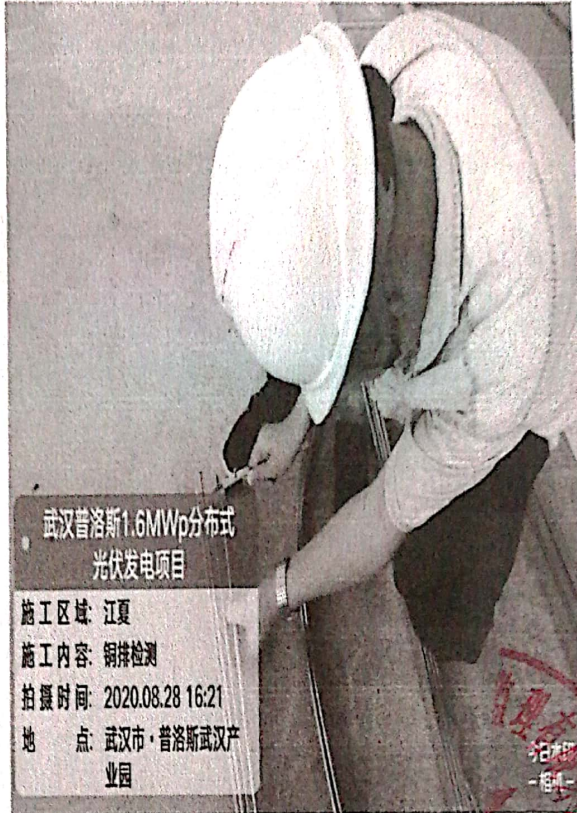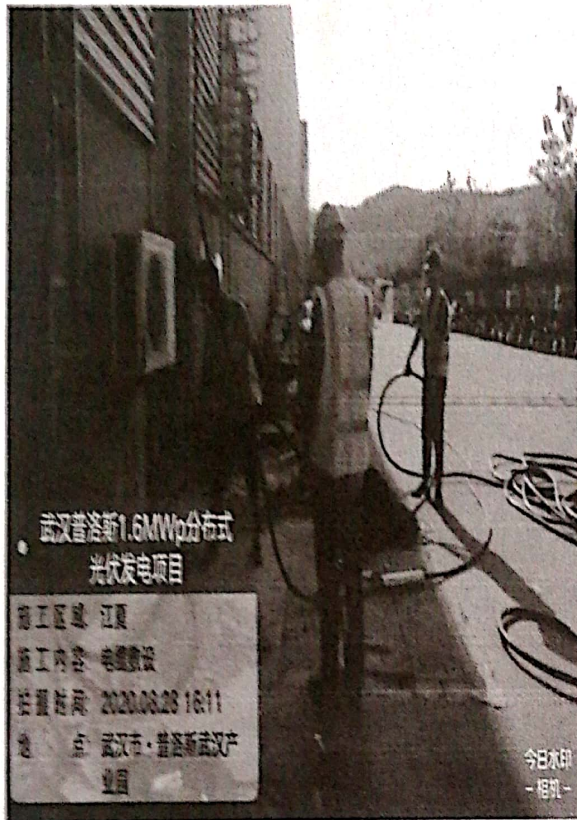

项目部

