

普枫建设项目监理周报


一、项目基本信息：

区域	项目及容量	状态
安徽合肥	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目	正常施工

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
	7~29℃	5~23℃	8~28℃	7~24℃	9~23℃	9~22℃	8~21℃
原材料进场							
工程进度	下周计划				本周实际完成		
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目		1、车棚组件安装 0.4MW，累计完 1.4MW，完成 90%。 2、高低压电缆敷设、1-2 号成品库屋面下挂桥架安装。 3、低压并网。 4、车棚电缆沟开挖，敷设电缆 5、车棚钢结构安装		1. 4 区车棚组件安装约完成 1.1MW 2. 1-3 区车棚基础已开挖，待浇筑 3. 所有设备均已完成吊装就位，待接线安装调试 4. 屋面组件已全部完成，电气施工约完成 55%，交流电缆已敷设，待引下与设备连接 5. 配电房低压柜已完成改造，明日供电局进行检查验收		
质量监督	监理日常监督：						
下周重点工作	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目			组件安装巡检，对屋面电气进行专项检查验收，钢结构车棚基础浇筑现场旁站，供电局验收			
急需协调事宜	暂无						


三、现场照片：

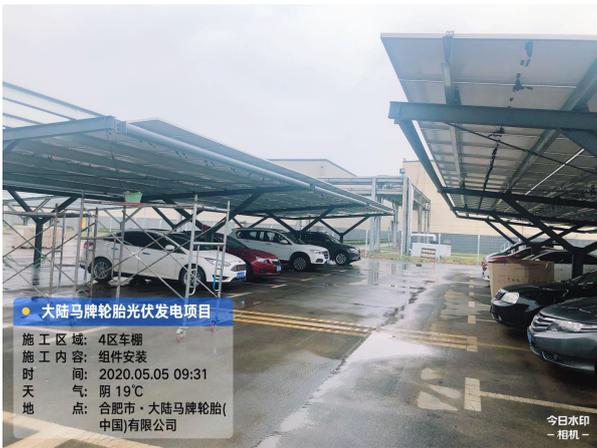

4 区车棚组件安装



箱变就位

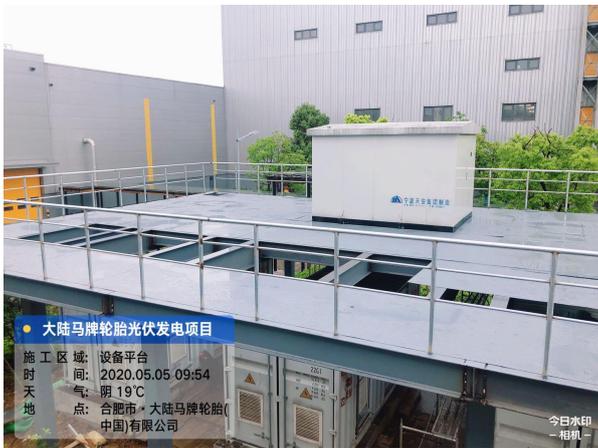

设备吊装



设备吊装



设备吊装



所有设备均已就位



1区车棚基础开挖

预埋螺栓固定



电缆沟切割

设备接地施工
