

普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息:

区域	项目及容量	状态
安徽合肥	合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目	正常施工

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目	情况概括						
上周天气	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
	6~23℃	11~29℃	8~28℃	7~24℃	9~23℃	9~22℃	8~27℃
原材料进场							
工程进度	下周计划				本周实际完成		
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目		1、车棚组件安装 0.5MW，累计完 1.8MW, 完成 100%。 2、高低压电缆敷设。 3、低压装表送电。 4、1-3 区车棚钢结构安装 5、1-3 区车棚组件安装		1. 4 区车棚组件安装约完成 1.1MW 2. 1、2 区车棚钢构已安装，待檩条安装，3 区车棚基础进行回填 3. 屋面所有交流电缆敷设完成，均已接至箱变低压端 4. 清洗系统完成 20%		
质量监督	监理日常监督：						
下周重点工作	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目			检查验收，对各设备进行送电前专项检查，低压并网推进			
急需协调事宜	暂无						

三、现场照片:



供电局检查验收




4 区车棚组件安装完成



交流线缆敷设



车棚基础浇筑

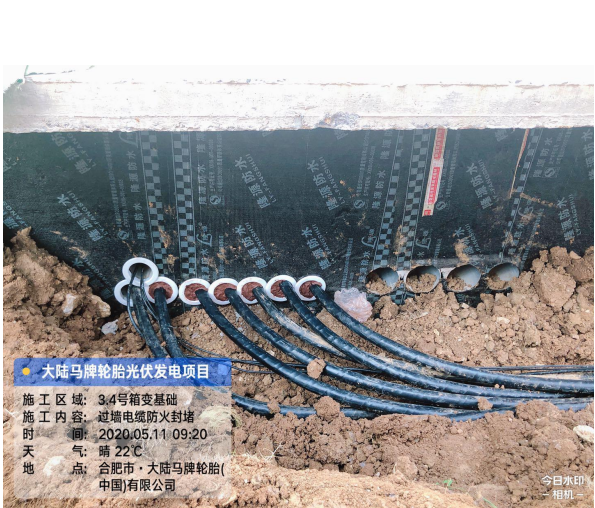

电缆沟隐蔽铺沙盖砖



电缆过墙防火封堵



1 区车棚基础土方夯实

钢构到场



到场钢构检查



4区车棚清洗系统施工



3区车棚基础回填



2区车棚电缆沟切割
