

交口县水头镇光伏发电平 价上网项目 监 理 周 报

(2021年3月20日至2021年3月26日)

编制人：张栋

批准人：汪家骏

常州正衡电力工程监理有限公司

交口县水头镇光伏发电平价上网 项目监理部

2021年3月26日

1. 工程综合实施进展情况

1.1. 人员情况

- a. 中南勘察基础工程有限公司：施工人员 10 人。
- b. 海原鑫源建筑有限公司：施工人 15 员。
- c. 宁夏建博建筑工程有限公司：施工人员 3 人。
- d. 江苏东软智能科技有限公司：管理人员 6 人，施工人员 11 人。
- e. 四川优博景成建筑工程有限公司：施工人员 5 人。
- f. 江苏燕山光伏设备有限公司：管理人员 4 人，施工人员 8 人。
- g. 华安安装工程有限公司：施工人员 12 人。
- h. 四川宏佳建设工程有限公司：施工人员 8 人。

1.2. 设备情况一览表

单位名称	机 械 设 备									车 辆				合计
	经纬仪	水准仪	搅拌站	发电机	弯曲机	电焊机	钻孔机	铲车	三轮车	工程车	挖掘机	泵车	拖拉机	
海原鑫源建筑有限公司								1			1			2
四川宏佳建设工程有限公司	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0	0	2
华安安装工程有限公司											1			1

1.3 工程综合进展情况:

1) 海原鑫源建筑有限公司;

箱变找平及模版拆除完成, 南北区围栏维修完成。箱变模具已清除场区, 坏桩已修复。

2) 中南勘察基础工程有限公司;

52区 53区 7人围栏灌桩和 45区 46区二次灌浆, 做明天新修道路准备工作

3) 宁夏建博建筑工程有限公司

2区处理通讯!

4) 江苏东软智能科技有限公司

土建 79#二次浇筑及 29#、78#挂网, 喷浆 9#、12#和地锚补遗 79#和 80#;
安装在 78#、80#、81#和 29#区消缺;

5) 四川优博景成建筑工程有限公司

碎石地坪下沉找平完成; 道路灌浆完成 70%;

6) 江苏燕山光伏设备有限公司

3区 4区消缺人员 8人

7) 华安安装工程有限公司

10区消缺补线 15组。组串喷码完成 5个区。7区逆变器接线 2台。

8) 四川宏佳建设工程有限公司

26#护坡浇筑 19根。

2. 体系运行情况：

正常

3. 质量情况：

1) 围栏安装不规范；

4. 安全情况：无

5. 进度分析及建议：

光伏区、外线施工及升压站各施工单位施工进度缓慢，建议施工方采取增加机械设备和施工人员数量的办法，完成施工任务。

5. 本周监理重点工作：

安全第一，继续督促参建方安全落实情况。

加强对进场材料进行检查、见证取样等，对施工现场加强巡视检查工作，根据相关规范和工程设计文件，严格把关。

6. 有关监理工作的建议：

无

7. 需协调解决的问题：

无

9. 下周工作计划：

1、江苏东软智能科技有限公司：

土建在斜坡 25 人 80#、10#、29#和 37#消缺。安装 27 人 78#、80#、81#、82#和 29#区消缺。

2、华安安装工程有限公司

8 区做接地，组串喷码，处理 0 电流，消缺，桥架安装

3、江苏燕山光伏设备有限公司

5 区 6 区消缺。

4、中南勘察基础工程有限公司

围栏安装和二次灌浆，补桩，如果天气晴天就开始修路

5、海原鑫源建筑有限责任公司

围栏斜层消缺


6、四川宏佳建设工程有限公司

26#护坡浇筑。

7、宁夏建博建筑工程有限公司

3区处理通讯。

形象进度照

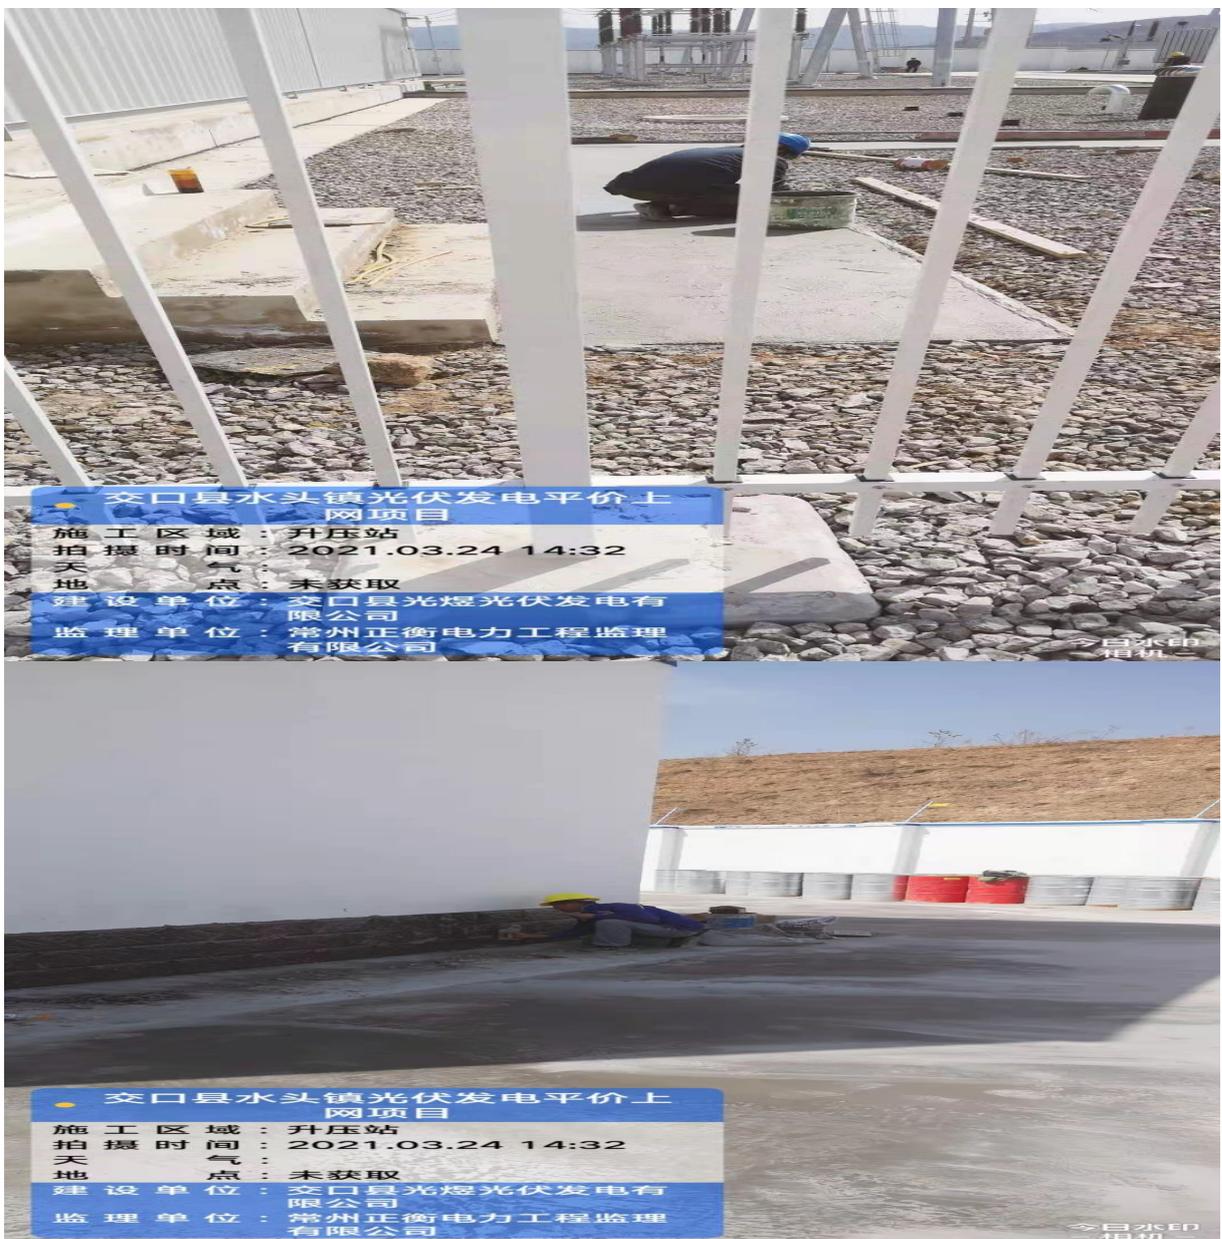





交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域：升压站
拍摄时间：2021.03.25 14:37
天气：
地点：未获取

建设单位：交口县光煜光伏发电有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
- 相机 -
真实时间




交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域：升压站
拍摄时间：2021.03.24 14:32
天气：
地点：未获取

建设单位：交口县光煜光伏发电有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
- 相机 -

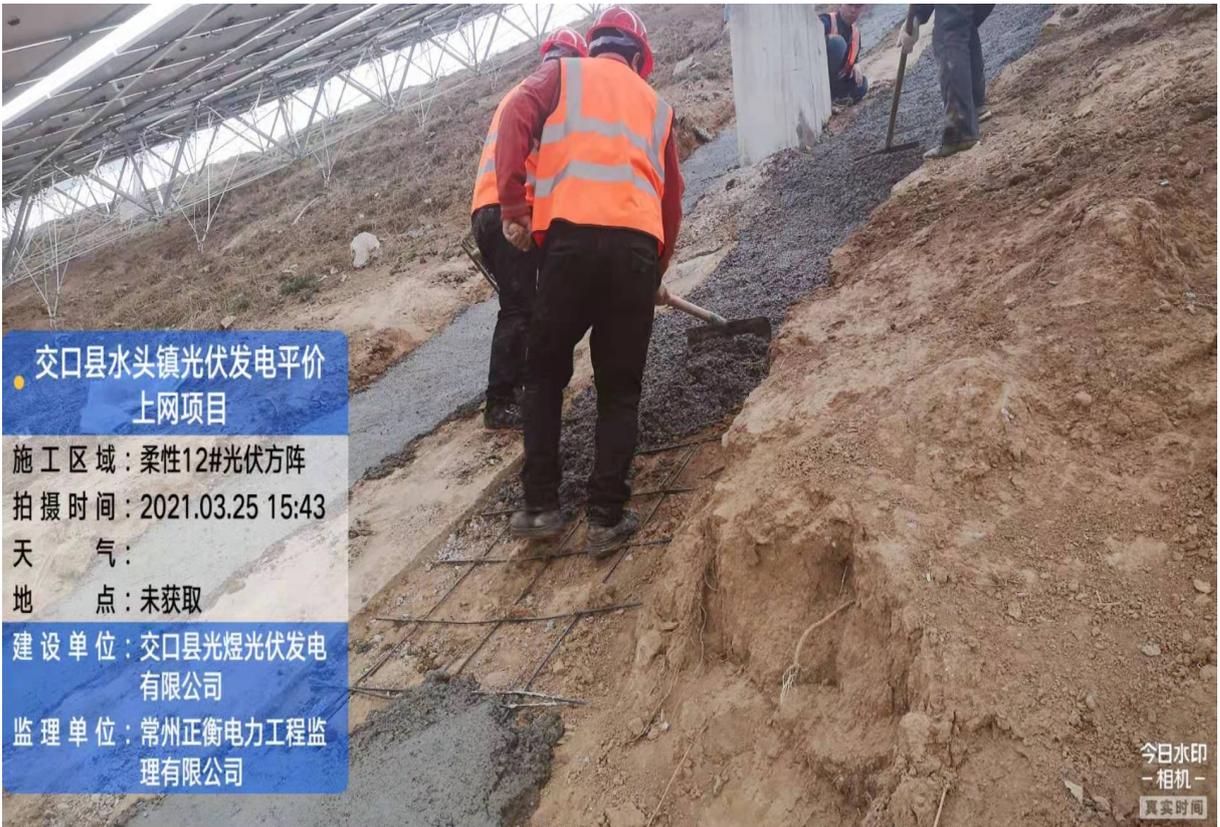

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域：柔性12#光伏方阵

拍摄时间：2021.03.25 15:43

天气：

地点：未获取

建设单位：交口县光煜光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
-相机-
真实时间



交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域：升压站

拍摄时间：2021.03.24 14:33

天气：

地点：未获取

建设单位：交口县光煜光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
-相机-
真实时间

