

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周报

第 12 期

(2020 年 7 月 13 日-2020 年 7 月 19 日)

提交部门: 监理项目部
编 制: 南玉荣
签 发 人: 王立杰
日 期: 2020 年 7 月 19 日

监 理 周 报

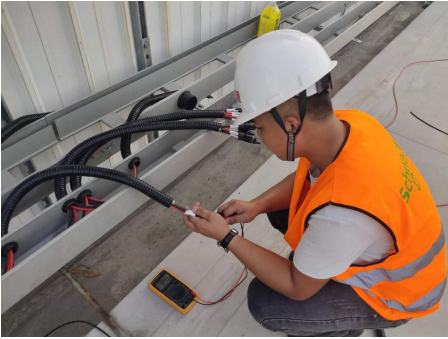
项目名称: 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间: 2020/07/19

施工概况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架安装完成。 5、逆变器安装 8 台。 6、组件全部安装完成。 7、直流电缆全部敷设完成。 8、接地圆钢分散分散到位。
材料进场情况	本周气象站、视频监控到场。
材料进场检验	检查到出厂设备外观、合格证及出厂检验报告
隐蔽验收情况	无
发文情况	无
安全情况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、交流电缆桥架全部安装完成。 2、并网柜到场安装 3、接地圆钢连接 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工人员正确佩戴安全帽，遵守厂区制度。 2、要求施工单位给配电房施工人员安全技术交底，检查进场施工人员保险。 3、夏季施工，屋面温度较高，要求施工单位天气情况调整施工时间，做好防暑工作。 4、催促施工单位对进场材料设备报审，监理通知单内容整改回复。
现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 屋面防水修补 拍摄时间: 2020.07.13 18:13 天气: 雨 32°C 今日水印 - 相机 -  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 配电房安全防护网 拍摄时间: 2020.07.13 09:38 天气: 多云 31°C 今日水印 - 相机 -  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: 配电房并柜基础开挖 拍摄时间: 2020.07.13 16:57 天气: 雨 33°C 今日水印 - 相机 -  施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容: MC4接头连接 拍摄时间: 2020.07.14 17:14 天气: 晴 33°C 今日水印 - 相机 -

现场施工照片	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容：并网柜基础浇筑 拍摄时间：2020.07.14 16:29 天气：晴 33℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容：阵列接地线安装 拍摄时间：2020.07.17 17:28 天气：多云 32℃
	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容：交流电镀锌桥架安装 拍摄时间：2020.07.19 18:40 天气：多云 30℃	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容：屋面防水修补 拍摄时间：2020.07.19 18:32 天气：多云 30℃
	 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司960kWp屋顶分布式光伏发电项目 施工内容：屋面防水修补 拍摄时间：2020.07.19 18:32 天气：多云 30℃	
备注		
