

施耐德电气（厦门）开关设备有限公司
960kW 屋顶分布式光伏发电项目

周报

第 14 期

(2020 年 7 月 27 日-2020 年 8 月 2 日)

提交部门: 监理项目部
编 制: 南玉荣
签 发 人: 王立杰
日 期: 2020 年 8 月 2 日

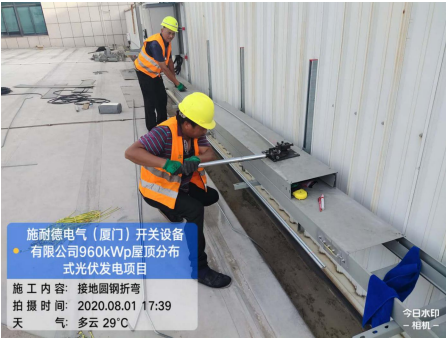
监 理 周 报

项目名称: 施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏发电项目

项目地：福建省厦门市湖里区

时间：2020/08/02

施 工 概 况	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 累计完成： 1、定点放线已全部完成； 2、基座安装共 1656 个，已全部安装完成； 3、支架已全部安装完成。 4、电缆桥架安装完成。 5、逆变器安装 8 台。 6、组件全部安装完成。 7、直流电缆全部敷设完成。 8、接地圆钢分散分散到位。 9、并网柜安装就位。 10、气象站安装完成。
材 料 进 场 情 况	本周无材料进场。
材 料 进 场 检 验	本周无材料进场。
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	无

安全情况	现场给工人安全技术交底，整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。	
下周工作要点	施工单位（上海道发能源科技有限公司） 1、交流电缆到场敷设。 2、交流电缆桥架盖板安装 3、接地圆钢连接 4、逆变器接地线安装 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工人员正确佩戴安全帽，遵守厂区制度。 2、要求施工单位给配电房施工人员安全技术交底，检查进场施工人员保险。 3、夏季施工，屋面温度较高，要求施工单位天气情况调整施工时间，做好防暑工作。 4、催促施工单位对进场材料设备报审，监理通知单内容整改回复。 5、检查到场交流电缆合格证及出厂检验报告。 6、旁站交流电缆敷设接线。	
现场施工照片		
备注	本周因无材料，多日未施工	

