

钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 周 报

第 17 期

编 制 时 间：2020.08.14

监理单位编制人：王朝煌

监理单位审核人：刘士发



常州正衡电力工程监理有限公司

钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理部

项目名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

建设单位：广西光泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏长江环境科技工程有限公司

一、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周施工项目部主要完成：

- 1、场平已全部结束。
- 2、桩位放点本周完成 300 个（补桩），共计完成 21291 个
- 3、引孔本周完成 300（补桩），共计完成 21291 个。
- 4、基础浇筑本周完成约 1mw，共计完成月 54mw。
- 5、光伏电缆 1*4 本周完成 10km，共计完成 420km。
- 6、支架安装本周完成约 1.5mw，共计完成 52.7mw。
- 7、组件安装本周完成约 1.5mw，共计完成约 52.7mw。
- 8、进场道路共完成35公里；不定期修整。
- 9、围栏本周完成 300 米，共计完成 350 米。
- 10、监控本周完成 9 台，共计完成 10 台。

2、下周计划完成：

- 3、放点下周计划完成 2000 根
- 4、引孔下周计划完成 2000 根
- 5、桩基础浇筑下周计划完成 2000 根
- 6、支架安装下周计划完成 500 组
- 7、组件安装下周计划完成 500 组
- 8、光伏电缆 1*4 下周计划完成 9km。
- 9、组串逆变器安装下周计划 20 台。
- 10、围栏安装下周计划完成 300 米
- 11、监控安装下周计划完成 6 台

监理项目部监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的问题现场及时纠正、整改。

12、施工现场无重大安全隐患。

二、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

设备名称	设计数量	采购数量	已到数量	备注
组件	167048 块		375w59780 块 370w98105 块	甲供（截止 7 月 29 日）共计 58.6mw
支架	5966 组	5966 组	5480 组（56.7MW）	全部到货
光伏专用电缆 PV1-F 1X4mm ²	500km	650km	650km	全部到货，增加 150km
ZRC-YJHLV22-1.8/3.0kV 2*300mm ²	10km	10km	10km	全部到货
ZRC-YJHLV22-1.8/3.0kV 3× 95mm ²	24km	46km	46km	全部到货，增加 22km
ZC-YJHLV22-26/35kV-3×120	2808 米	3550 米	3550 米	全部到货，增加 0.65km
ZC-YJHLV22-26/35kV-3×185	1090 米	1690 米	1690 米	全部到货，增加 0.6km
ZC-YJHLV22-26/35kV-3×300	4070 米	5070 米	5070 米	全部到货，增加 0.57km
ZC-YJHLV22-26/35kV-3×400	560m	560m	560m	全部到货
围栏		15000m	11700m	
箱变	11 台	11 台	11 台	全部到货
逆变器	214 台	214 台	217 台	全部到货

三、工程项目进度情况一览表

土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

工程项/事项	总工程量	单位	下周计划	累计完成	累计完成率	备注
场平	60	MW		60	100%	
红线放点	60	MW	7	54	90%	
进场、场内道路		公里		35		
围栏		Km	2	0.35		
桩成孔	60	MW	7	54	90%	
桩浇筑	60	MW	7	54	90%	
箱变基础	17	个	0	17	100%	
支架安装	60	MW	1.6	52.7	88%	
组件安装	60	MW	1.6	52.7	88%	
电气施工	500	km	104	420	84%	
组串逆变器	214	Mw	20	120	56%	

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：王朝煊、刘德文、宋永武、甄文波

2、施工单位：

（1）项目经理：谢振国

（2）现场项目经理：李开仕

（3）现场负责人：殷建茂

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构		

	配件、设备进场验收		
2	监理旁站项目	1、灌注桩浇筑	旁站记录
		2、接地施工	旁站记录
			/
			/
3	施工质量控制记录		
4	隐蔽工程质量验收	1、电缆回填	旁站记录
		2、接地施工	旁站记录
		3、	/
		4、	/
		5	/
5	分部分项工程验收	1、	/
		2	/
		3	/
		4	/
		5	/
6	其他	1	/
		2	/
		3	/
		4	/

七、施工质量问题

预埋件安装精度不足需加强质量控制

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

场区大坪地村民阻工，原设计区域设计变更的问题

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

十一、天气统计表。

日期 天气	9	10	11	12	13	14	15
晴	✓	✓	✓	✓			
雨					✓	✓	✓
阴							
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

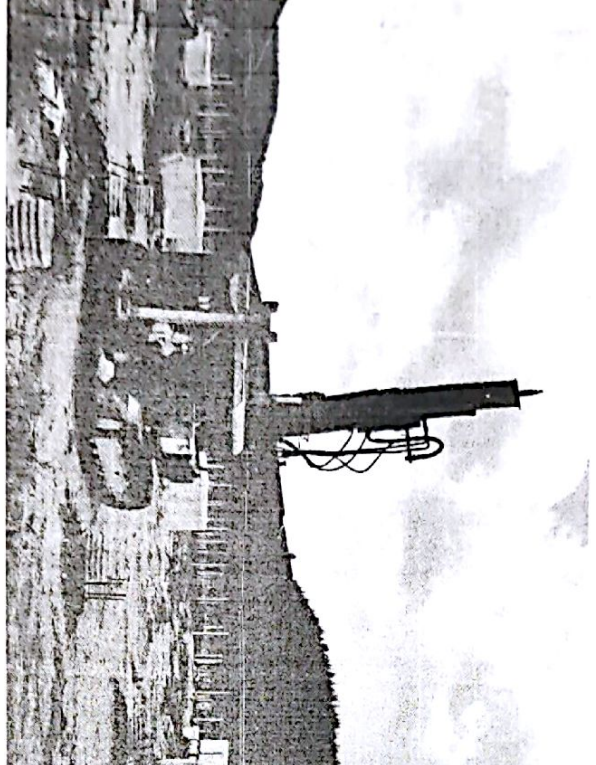
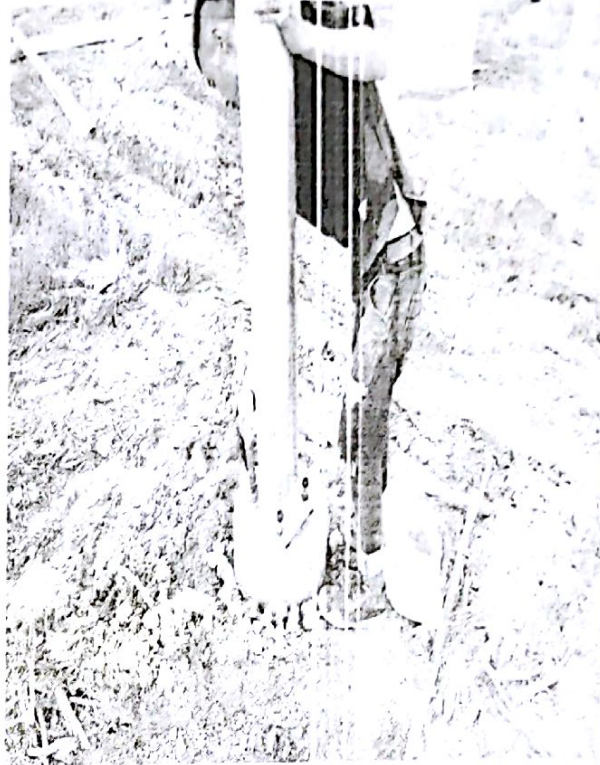
序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		1	17	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知		1	13	
5	审批分包单位				
6	原材料审批			8	
7	构配件审批			2	
8	设备审批			2	
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

1、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	20200809 引孔	20200810 立柱安装
图片		
文字描述	20200812 光伏板安装	20200814 二次浇注
图片	
