

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目


监 理 周 报

第 二 期



(2020 年 6 月 8 日-2020 年 6 月 14 日)



工程名称	浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目	建设单位	海宁科茂微电网技术有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	海盐恒阳光伏新能源有限公司		
本周施工内容及进度	1、兄弟标准件施工点新屋顶进行安全防护网安装，安装完成。 2、兄弟标准件施工点新屋顶夹具安装施工，夹具安装完成。 3、兄弟标准件施工点 3#屋顶准备安全护栏材料，开始安装安全护网。 4、壁丽雅加固材料准备中。		
下周计划	1、兄弟标准件施工点 3#、2#安全围网安装完成。 2、加固材料准备完成，进行加固施工。 3、施工进度计划、资料提供报审。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。		
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控		
设备材料进场情况	1、兄弟标准件施工点夹具全部到货。		
人员机械情况	人员:6 人		

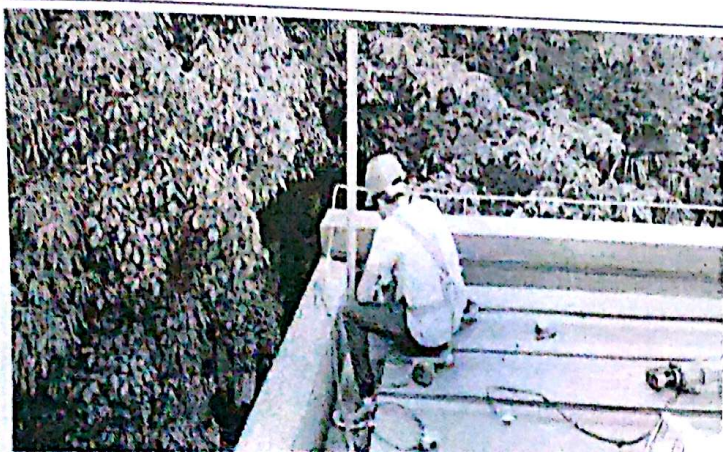

兄弟标准件施工点新屋面安全护网安装完成

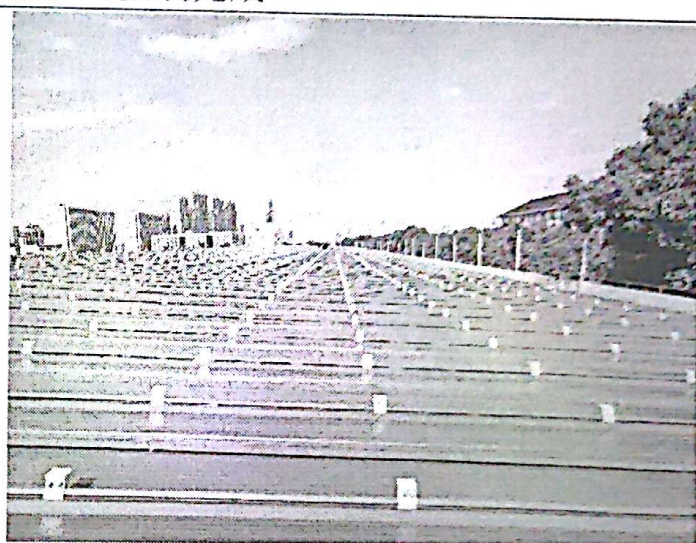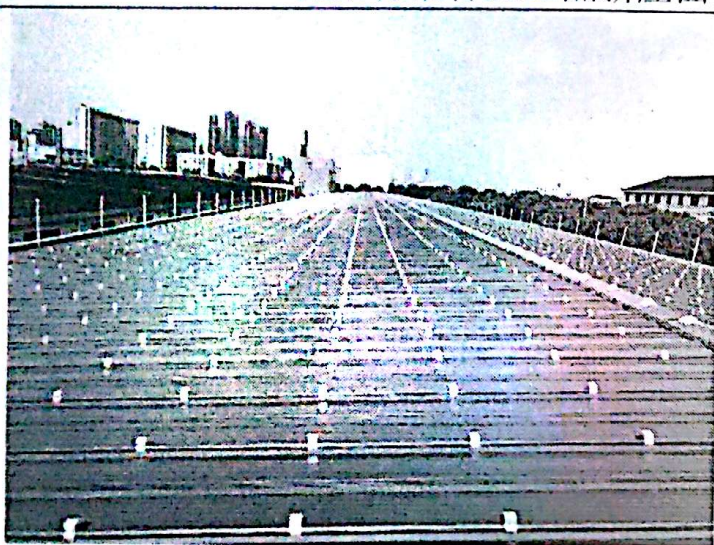

兄弟标准件施工点新屋面夹具安装完成
