

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

# 监 理 周 报

## 第 八 期




(2020 年 7 月 20 日-2020 年 7 月 26 日)


|           |                                                                                                                                                                                  |      |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 工程名称      | 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目                                                                                                                                                          | 建设单位 | 海宁科茂微电网技术有限公司 |
| 监理单位      | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                   |      |               |
| 施工单位      | 嘉兴恒阳新能源科技有限公司                                                                                                                                                                    |      |               |
| 本周施工内容及进度 | <p>1、兄弟标准件施工点 1#屋面组件安装完成；2#厂房北侧屋面导轨安装，斜撑加固，3#厂房加固屋面 T 型钢完成，屋面开始除锈完成；4#屋面水泥基础屋面排放完成，5#屋面除锈完成。</p> <p>2、大宁紧固件施工点高屋面组件安装完成；低屋面加固完成 85%。</p> <p>3、壁丽雅装饰施工点加固檩条，加固完成 40%。</p>         |      |               |
| 下周计划      | <p>1、兄弟标准件施工点 1#屋面组件安装完成，电气接线完成，根据厂里停电情况决定并网时间；2#北侧屋面根据天气喷漆完成，夹具、导轨安装完成；2#厂房斜撑加固完成，4#屋面水泥基础安装支架完成，5#屋面第二遍喷漆完成。</p> <p>2、大宁施工点高屋面，逆变器安装接线，低屋面加固完成。</p> <p>3、壁丽雅装饰施工点加固完成 65%。</p> |      |               |
| 安全文明施工情况  | <p>1、要求进场工人进行安全三级教育。</p> <p>2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。</p> <p>3、注意电气接线安全。</p>                                                                                                       |      |               |
| 施工质量      | 1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控                                                                                                                                                             |      |               |
| 设备材料进场情况  | <p>1、嘉兴兄弟施工点组件到货 128 箱。</p> <p>2、并电柜到货、3*70 电缆到货。</p>                                                                                                                            |      |               |
| 人员机械情况    | 人员:16 人，临时吊车，                                                                                                                                                                    |      |               |



兄弟 1#屋面组件安装完成

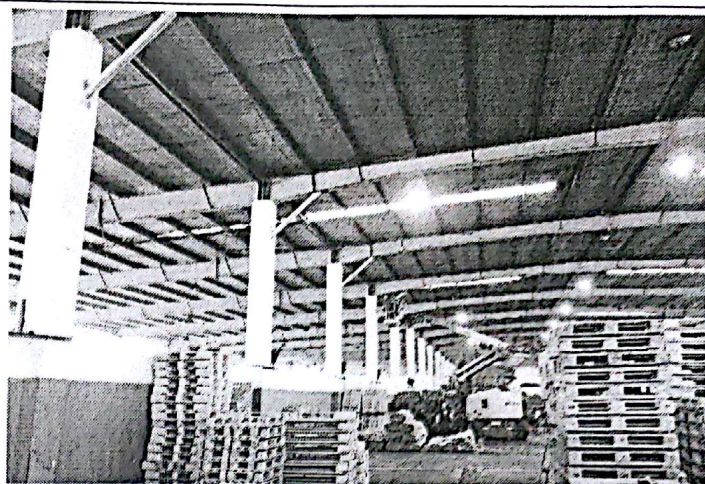

兄弟 2#屋面斜撑加固

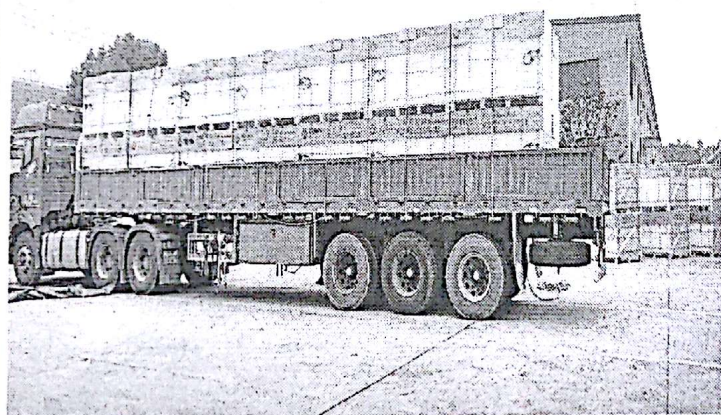

组件到货



兄弟 2#屋面喷漆部分导轨安装
