

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 九 期

(2020 年 7 月 27 日-2020 年 8 月 2 日)




工程名称	浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目	建设单位	海宁科茂微电网技术有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
本周施工内容及进度	1、兄弟标准件施工点并网柜电缆接线完成；2#北侧屋面、5#屋面喷漆完成，夹具、导轨安装完成；2#厂房斜撑加固完成、檩条加固完成 70%，3#屋面水泥基础安装支架完成。 2、大宁施工点高屋面逆变器安装接线，低屋面加固完成 90%，低屋面组件吊装，安装，未加固部分未进行组件安装；并网柜电缆接线完成。 3、壁丽雅装饰施工点加固完成 75%。 4、巨润新材料项目可以开工，业主下发开工令。		
下周计划	1、兄弟标准件施工点 1#屋面电缆接线完成，具备并网条件，2#屋面南侧开始换屋面，北侧屋面导轨安装完成，检查验收，加固基本完成，报业主验收，是否可以组件吊装，3#屋面喷漆，5#屋面夹具、导轨安装完成。 2、大宁加固完成，组件安装完成，具备并网条件。 3、壁丽雅加固完成 90%。 4、巨润新材料施工点材料到场，开始进行施工。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。 3、注意组件吊装安全。		
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控		
设备材料进场情况	1、动力电缆全部到货，。 2、巨润新材料组件到货。		

人员机械情况

人员:18 人, 临时吊车, 加固车。




兄弟 3#屋面水泥顶支架安装

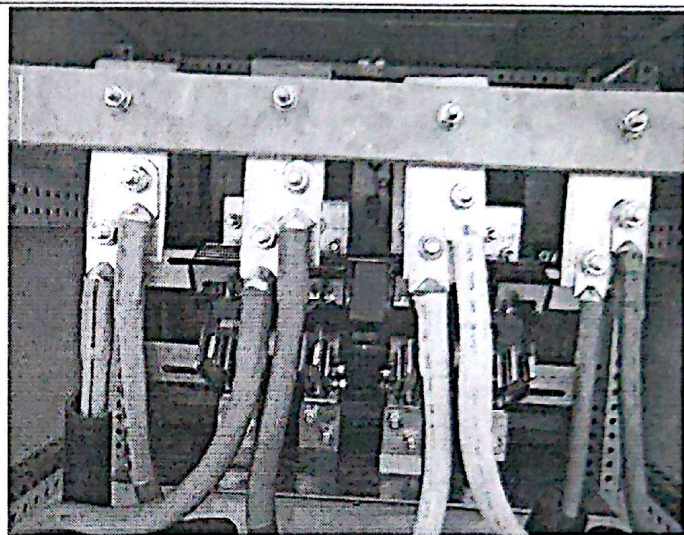

大宁并网柜电缆接线



检查验收大宁低屋面导轨

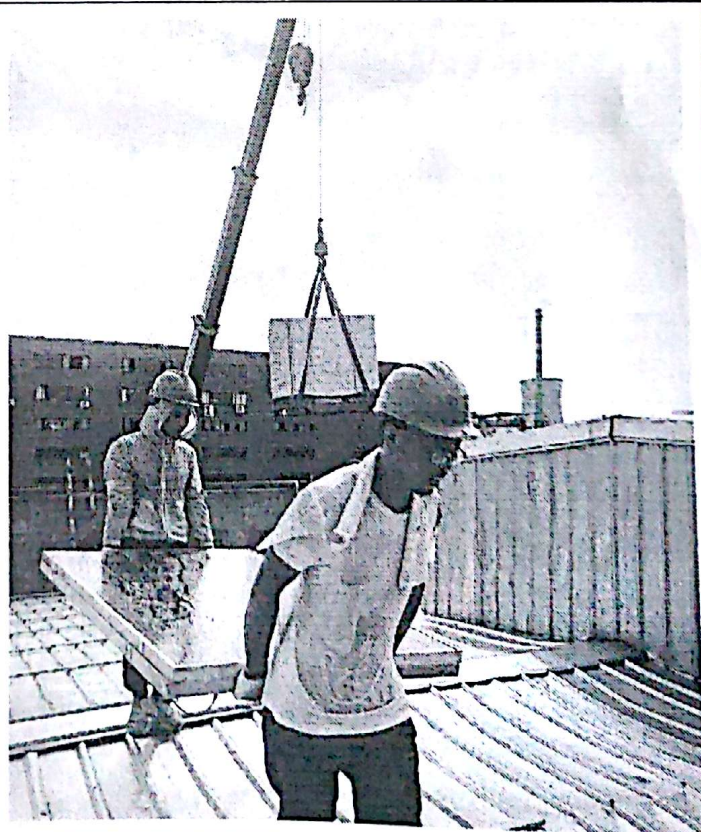

大宁低屋面组件搬运
