

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目


监 理 周 报

第
十
四
期


(2020 年 8 月 31 日-2020 年 9 月 6 日)



工程名称	浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目	建设单位	海盐聚晖新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
本周施工内容及进度	<p>1、兄弟标准件施工点 2#北侧屋面逆变器接线，光伏线缆接线敷设，运维走道安装，南侧屋面组件安装完成；5#屋面组件安装，东侧应厂房业主要求加一层屋面完成，夹具、导轨安装完成，明日组件安装完成。</p> <p>2、大宁施工点低屋面已全部完成。</p> <p>3、壁丽雅装饰施工点，屋面气楼边拆边进行导轨、组件安装完成 65%。</p> <p>4、巨润新材料项目新人员进场，目前施工人员 15 人，组件、支架已安装约 15%。</p>		
下周计划	<p>1、兄弟标准件施工点 1#屋面逆变器电缆接线完成，具备并网条件，2#屋面南侧屋面逆变器接线完成，5#屋面组件安装完成，运维走道安装完成，电缆线路桥架安装完成。</p> <p>2、壁丽雅屋面安装完成 80%，水泥屋面支架安装、组件安装。</p> <p>3、巨润新材料施工点支架、组件安装 30%、光伏线缆接线。</p>		
安全文明施工情况	<p>1、要求进场工人进行安全三级教育。</p> <p>2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。</p> <p>3、注意组件吊装安全。</p>		
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控		
设备材料进场情况	无		
人员机械情况	人员:25 人，临时吊车。		

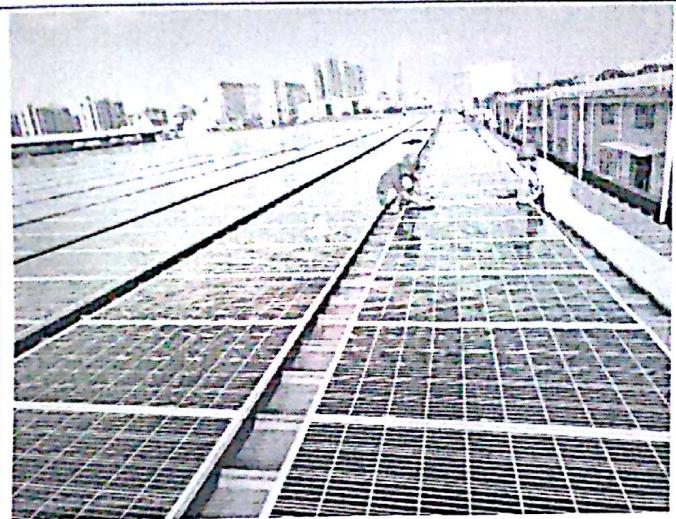


兄弟 2#南侧屋面组件安装

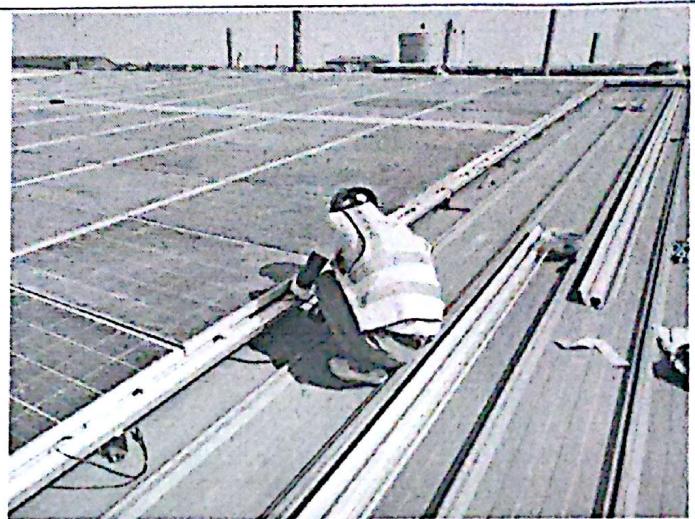

壁丽雅屋面导轨、组件安装



兄弟 2#屋面组件安装完成

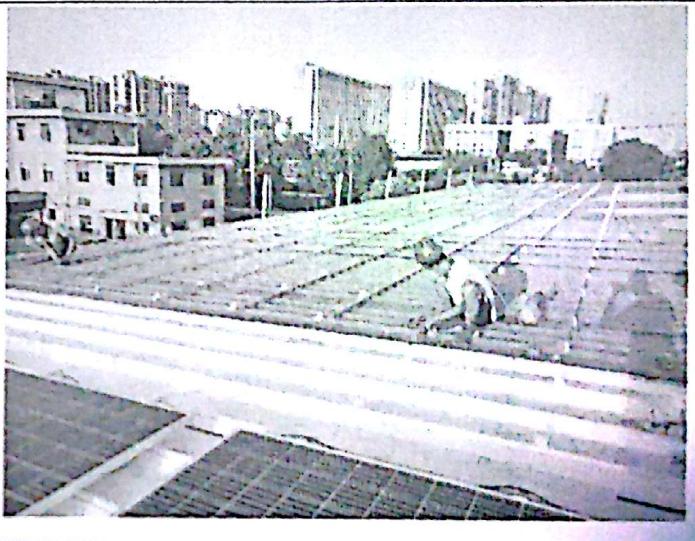

兄弟 4#屋面安装夹具、导轨
