

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目


监 理 周 报

第 十 六 期

(2020 年 9 月 14 日-2020 年 9 月 20 日)



工程名称	浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目	建设单位	海盐聚晖新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	嘉兴恒阳新能源科技有限公司		
本周施工内容及进度	1、兄弟标准件施工点屋面逆变器接线，光伏线缆接线敷设，供电局电表安装完成，完成并网，整改屋面直流线缆，桥架。 2、壁丽雅装饰施工点进行导轨、组件安装完成 85%，整改组件表面铁锈、分散组件，MC4 接头整改方式确认，进行整改。 3、巨润新材料项目新人员进场，目前施工人员 15 人，组件、支架已安装约 40%，进度已严重滞后，要求加派人员，合理调配，尽快完成进度目标。		
下周计划	1、兄弟标准件施工点屋面并网，屋面线缆整改、桥架整改、排查接地垫片。 2、壁丽雅屋面安装完成，桥架安装、光伏线缆接线、交流电缆敷设、，逆变器安装。 3、巨润新材料施工点 1 号屋面支架、组件安装完成、桥架安装、光伏线缆接线。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。 3、注意电缆吊装安全。		
施工质量	1、直流线红黑线有未分开绑扎的，进行整改。 2、爬梯、围栏、逆变器支架防锈刷漆，进行整改。		
设备材料进场情况	1、巨润新材料施工点直流电缆、交流电缆到货。		
人员机械情况	人员:20 人，临时吊车。		

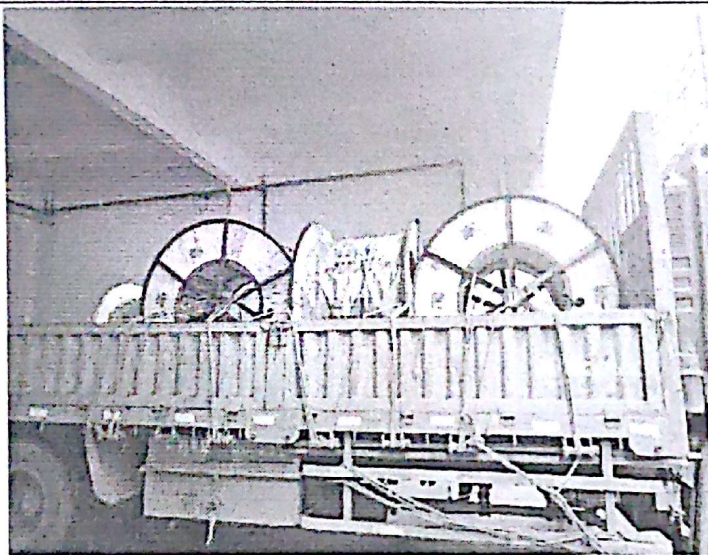

巨润电缆到货



巨润屋面组件安装



巨润电缆卸货



业主查看 MC4 接头整改
