

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 01 期

项目名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

填报周期: 2020.06.08-2020.06.14

本周工作如下:

- 1、巡视施工现场质量、安全。
- 2、参加业主召开现场会议。
- 3、管桩吊卸现场检查管桩质保资料, 型号规格符合要求。
- 4、监理人员陪同华能江西分公司领导检查施工现场。
- 5、审核施工单位报审资料。
- 6、主持召开第一次监理例会, 并针对会议内容整理为会议纪要递交至业主、施工方。
- 7、参加图纸设计交底会议。


二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	道路已完成 4 公里 (总共 10 公里)			
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工	因机械、人员等问题, 未能正常施工			
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变				
7、送出工程 (含对侧)				
8、现场调试				
9、出图情况	目前已提供光伏区土建蓝图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	挖机 2 台，施工人员 4 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、编制整理项目监理前期资料。				
2、打桩施工正常进行。				
3、主持召开第二次监理例会，对现场所遇到的问题及本周工程量进行汇报。				
4、上传项目前期监理资料至监理云。				

填报人：刘晨瑞 审核人：刘士发 时间：2020 年 06 月 14 日


工程现场照片（含文字描述）：

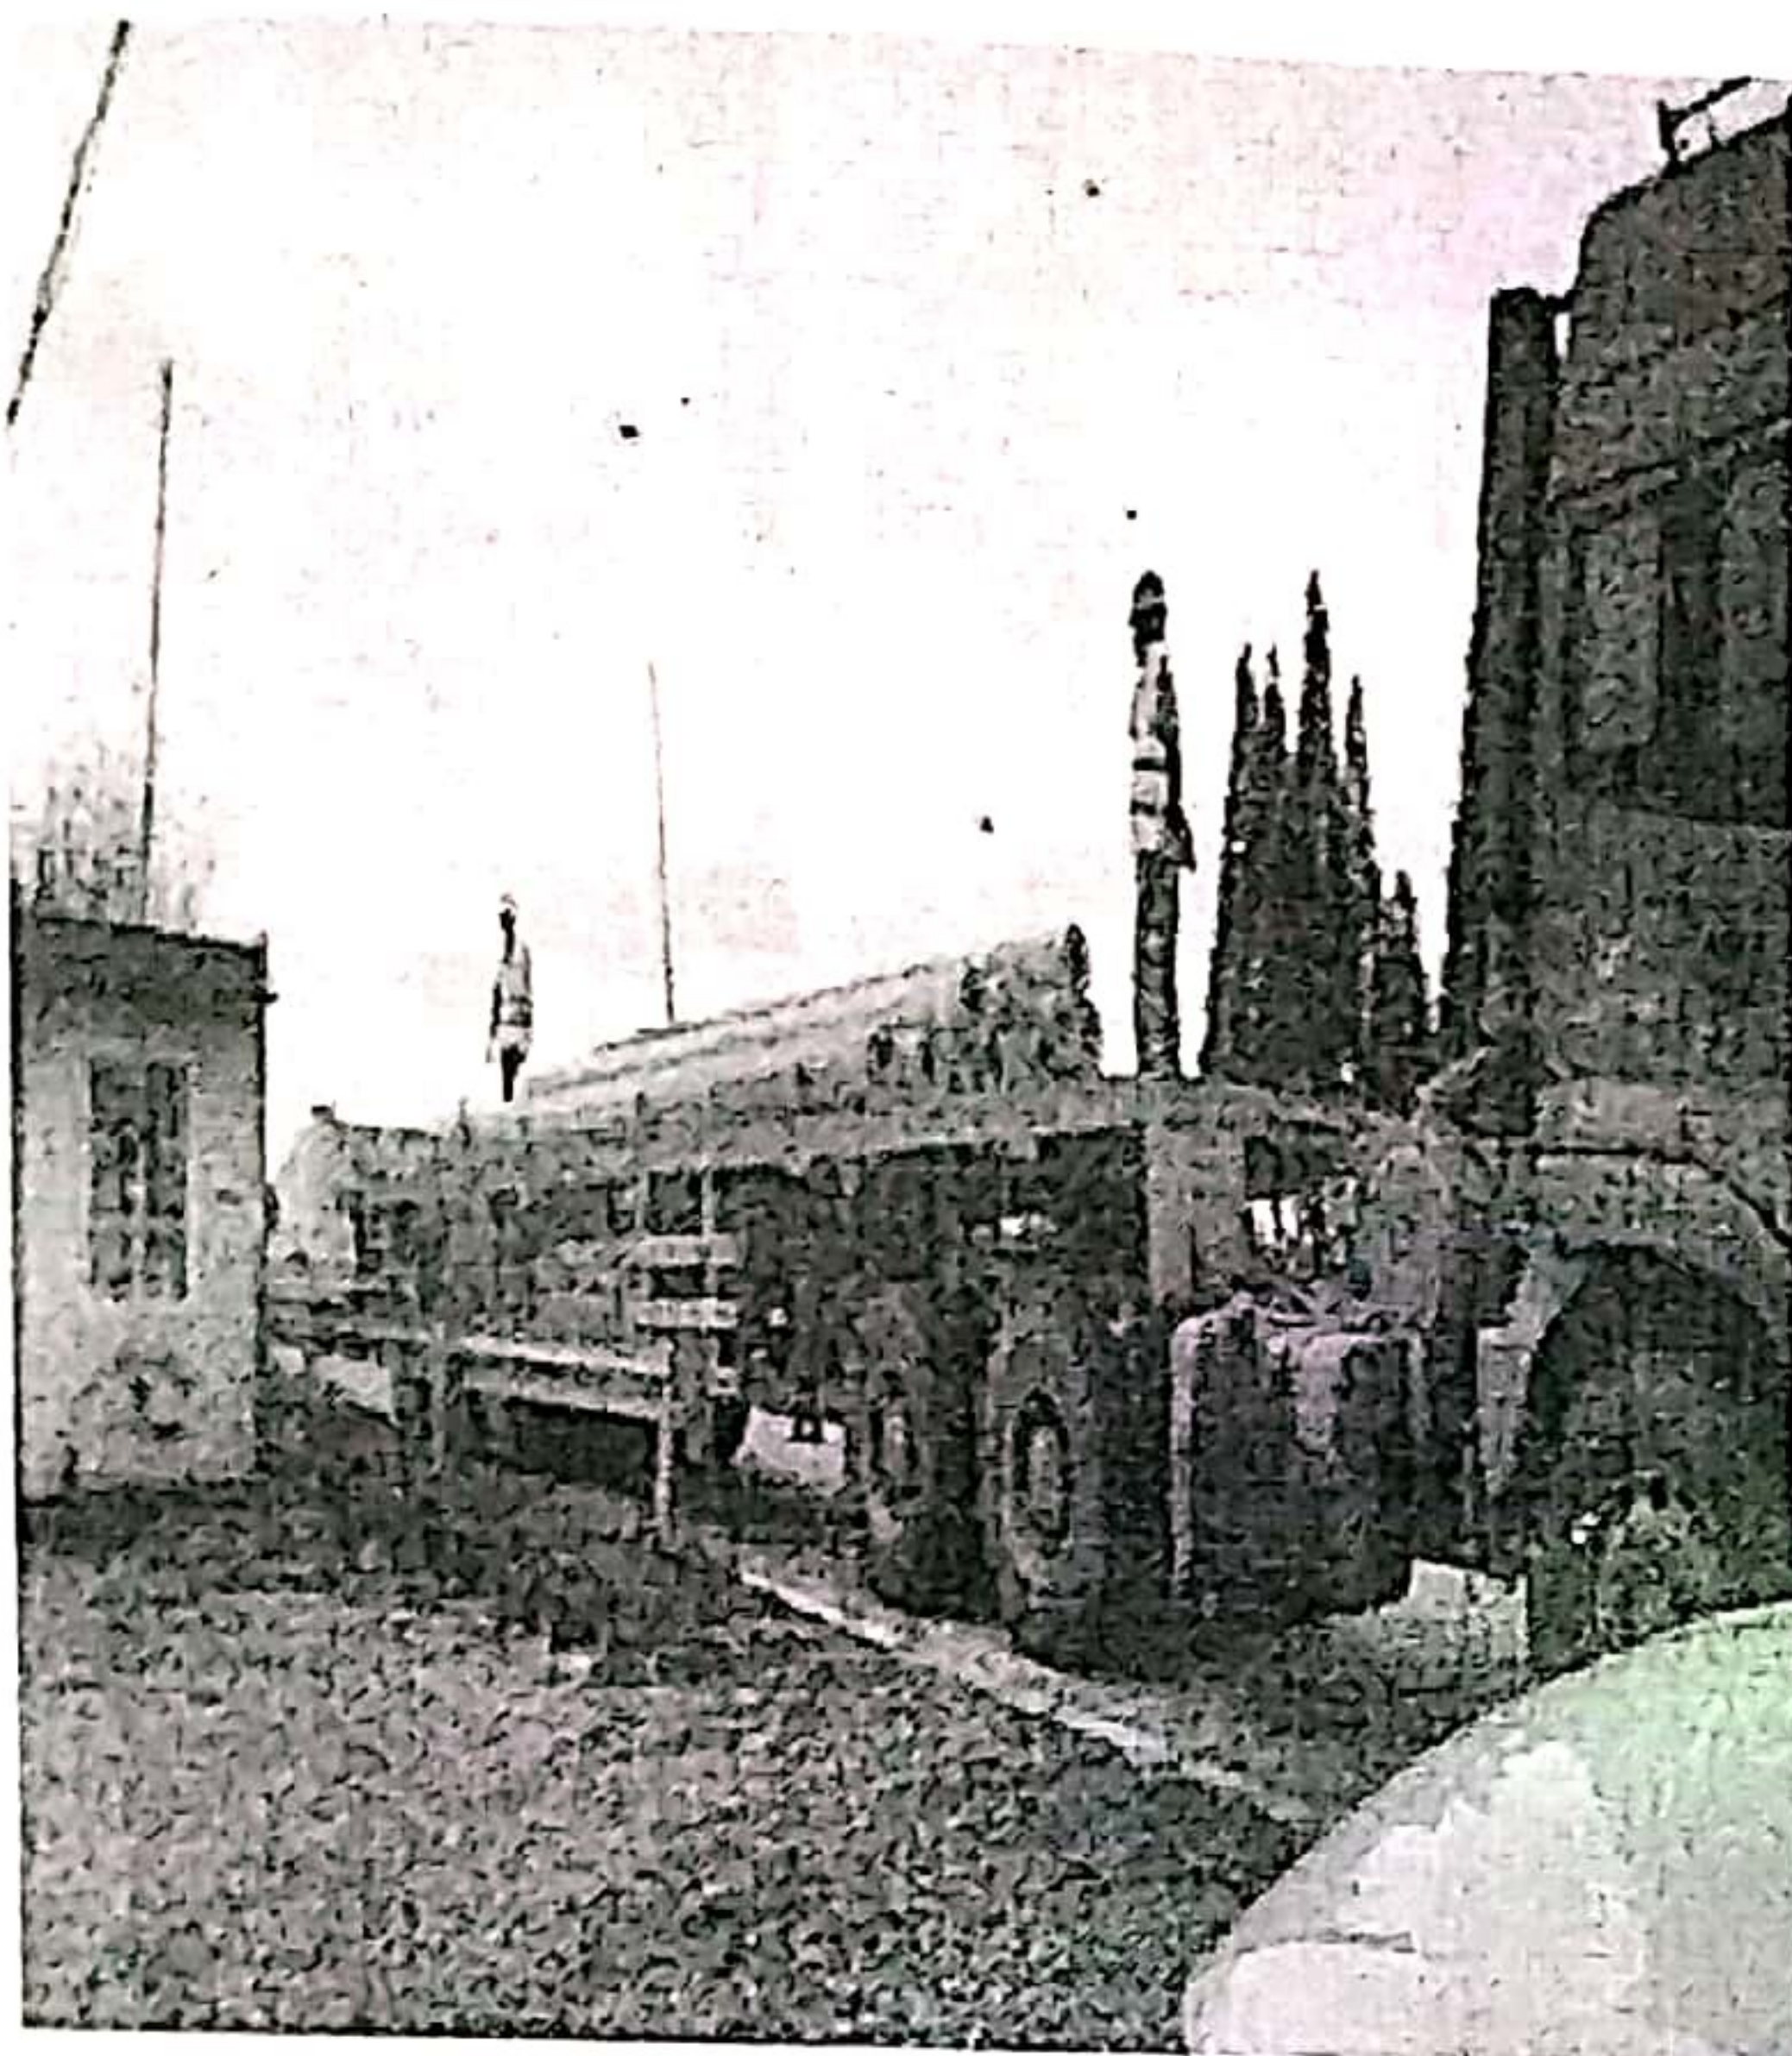

2020.06.09 管桩进场



2020.06.09 管桩进场吊卸

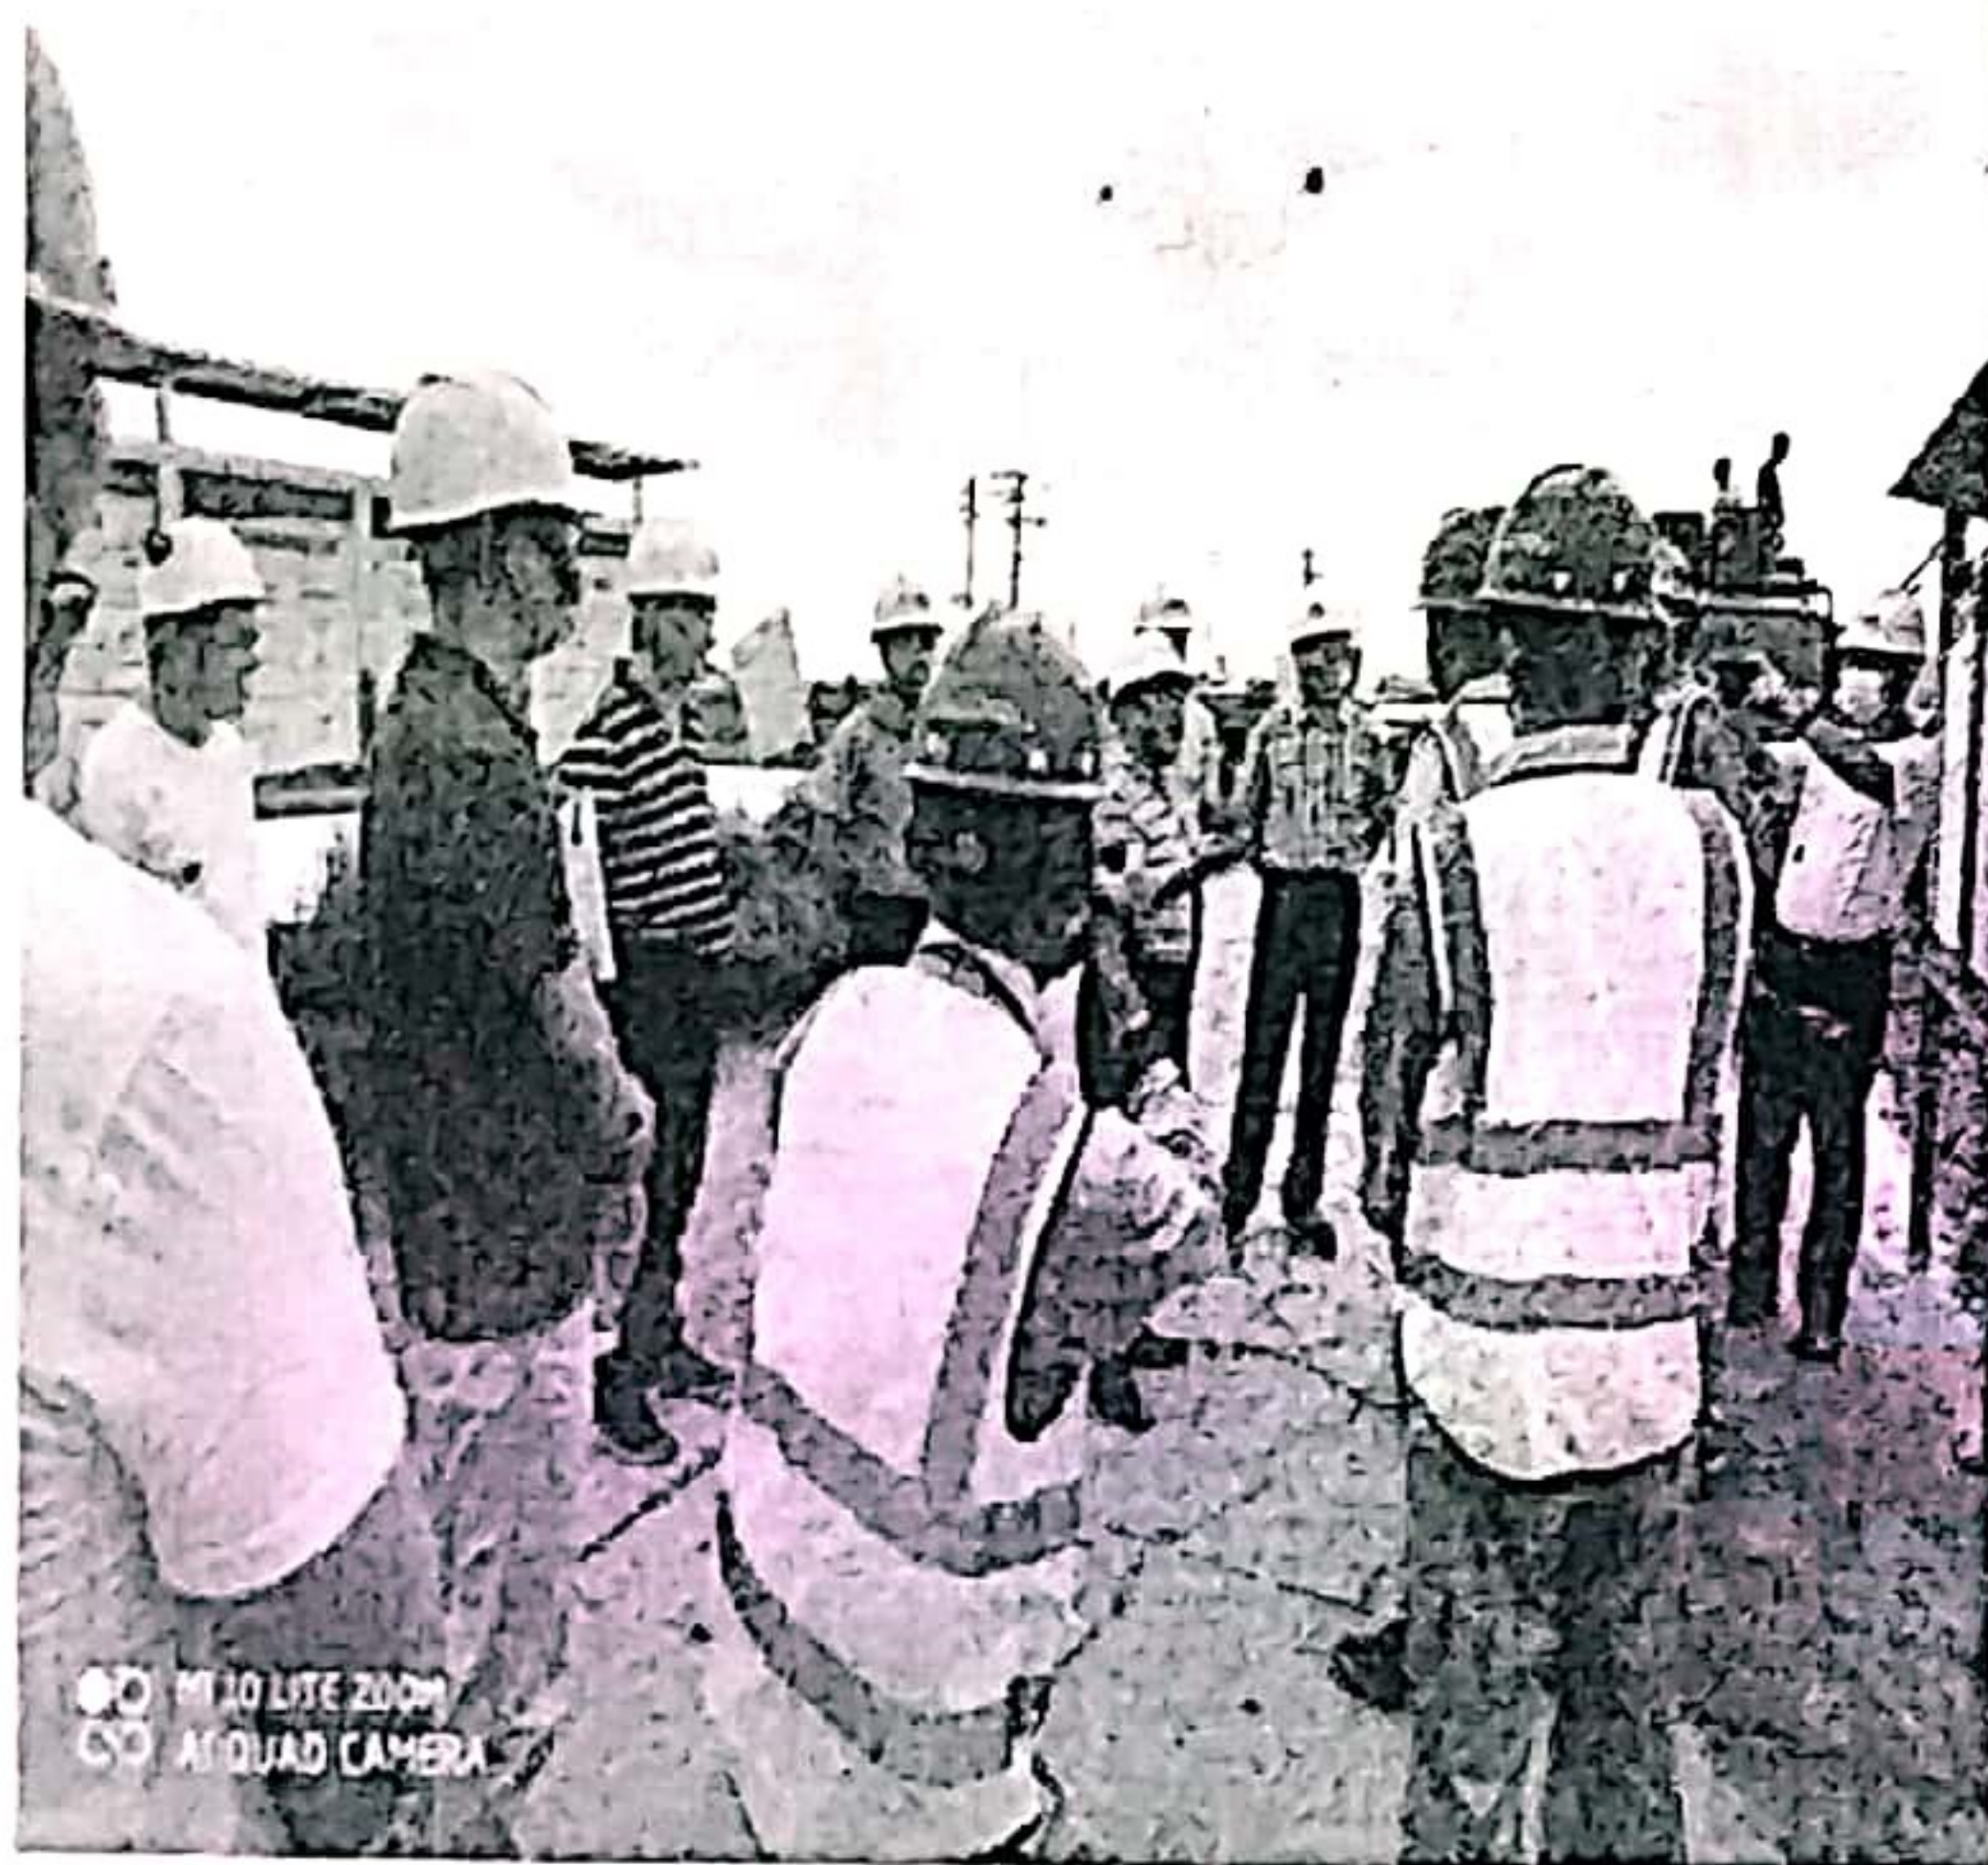

2020.06.10 华能江西分公司领导现场检查



2020.06.11 试打第一根管桩
