

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 02 期

项目名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		填报周期: 2020.06.15-2020.06.21
本周工作如下: 1、打桩船进入施工现场;进场道路平整。 2、熟悉图纸,对施工现场质量、安全进行巡查。 3、参加施工进度会议。 4、电缆进场,三方材料报验验收,检查规格型号、合格证等。 5、打桩船维修,浮船组装。 6、现场检查发现桩机吊卸时,吊车无吊钩、无安全卡,现场已要求整改,待整改合格后再进行吊卸。 7、参加电气图纸会审会议。 8、主持召开第二次监理例会,并针对会议内容整理为会议纪要递交至业主、施工方。 9、监理人员检查电缆沟开挖;参加安委会成立会议。 10、监理人员现场要求施工负责人电缆沟开挖时,注意安全,需安排专人现场指挥,避免挖断电缆电线。 11、现场巡查发现 A3 区域打桩部分工程桩不垂直,水平度不够,要求施工负责人把控施工控制点,落实整改不垂直的工程桩。 12、业主、总包、施工单位、监理检测支架立柱镀锌层;同时对施工现场进行安全检查,对现场存在的安全隐患进行统计,并下发监理通知单要求施工单位进行整改。 13、逆变器进场,业主、总包、监理现场查看进行开箱验收。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	21#、23#、24#、26#箱变附近清表、场平完成约 2300 米;4 号集电线路进场主干道填筑完成,本周完成约 250 米,其它支路填筑约 150 米;4 号集电线路区域打桩船航道基本打通。	
2、开关站/升压站	升压站改造工作纵向加密设备安装完毕	
3、综合楼/附属建筑		
4、场内桩基施工	4 号集电线路区域鱼塘打桩 26 根	
5、支架及组件安装	未开始进行	
6、逆变器及箱变	未开始进行	
7、送出工程(含对侧)		


8、现场调试				
9、出图情况	施工图纸已到场 11 册，电气 9 册，水工 1 册			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	管桩			到货 409 根
	1×4 光伏专用电缆			到货 5000 米
	35kv 高压电缆			到货 5864 米
	支架立柱			到货 13MW
	箱变	6 月 24 日		
	组件	6 月 28 日		
11、人员/机械情况	总包项目部管理人员 6 人，分包项目部管理人员 11 人，施工人员 94 人；现场施工有 4 台小挖机、1 台大挖机、1 辆随车吊机、1 台水浮挖机、1 条打桩船			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	6 月 19 日		6 月 30 日	
2、首套组件安装	6 月 26 日		6 月 29 日	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				

五、下周计划主要工作内容

- 1、管桩、支架、组件、桥架、箱变陆续进场。
- 2、场区道路施工完成，满足材料进场条件。
- 3、打桩施工、支架立柱焊接、安装、组件安装、逆变器安装等正常运行。
- 4、主持召开第三次监理例会，对现场所遇到的问题及本周工程量进行汇报。
- 5、加强施工现场安全、质量管理力度。
- 6、上传项目前期监理资料至监理云。


填报人： 刘晨瑞 审核人： 刘士发 时间： 2020 年 06 月 21 日

工程现场照片（含文字描述）：

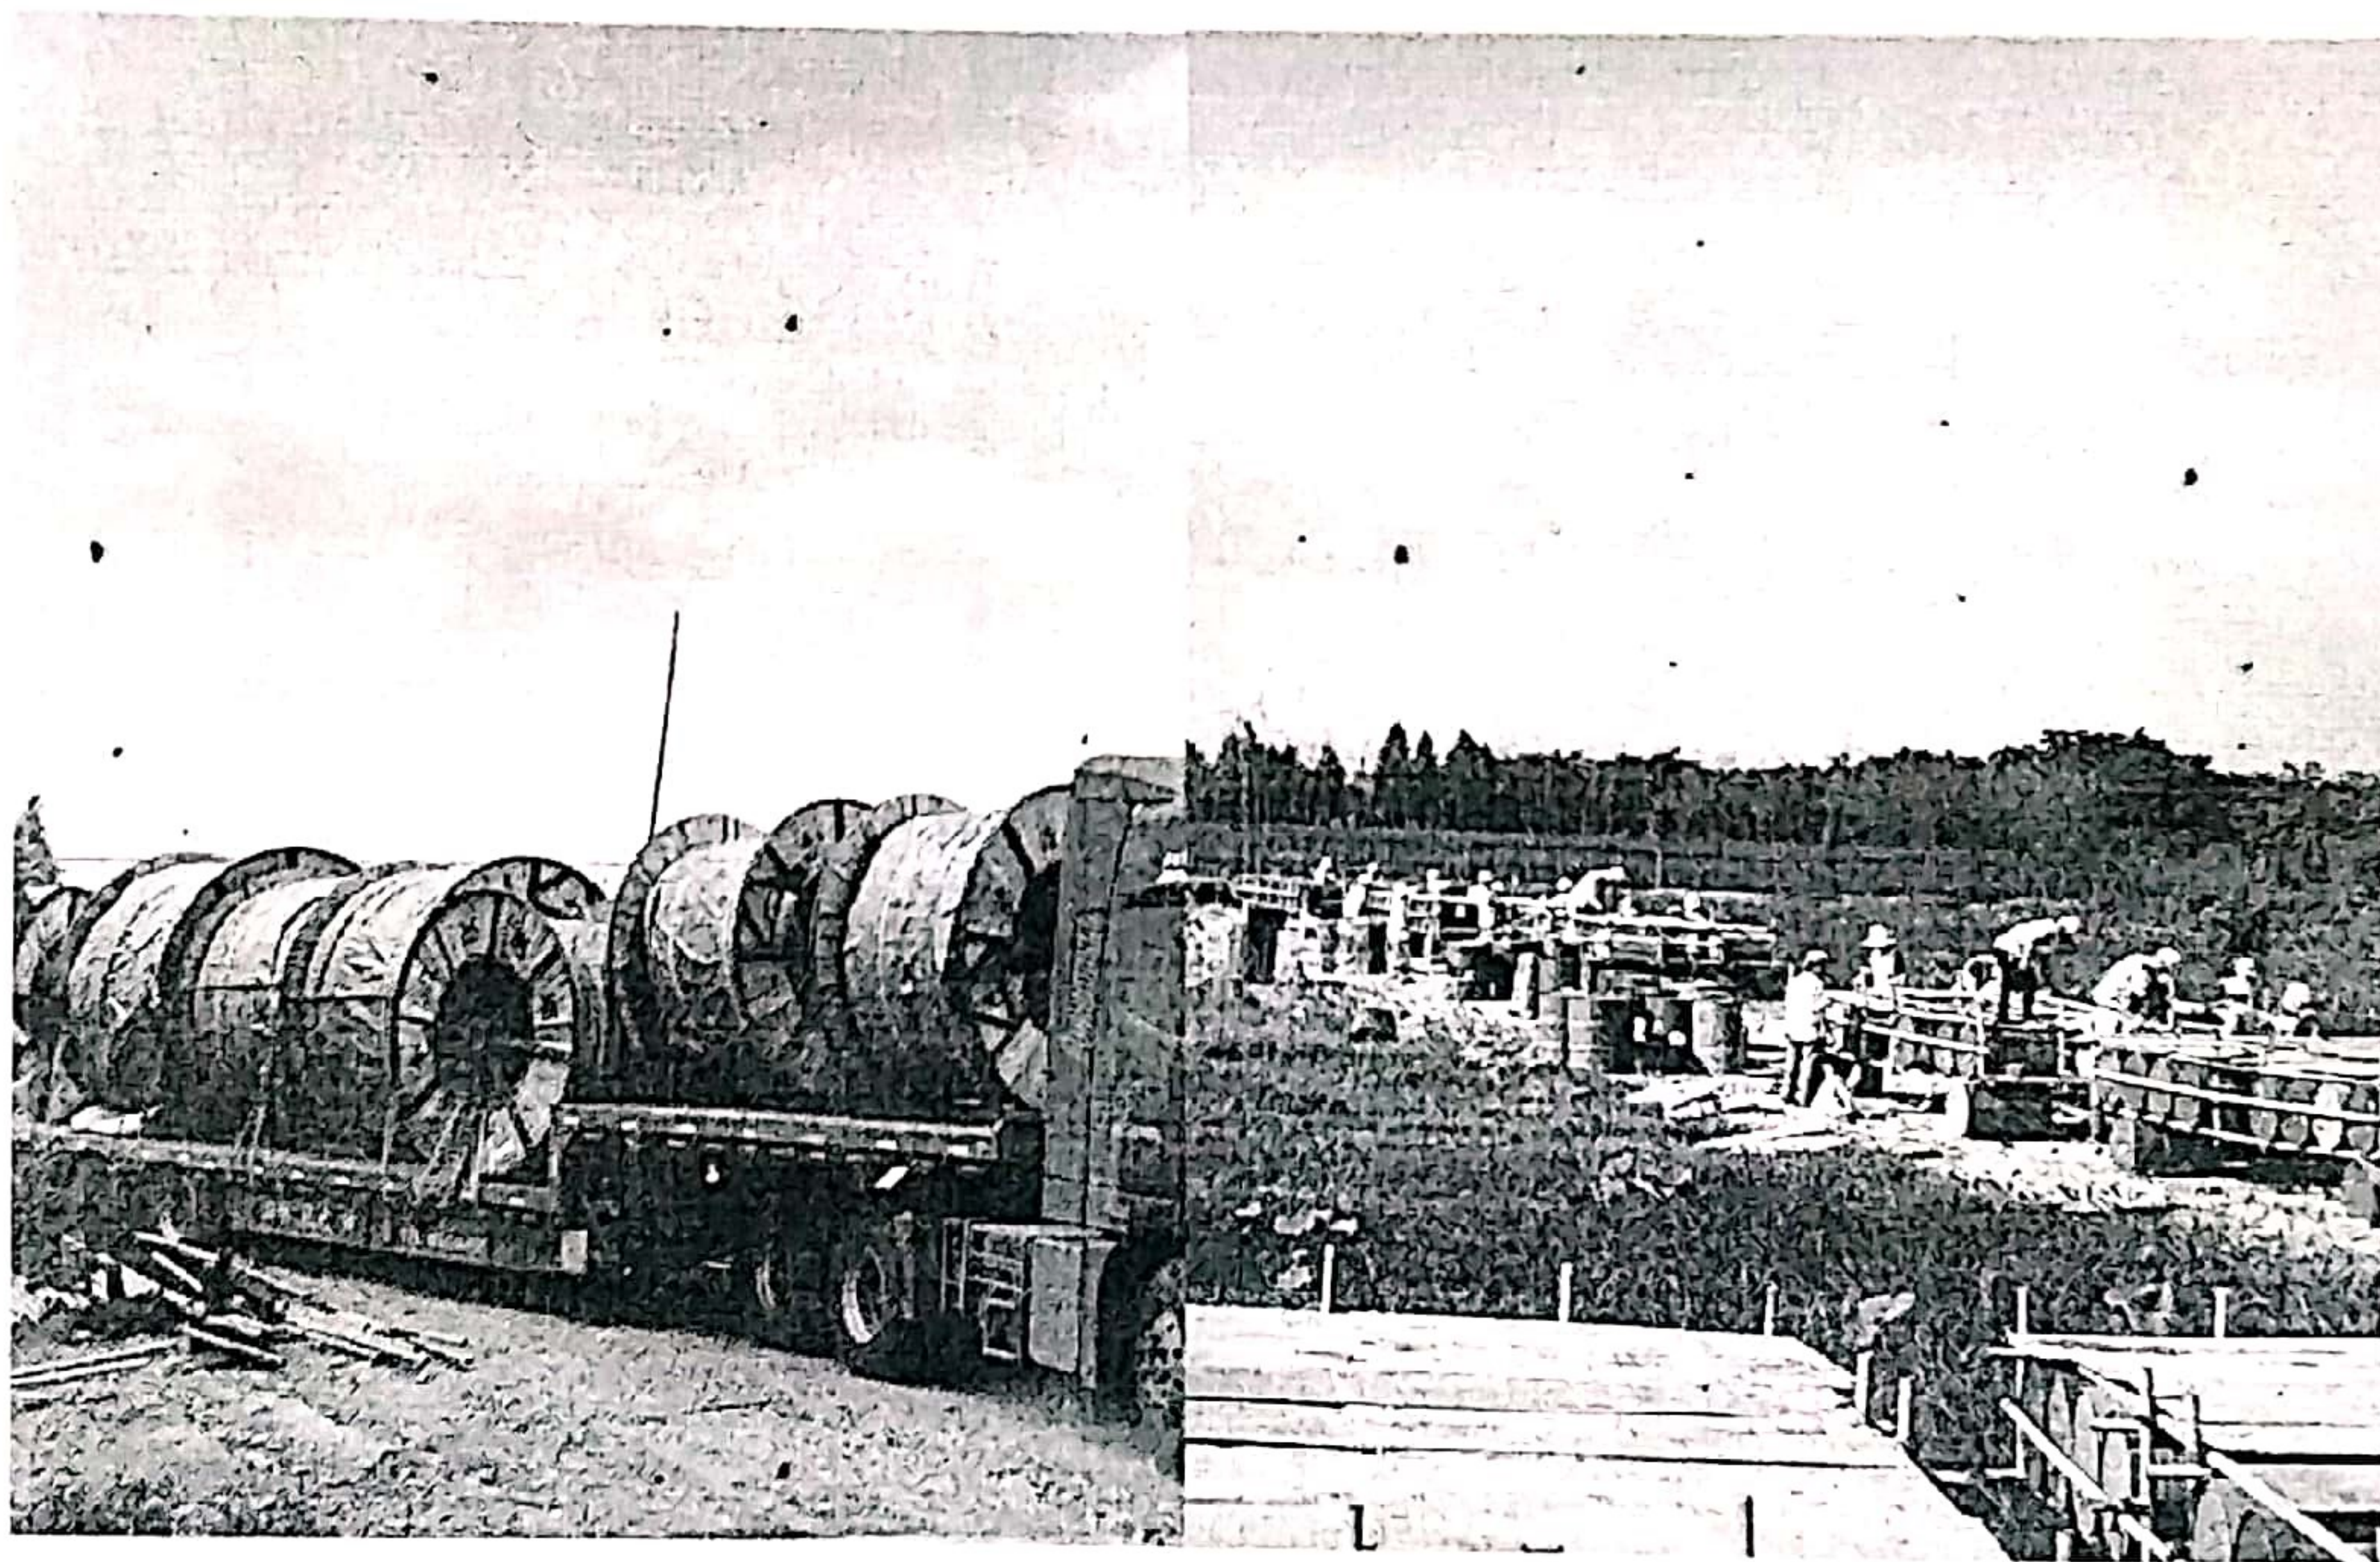

2020.6.17 电缆进场

2020.6.18 浮船组装

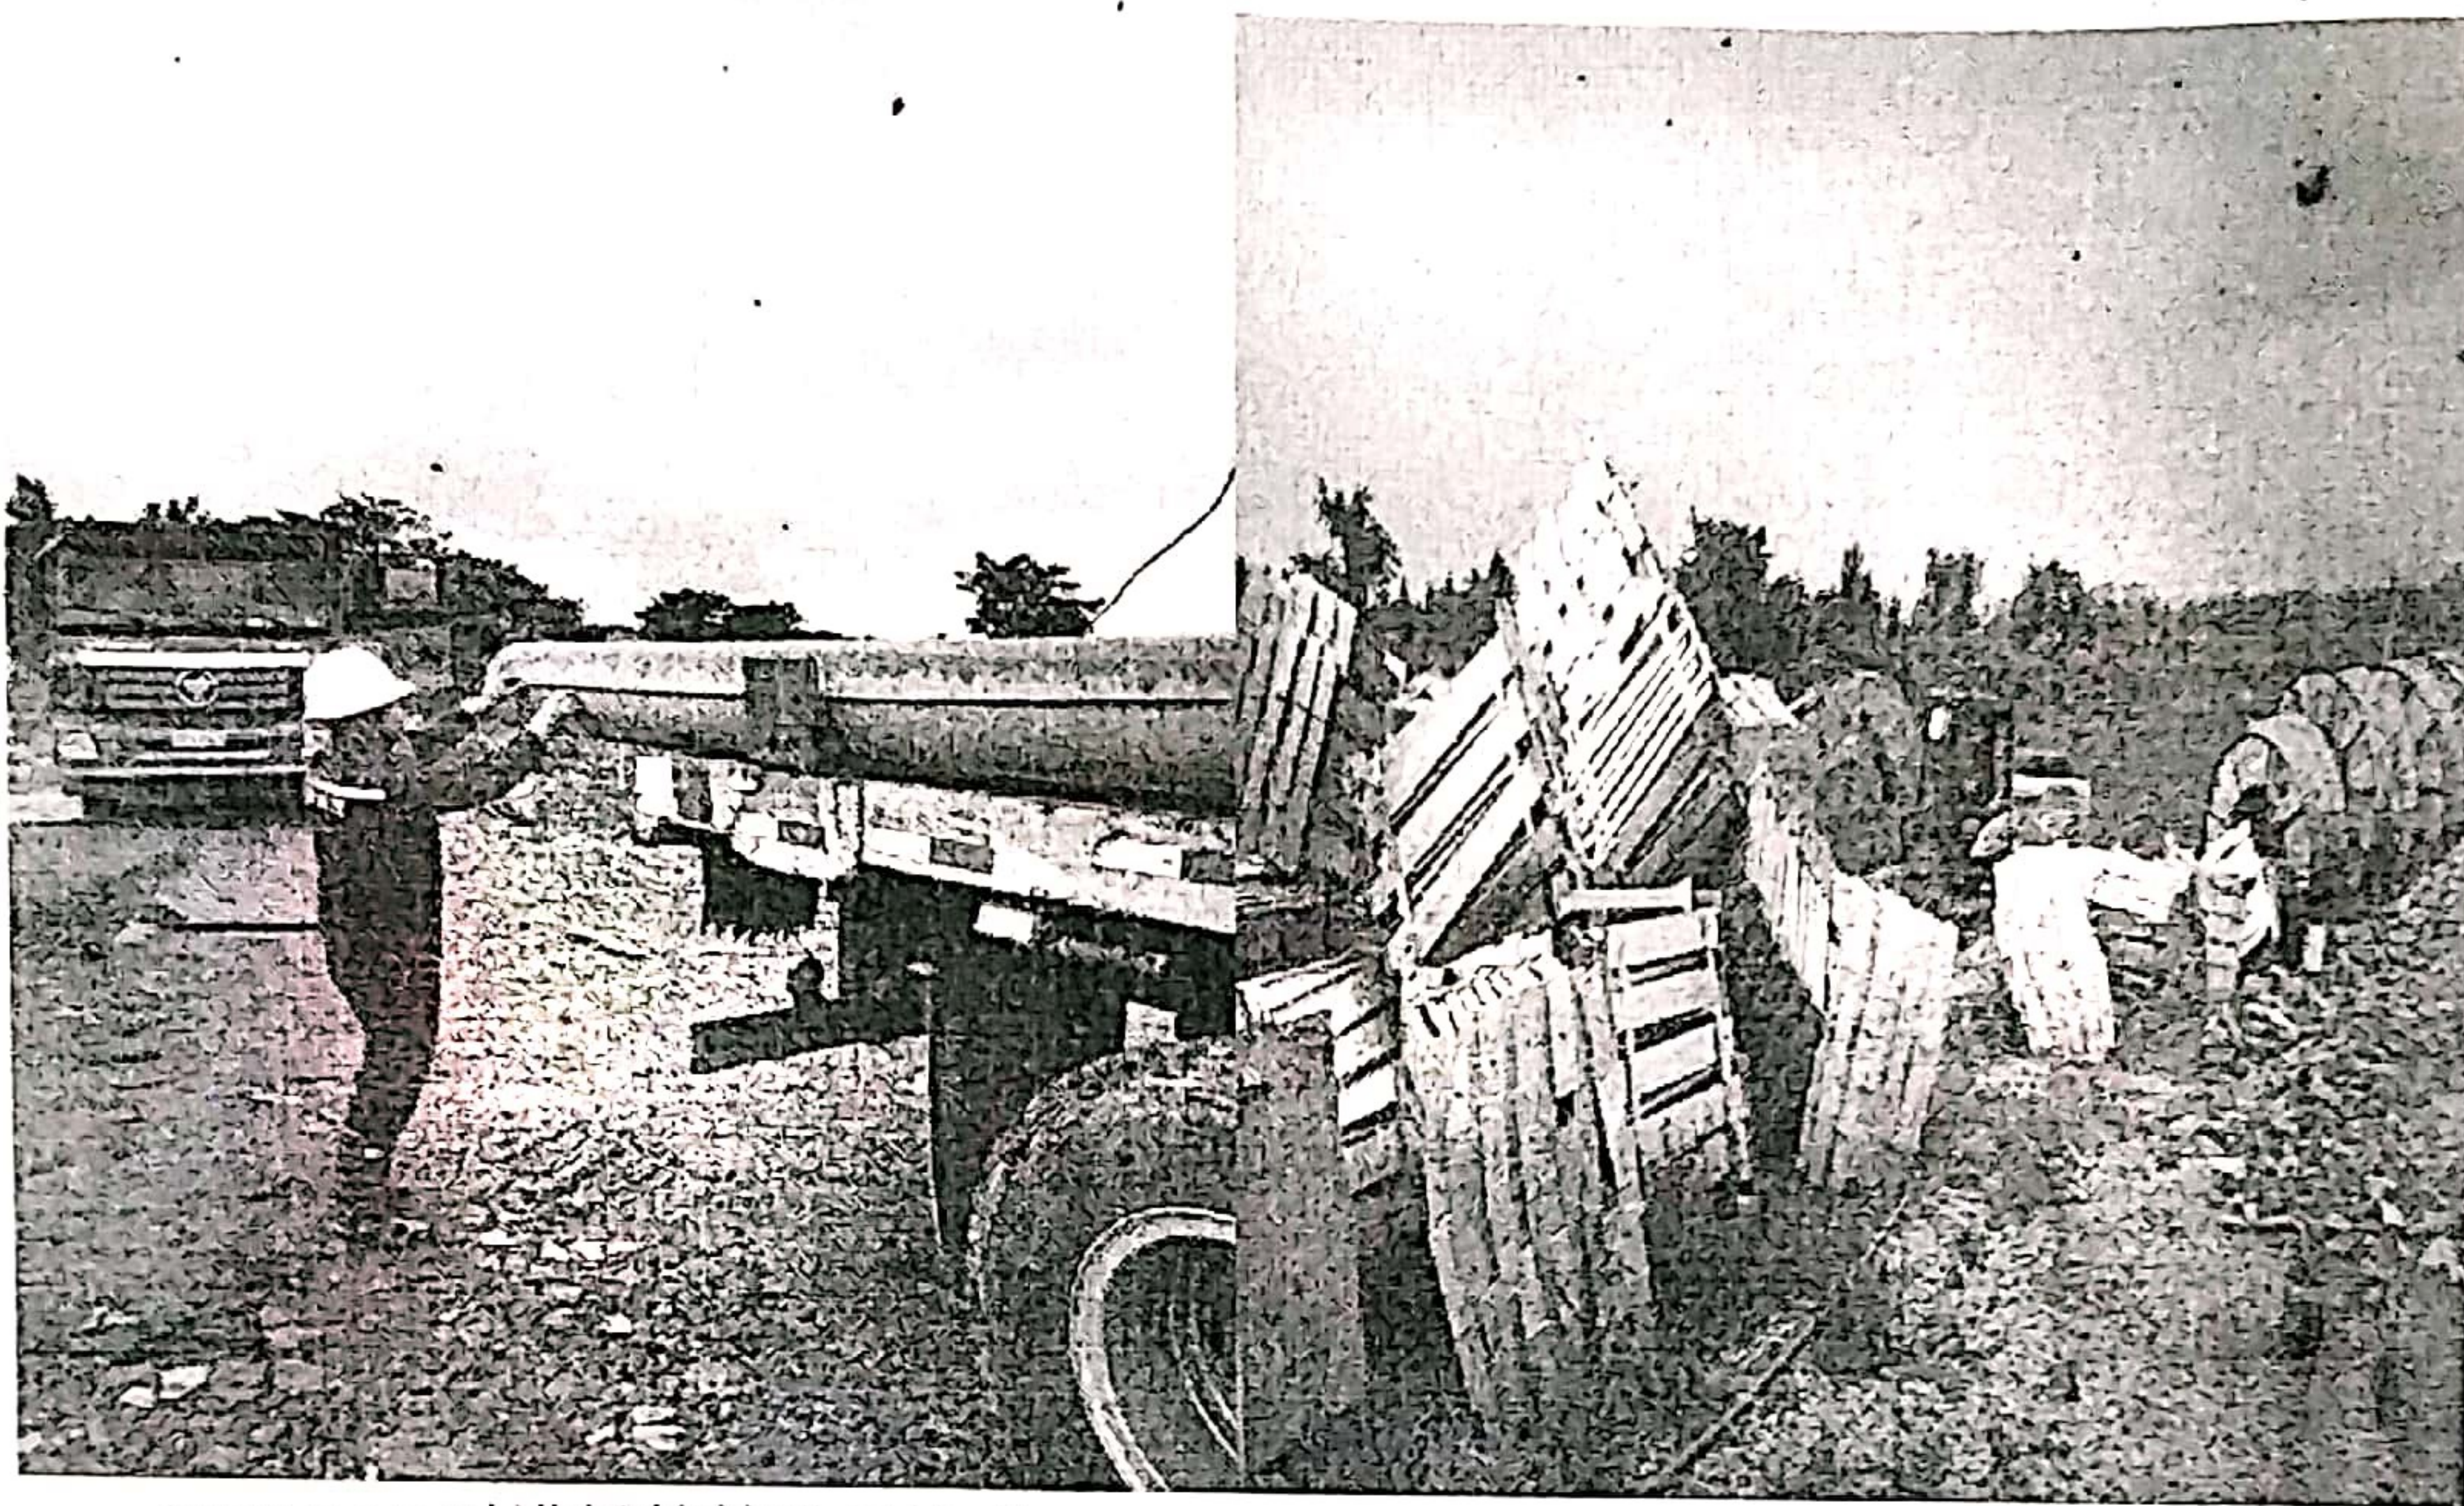

2020.6.19 对进场管桩进行检查

2020.6.19 支架立柱进场



2020.6.21 打桩施工



2020.6.21 逆变器及通讯柜开箱检查
