

正衡监理光伏项目工程建设监理周报


2020 年 26 期

项目名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		填报周期：2020. 11. 30-2020. 12. 06
本周工作如下：		
1、巡视检查道路修整施工、接地环网敷设、围栏施工、桥架安装整改、组件接地小黄线安装、接地扁铁刷黄绿漆，其施工质量及安全防护基本符合要求。 2、检查围栏施工发现部分围栏基础基坑深度未达到设计要求，要求施工单位加强施工工艺，尽快整改，并上报监理部复查。 3、检查接地环网敷设施工发现部分接地扁铁埋深不符合要求，要求施工单位加强施工质量，尽快整改，并上报监理部复查。 4、四方检查验收 88#、89#、90#、91#箱变区域单位工程，检查发现部分光伏专用电缆敷设凌乱，支架拉杆螺丝未紧固等问题，要求施工单位尽快安排人员进行整改。 5、主持召开第十九次监理例会，对现场所遇到的问题及本周工程量进行汇报。 6、检查验收监控设备安装，经检查发现部分监控设备接地线连接不符合要求，要求施工单位尽快整改。 7、检查验收部分光伏区围栏施工，经检查基本符合要求。 8、督促施工单位加强对施工班组进度的管控，按计划完成现场整改消缺工作。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、场内道路	IX#、XII#、X#集电线路道路收方完成共 770 米，压路完成共 550 米，累计道路收方 4190/7000 米，道路面层铺筑 2330/7000 米。	
2、支架及组件安装	88#箱变区域组件整改。82#、83#、81#、85#、84#、83#、98#箱变区域桥架盖板安装。	
3、逆变器及箱变	/	
4、其它	83#、97#、98#、82#、99#、85#箱变区域敷设接地环网完成共 3670 米，累计敷设接地环网 38320/39000 米。 围栏施工完成共 580 米，累计施工完成 4600/7000 米。 组件接地小黄线施工。桩头除锈、防腐消缺，桩头除锈、防腐已完成。96#、97#、85#、87#、88#、89#、90#、93#、101#箱变区域接地扁铁刷黄绿漆。	
5、出图情况	施工图纸已全部完成，已领取 20 册：土建 4 册、电气 10 册、水工 1 册、	

	远动 2 册、总图 3 册；设计已按集电线路命名联络会意见重新出版电气总平面图、电气主接线图蓝图。			
6、人员/机械情况	总包项目部管理人员 5 人，分包项目部管理人员 17 人，施工人员 101 人；现场施工有 4 台挖机、1 台压路机、3 辆随车吊机。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	6 月 19 日	6 月 27 日	7 月 10 日	
2、首套组件安装	6 月 26 日	6 月 30 日	7 月 14 日	
3、首个发电单元并网	9 月 10 日		9 月 16 日	
4、全容量并网	10 月 30 日		11 月 10 日	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	现场未验收区域，需加快整改、消缺进度，达到验收要求。 驱鸟方案需尽快确认，尽快开始进行施工。 升压站通讯管理机设备需更换，施工单位正在与南瑞继保沟通。 合法合规手续需尽快与清能公司前期办对接，安排专人逐项落实。			
五、下周计划主要工作内容				
1、接地敷设完成 1680 米：安全文明标语、警示牌、标示桩安装完善。光伏区垃圾清理。IX#、XI#、XII#集电线路区域道路修筑。现场整改消缺完成。围栏施工。				
2、督促施工单位加强对施工班组进度的管控，按计划完成现场整改消缺工作。督促施工单位增加机械、人员配置，对道路分区域同时开展施工。				
3、主持召开第二十次监理例会，对现场所遇到的问题及本周工程量进行汇报。				
4、现场接地环网敷设、电气消缺、整改进度较慢，施工单位需加快工作效率。				
5、部分方阵未完成分项验收工作，施工单位需尽快完成，其资料报验需同步进行。				
6、道路施工即将完成，要求施工单位对塘区地埂进行清表、除草、清理。				
7、上传项目监理资料至监理云。				

填报人：刘晨瑞 审核人：陈渝 时间：2020 年 12 月 06 日

工程现场照片（含文字描述）：

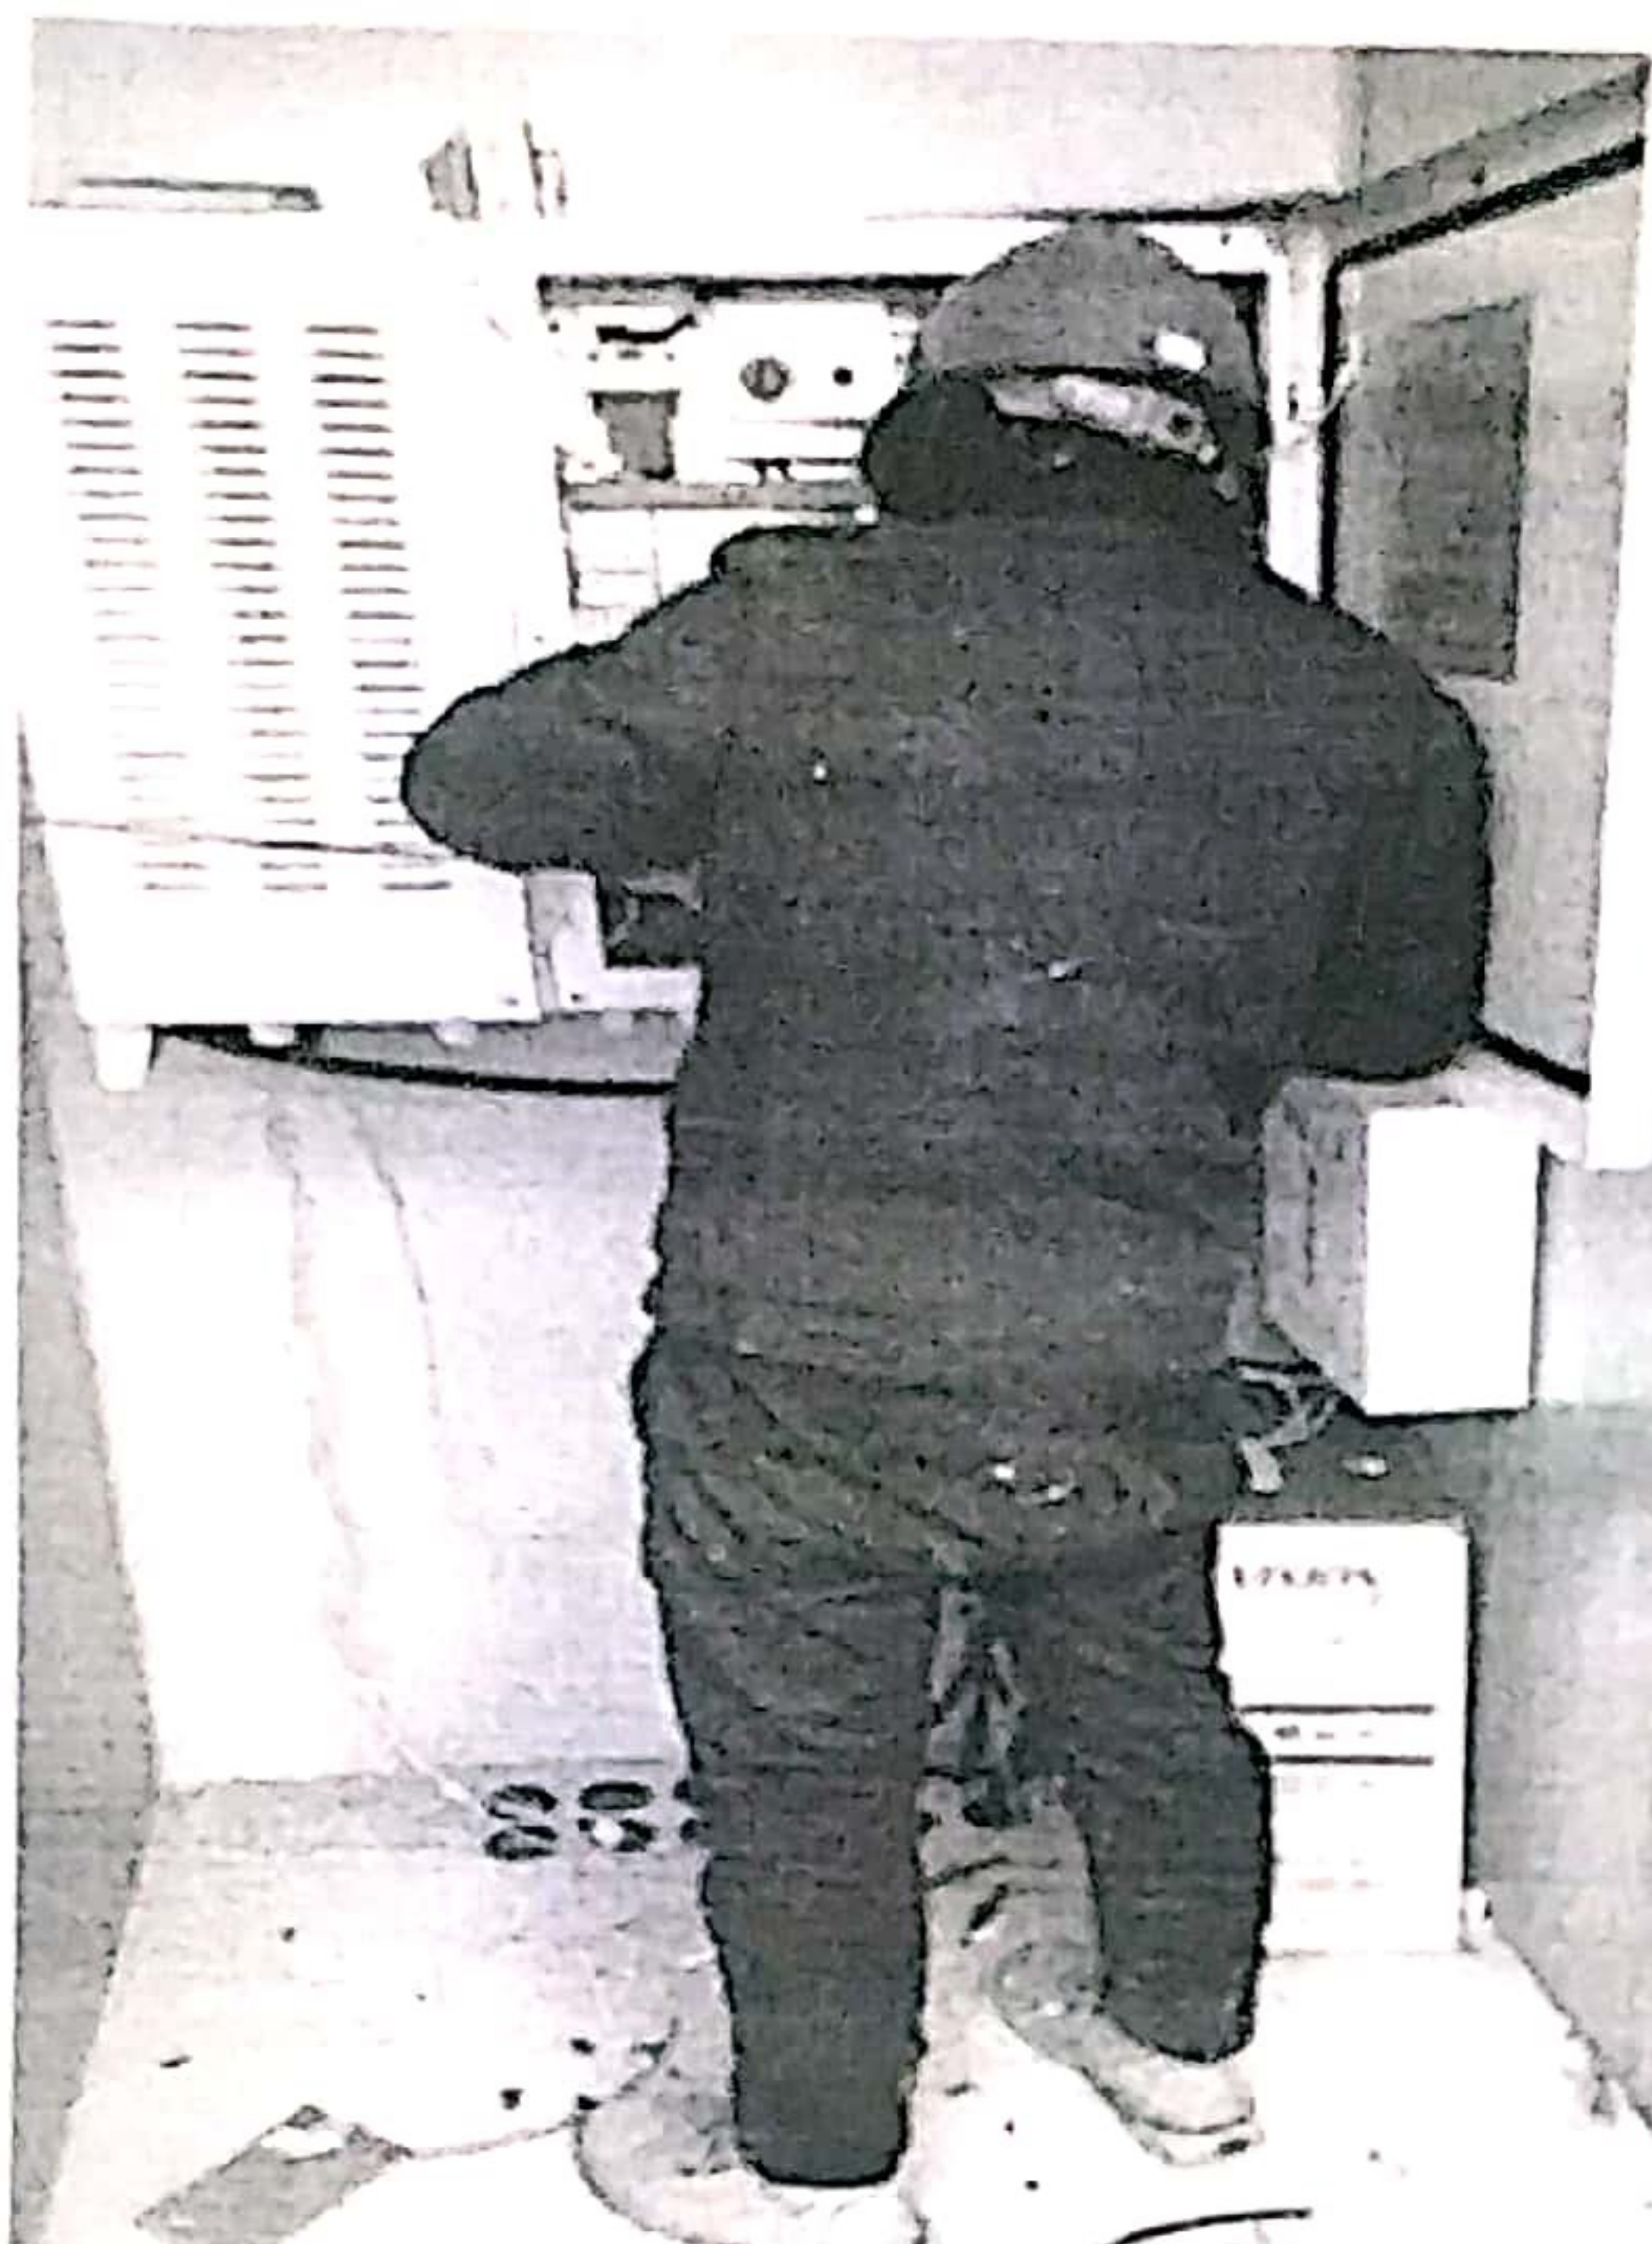

电气整改



接地扁铁刷黄绿漆



现场集电 X#线路（87#-93#）检查验收




围栏施工



场区监控检查验收



召开第十九次监理例会

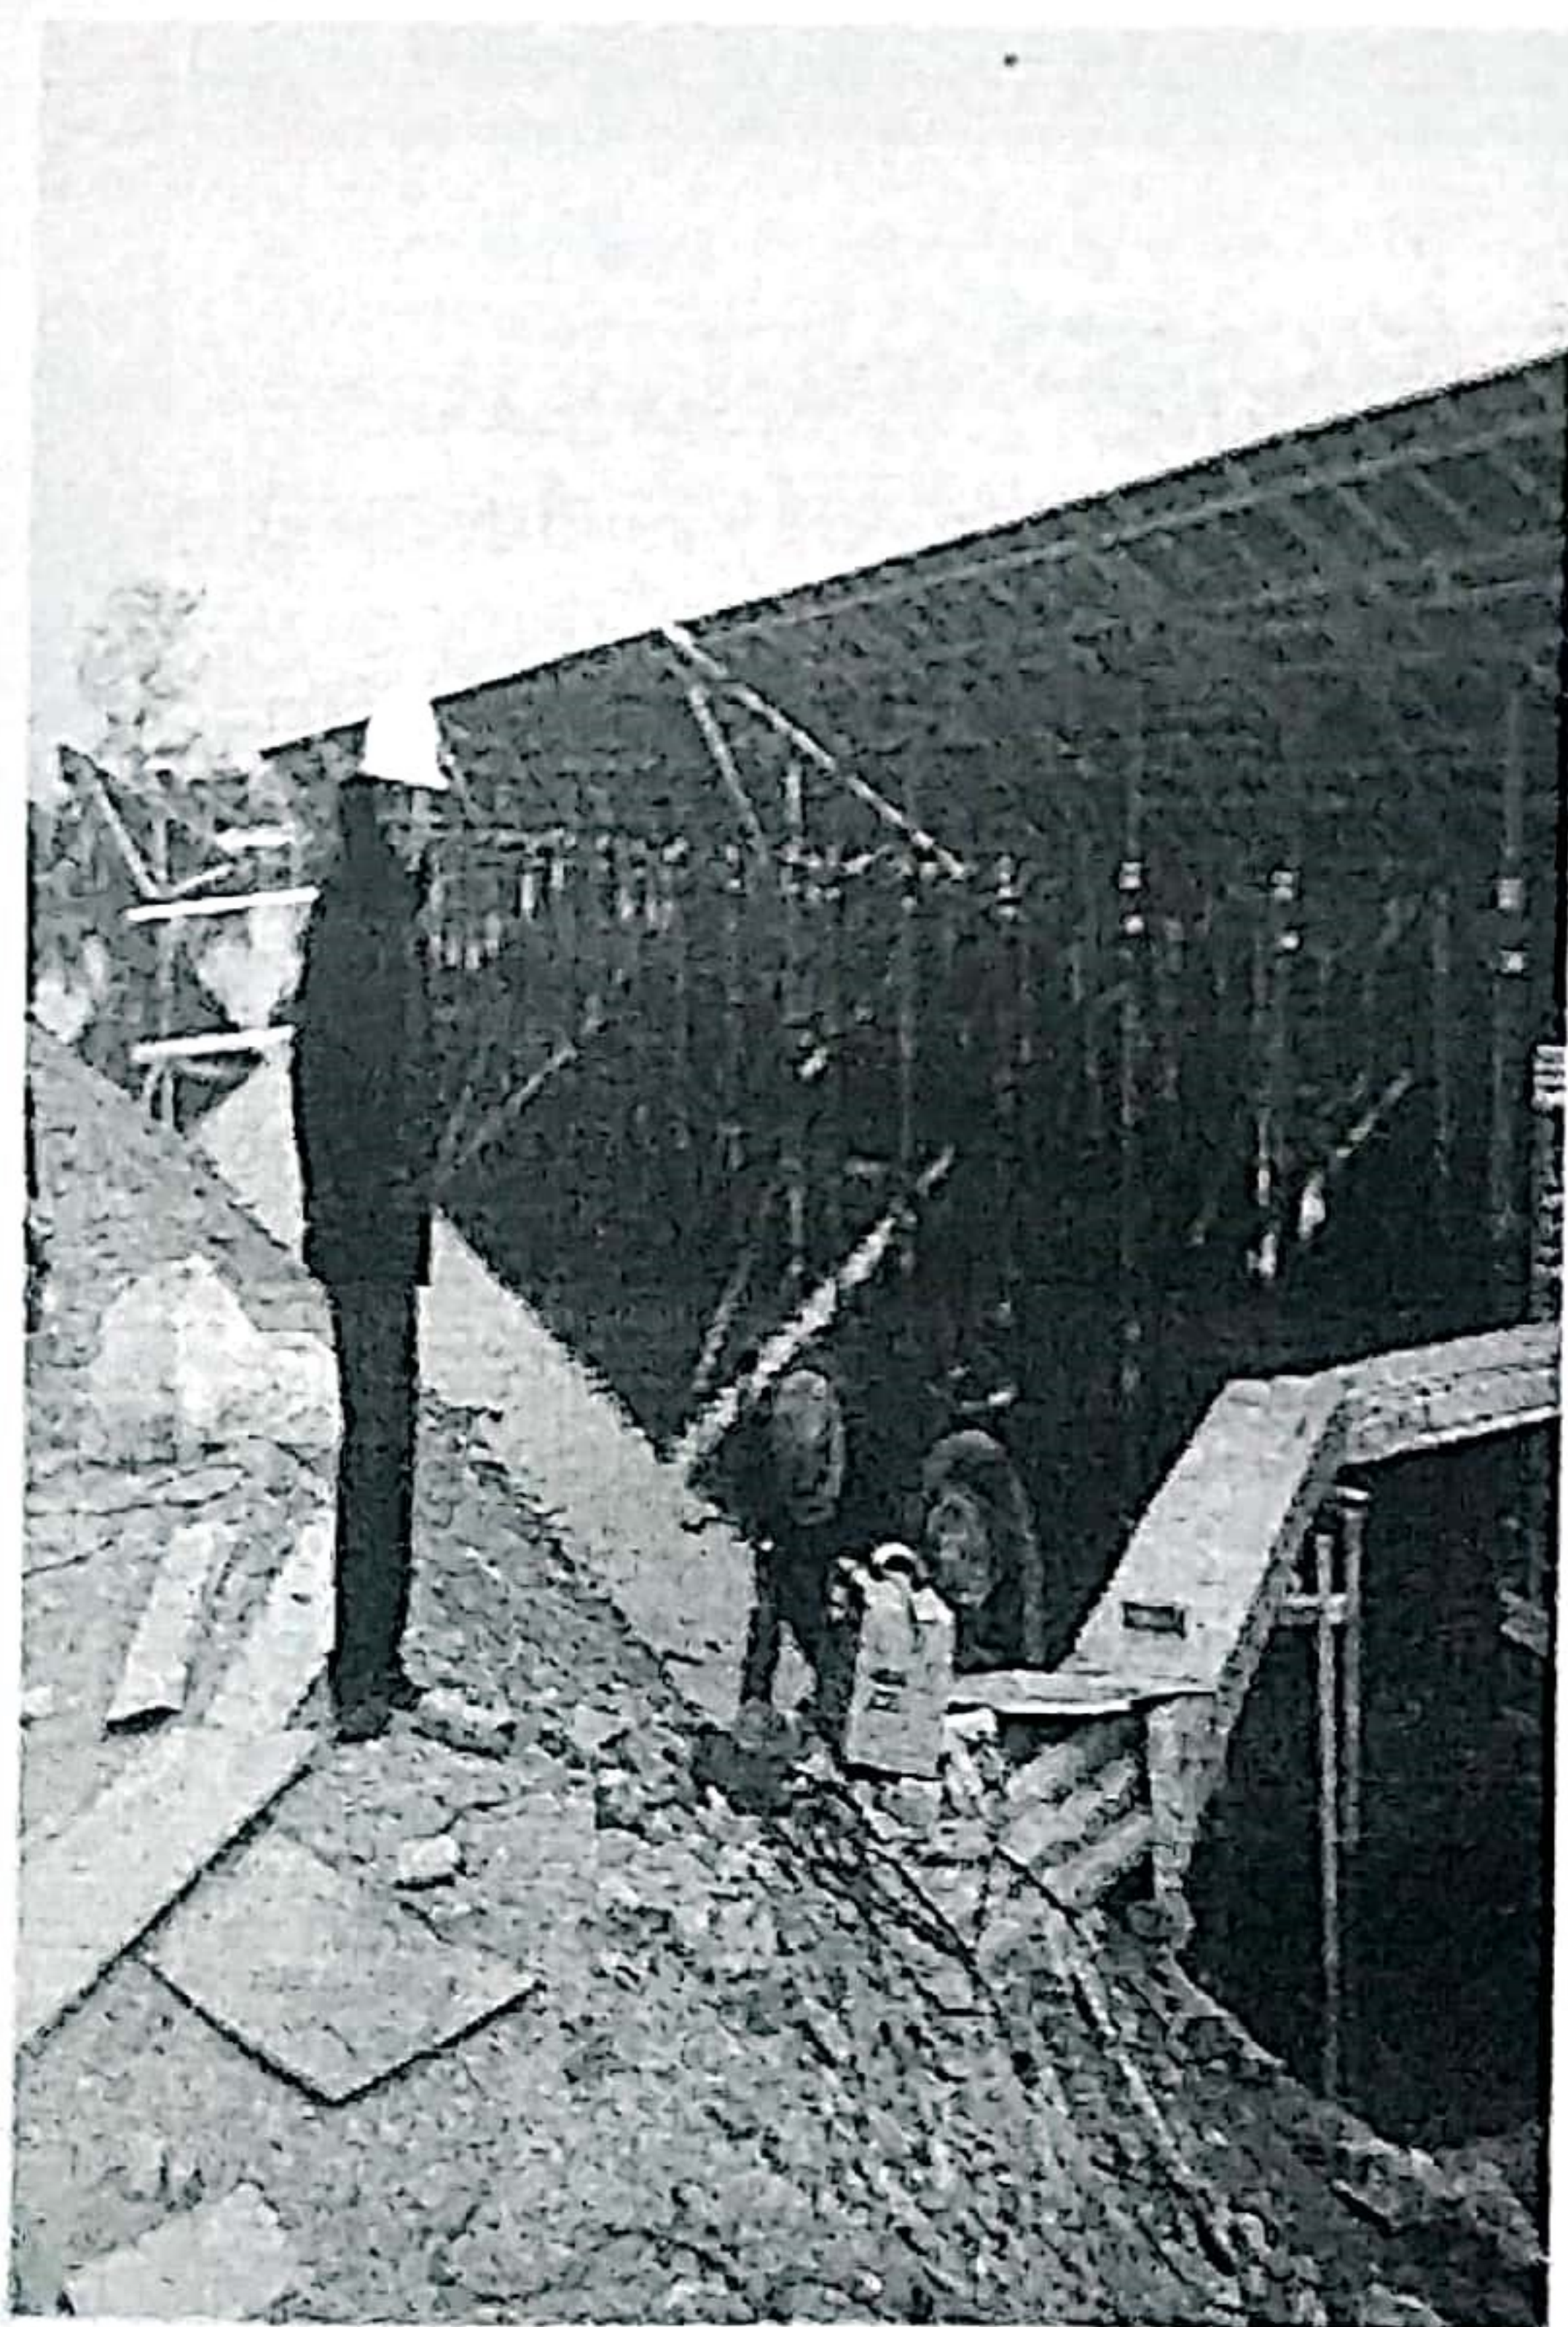

桥架盖板安装



道路修整
