


## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020年 07 期

项目: 南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目		填报周期: 2020.09.21-2020.09.27		
本周工作如下; 1、屋面夹具安装完成 100%。 2、屋面支架安装完成 100%。 3、组件吊装 10000 块。 4、安装组件完成 7000 块。 5、材料到场对加材料型号进行测量核对, 并填写材料开箱检查记录表。 6、因市局领导检查项目, 三天内无法施工。 需协调与帮助 无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装	支架完成 100% 组件完成 50%			
6、逆变器及箱变				
7、送出工程(含对侧)				
8、现场调试				
9、出图情况	已出图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货(0), 已到货数量(0)%延误原因及催货措施
	支架		2020.8.20	3.8MW
	组件		2020.8.20	3.8MW
11、人员/机械	施工人员 25 人			

情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	08.13		08.29	
2、首套组件安装	09.14			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	待定			
5、全容量并网	业主要求 10.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 苏航 审核人： 王立杰 时间： 2020 年 09 月 27 日

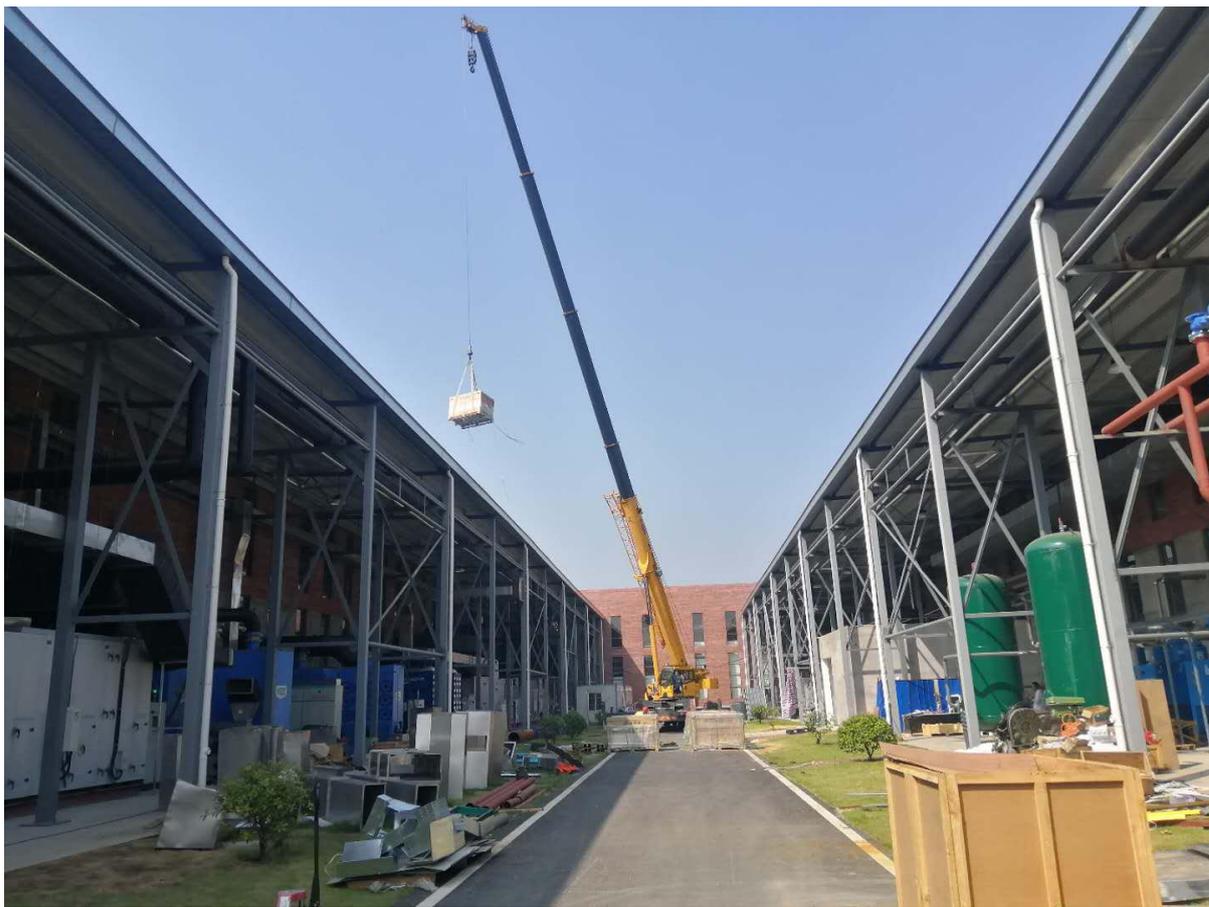

组件吊装
