

编号: SKQN-SKMYGF-JLZB-002

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第二期

2020 年 9 月 25 日—2020 年 10 月 01 日

总监理工程师: 王 强

常州正衡电力工程监理有限公司

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目监理项目部

2020 年 10 月 02 日

监 理 周 报

一、工程概况

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目，位于盐城市射阳县江苏省农垦麦芽有限公司，利用闲置屋顶新建分布式光伏电站项目。本项目光伏阵列由 4488 块标称功率为 370Wp 太阳能电池组件组成：以 22 块组件串联成一组串；每 13~15 串接入一台 100kW 组串式逆变器，每 7 串接入一台 50kW 组串式逆变器，每 5 串接入一台 40kW 组串式逆变器，每 4 台逆变器接入一个低压并网点，共计 4 个低压并网点。

每个发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列，太阳能电池阵列经组串逆变器接入就并网柜。

项目参建单位：

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

EPC 单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周工程实施情况

仓库大棚加固施工：

本周加固施工人员 6 人，班组长 1 人，项目部 2 人，升降机 2 台。

加固材料进场。檩条上打孔完成约 20%，檩条安装完成 5%。

江苏农垦清能公司来现场检查双节前安全文明。

三、本周监理工作情况

审核施工单位中秋、国庆双节期间施工方案、仓库大棚加固施工方案。

检查加固材料规格型号尺寸，符合设计方案要求。

检查现场全文明措施和加固施工质量。


四、工程存在问题及建议

无。

五、下周监理工作重点

仓库大棚加固安全文明及质量控制。



六、现场影像资料

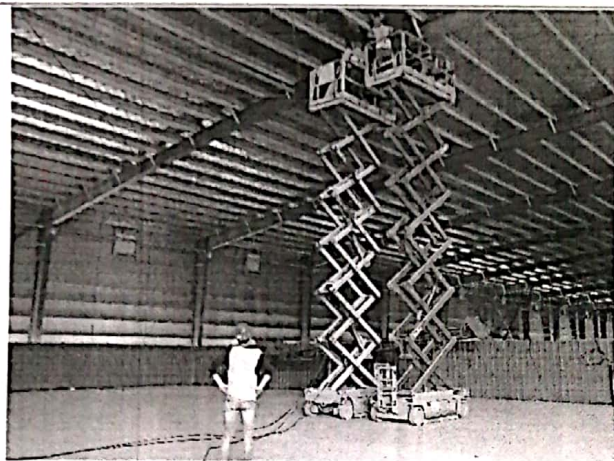



仓库大棚檩条加固



建设单位公司检查

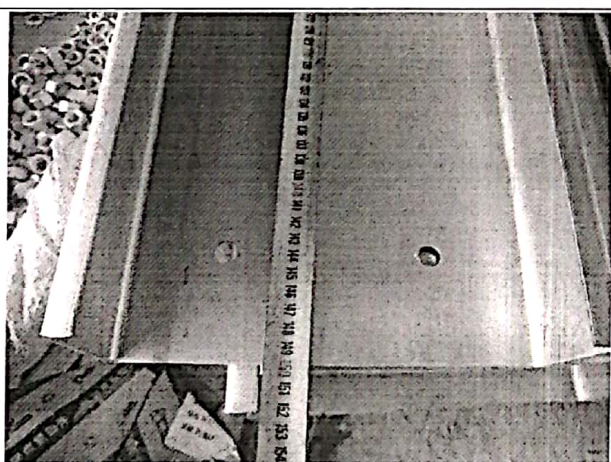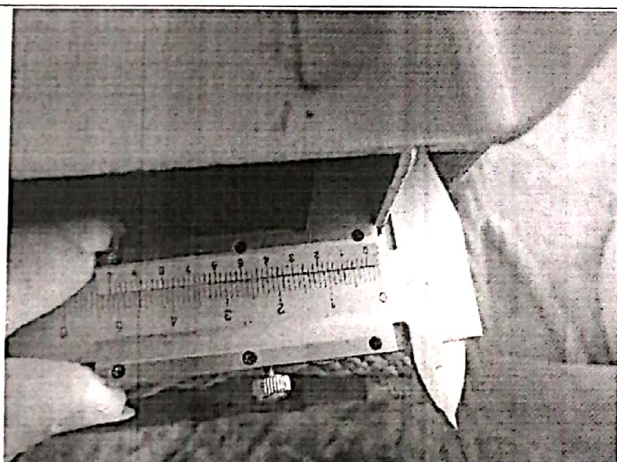

加固檩条材料进场检查

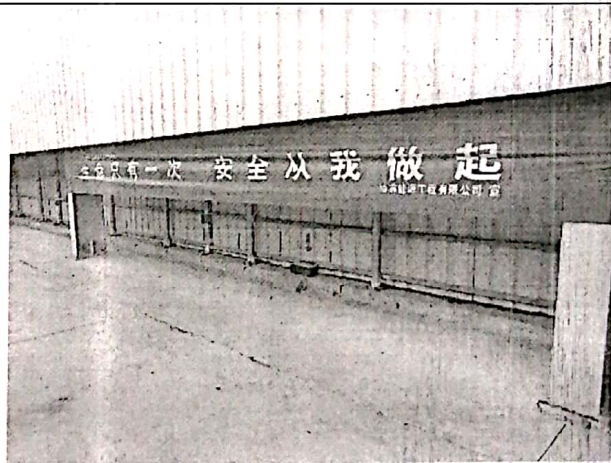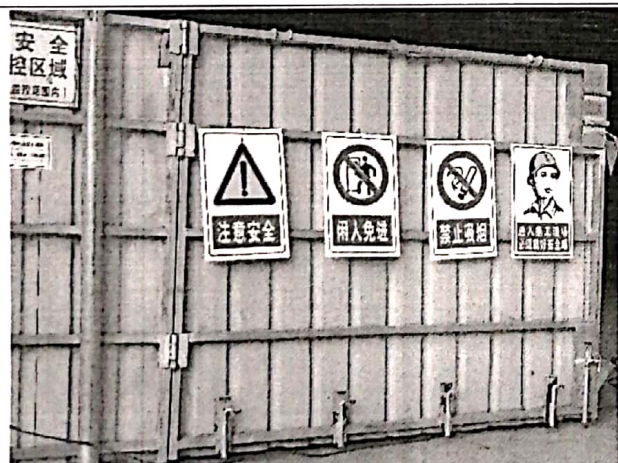

现场安全文明标识

常州正衡电力工程监理有限公司

苏垦麦芽有限公司 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电监理项目部

2020年10月02日

