

监 理 周 报

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目

2021年 11 月 12 日 第 14期

项目监理部（章）

监理工程师：杨磊

报告日期：2021 年 11 月 12日



1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	项目立项批准文件	已完成
2	合作协议	已完成
3	接入批复	已完成
4	购售电合同	办理中

2) 设计工作

施工图纸完成了80%。

3) 土建工程

光伏区工程：

1、本周B区钢结构加固全部完成，钢丝绳安装全部完成，交流电缆敷设回填全部完成，组件紧固2065块，15号全部安装完成，逆变器安装12台，配电室并网柜电缆头制作完成4台，A区中间柱安装累计58根，边柱安装累计76根。

4) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	6160块	0块	6160块	天河光能股份有限公司
2	钢结构支架	2MW	156根	156根	
3	中间柱	2MW	85根	85根	
4	横梁	2MW	92根	92根	
5	逆变器	30 套	0套	30套	阳光电源股份有限公司
6	基础	400 米	10米	390米	有施工队自己浇筑
7	汇流箱	6 台	0台	6台	
8	低压柜	4 台	0台	4台	

5) 安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；临时用电规范。现场安全及防疫管控符合安全及防疫规定要求。

6) 阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

光伏区部分：

1、下周计划,15号B区组件安装完成100%，B区组件紧固串线完成100%，逆变器、汇流箱安装完成100%，18进行A区钢绳紧固，19号进行A区组件安装，A区接地环网布置完成100%，17号A区完成横梁安装50%，A区中间柱全部安装完成。

3、存在问题及需要协调事宜

无

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点	完成时间	备注
勘察设计	2021年8月7日	未完成（原因：厂区内地下管网需要人工挖坑勘探）
土建工程	2021年10月10日	
支架安装	2021年10月15日	
组件安装	2021年10月20日	
集电线路电缆敷设	2021年10月23日	
逆变器及汇流箱（含接线）	2021年10月23日	
整体调试	2021年10月25日	
并网试运行	2021年10月30日	
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资

	
电缆沟盖砖	组件安装



立柱二次浇注



立柱吊装




并网柜电缆头制作



并网柜电缆头制作



逆变器安装交流线接线

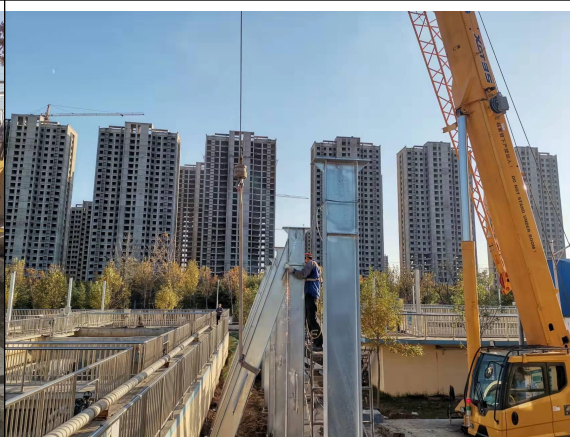

A区立柱斜梁吊装



A区接地施工



接地焊接后防腐
