

宁明桐棉风电场工程项目

监 理 周 报

第 2 期

编 制 时 间：2021.01.15

监理单位编制人：甄文波

监理单位审核人：徐耀生



常州正衡电力工程监理有限公司

宁明桐棉风电场工程项目监理部

项目名称：宁明桐棉风电场工程项目

建设单位：宁明县中汇新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：西安西电新能源有限公司

一、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周施工项目部主要完成：

1、风机平台：6#风机平台平整完成；

5#风机平台完成 70%；

7#风机平台完成 30%；

累计完成 2 基，完成总量 15%。

2、升压站：场地平整：场地平整完成 100%，倒运石方量 4 万 m³。

3、检修道路：升压站入场道路开挖完成 100%；

7#道路开挖完成完成 23%；

6#道路开挖完成 100%；

5#道路开挖完成 100%；

4#道路开挖完成 65%；

累计完成 2.33km，完成总量 16.7%。

4、外送线路：线路分坑：累计完成 94 基，完成总量 84%；

基础开挖：累计完成 94 基，完成总量 84%；

材料运输：累计完成 84 基，完成总量 75%；

钢筋绑扎：累计完成 52 基，完成总量 46%；

模板安装：累计完成 52 基，完成总量 46%；

基础浇筑：累计完成 52 基，完成总量 46%。

2、下周计划完成：

110kv 线路工程：

线路分坑计划完成 18 基； 基坑开挖计划完成 14 基； 材料运输计划完成 25 基；

钢筋绑扎计划完成 21 基； 模板安装计划完成 21 基； 基础浇筑计划完成 21 基。

场内道路及风机平台工程：

风机检修道路修筑计划完成 0.2km，累计完成 2.5km；5#风机平台计划破碎倒运 5000m³，完成 90%。

3、监理项目部监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的问题现场及时纠正、整改。

4、施工现场无重大安全隐患。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

工程项/事项	下周计划	累计完成	累计完成率	备注
升压站场地平整		4 万 m ³	100%	
风机平台	1 基	2 基	15%	
外线分坑	18 基	94 基	84%	
外线基础开挖	14 基	84 基	75%	
钢筋绑扎	21 基	52 基	46%	
模板安装	21 基	52 基	46%	
外线基础浇筑	21 基	52 基	46%	

四、 进场材料、设备

序号	名称	单位	总量	已到货量	累计完成百分比
1	风机				0
2	塔筒				0
3	锚栓				0
4	箱变				0
5	一次设备				0
6	二次设备				0
7	电缆				0

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：朱卫俊、甄文波

2、施工单位：西安西电新能源有限公司

(1) 项目经理：段燕

(2) 现场负责人：周中祥

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
2	监理旁站项目	1、	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
3	施工质量检查记录	1、	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	/
		4、	/
		5	/
5	分部分项工程验收	1、	/
		2	/
		3	/
		4	/
		5	/
6	其他	1	/
		2	/
		3	/
		4	/

七、施工质量问题

无

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

目前外线地块出现村民因赔偿款阻工现象，总包单位已协调工作正在进行中

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

十一、天气统计表。

日期 天气	10	11	12	13	14	15	16
晴		✓					
雨							✓
阴	✓		✓	✓	✓	✓	
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		1	2	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知				
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				

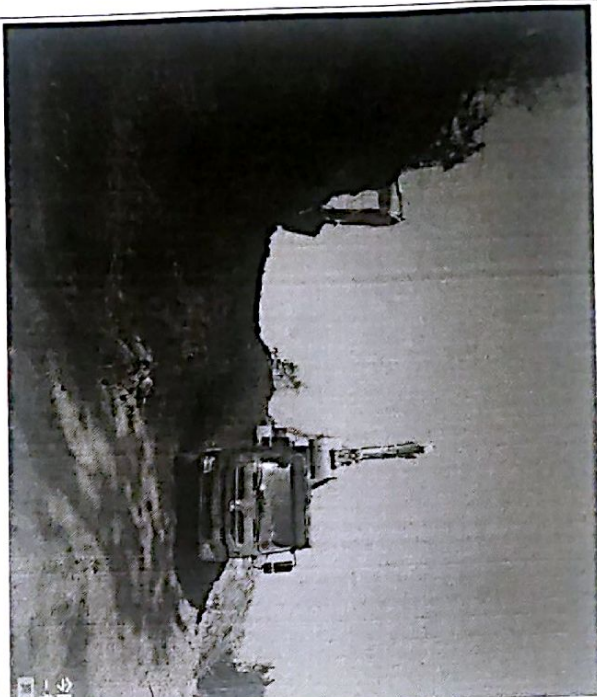
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

- 1、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述 图片	20210110 外线基础抽检 	20210112 土方倒运 
文字描述 图片	20210114 风机平台破碎 	20210115 周例会 
