

宁明桐棉风电场工程项目

监 理 周 报

第 8 期



编 制 时 间：2021.04.16

监理单位编制人：甄文波

监理单位审核人：徐耀生

常州正衡电力工程监理有限公司

宁明桐棉风电场工程项目监理部

项目名称：宁明桐棉风电场工程项目

建设单位：宁明县中汇新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：西安西电新能源有限公司

一、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周施工项目部主要完成：

1、风机平台：未施工。

2、检修道路：升压站入场道路开挖完成 100%；

7#道路本周开挖完成 80%； 6#道路本周开挖完成 100%；

5#道路本周开挖完成 100%； 4#道路本周开挖完成 100%；

3#道路本周开挖完成100%； 累计完成2.955km，完成总量21%。

3、外送线路：线路分坑：本周末施工；累计完成 108 基，完成总 96.4%；

基础开挖：本周完成 2 基；累计完成 109 基，完成总量 97.3%；

材料运输：本周末施工；累计完成 109 基，完成总量 97.3%；

钢筋绑扎：本周完成 3 基；累计完成 106 基，完成总量 95%；

模板安装：本周完成 3 基；累计完成 104 基，完成总量 93%；

基础浇筑：本周完成 3 基；累计完成 104 基，完成总量 93%；

接地敷设：本周完成 22 基；累计完成 82 基，完成总量 73.2%；

塔材转运：本周完成 3 基；累计完成 58 基，完成总量 52%；

杆塔组立：本周完成 8 基；累计完成 42 基， 完成总量 37.5%。

4. 拌和站：场地平整完成；设备基础开挖完成；设备基础垫层浇筑完成；

设备基础钢筋绑扎完成；水池开挖完成。

2、下周计划完成：

110kv 线路工程：

钢筋绑扎计划完成 2 基； 模板安装计划完成 2 基； 基础浇筑计划完成 2 基；

接地敷设计划完成 20 基；铁塔运输计划完成 7 基；塔组立计划完成 7 基。

场内道路及风机平台工程：

风机检修道路修筑计划完成 0.06km，累计完成 3.015km； 5#检修道路修整完成；防城港方向道路中心点放样完成 1.5km 至 14#吊装平台。

拌和站：

搅拌站设备料仓浇筑完成，水池修整完成，搅拌站设备安装。

3、监理项目部监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的问题现场及时纠正、整改。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

工程项/事项	下周计划	累计完成	累计完成率	备注
接地敷设	20 基	82 基	73.2%	
外线分坑	0 基	108 基	96.4%	
外线基础开挖	0 基	109 基	97.3%	
钢筋绑扎	5 基	106 基	95%	
模板安装	2 基	104 基	93%	
外线基础浇筑	2 基	104 基	93%	
杆塔组立	7 基	42 基	37.5%	

四、 进场材料、设备

序号	名称	单位	总量	已到货量	累计完成百分比
1	风机	/	/	/	0
2	塔筒	/	/	/	0
3	锚栓	/	/	第一批已发货	0
4	箱变	/	/	/	0
5	一次设备	/	/	/	0
6	二次设备	/	/	/	0
7	电缆	/	/	/	0

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

 监理人员：苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波

2、施工单位：西安西电新能源有限公司

 （1）项目经理：段燕

 （2）现场负责人：周中祥

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
2	监理旁站项目	1、基塔基础浇筑	旁站记录表
		2、接地敷设	旁站记录表
		3、杆塔组立	旁站记录表
		4、	/
		5	/
3	施工质量检查记录	1、	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	/
		4、	/
		5	/
5	分部分项工程验收	1、	/
		2	/
		3	/
		4	/
		5	/
6	其他	1	/
		2	/
		3	/

七、施工质量问题

上周问题整改情况：

110kv送出线路工程： G109接地与铁塔连接不规范，且塔材个别螺栓未紧固到位，已安排班组对接地线螺栓进行增补，未紧固到位的已重新拧紧。

场内道路及风机平台：5#风机道路坡度较大，已按照设计要求对坡度大的地方进行破碎，渣土运至弃渣场，整改完成。

本周发现问题及整改方案：

110kv送出线路工程： N3基础地脚螺栓未上黄油且粘有水泥灰浆，用铁丝刷清理水泥砂浆，涂抹黄油保护。

场内道路及风机平台：7#风机道路k0+700-730处道路靠近上山体处土石方松动易塌方，需加大坡度值。

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

上周问题整改情况：7#风机道路外侧悬崖处已悬挂警示标识或警示旗。

N110铁塔在完成铁塔组立后现场垃圾未进行清理。现已清理完成。

本周发现问题及整改方案：7#风机道路k0+700-730处道路内侧山体土石方松动易塌方，需加大坡度值。

九、沟通协调

110kv 送出线路工程： N100#另一股东要国土局的针对杆号的批复，现施工单位只有通道的。

场内道路及风机平台：17#风机场内道路，等待业主回复开工时间；7#风机道路

k0+270 处 10kv 高压线需移除；7#吊装平台下方设弃渣场、3#风机道路优化路线坐标已于 4 月 2 日提报业主，请业主给予协调回复。；

拌和站及风机基础:6#、5#风机基础坐标复核后，不能满足施工要求，已按照联系单形式进行了上报。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

十一、天气统计表。

日期 天气	10	11	12	13	14	15	16
晴							
雨	✓					✓	✓
阴		✓	✓	✓	✓		
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		1	9	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸			1	
4	发出监理通知		2	5	
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				

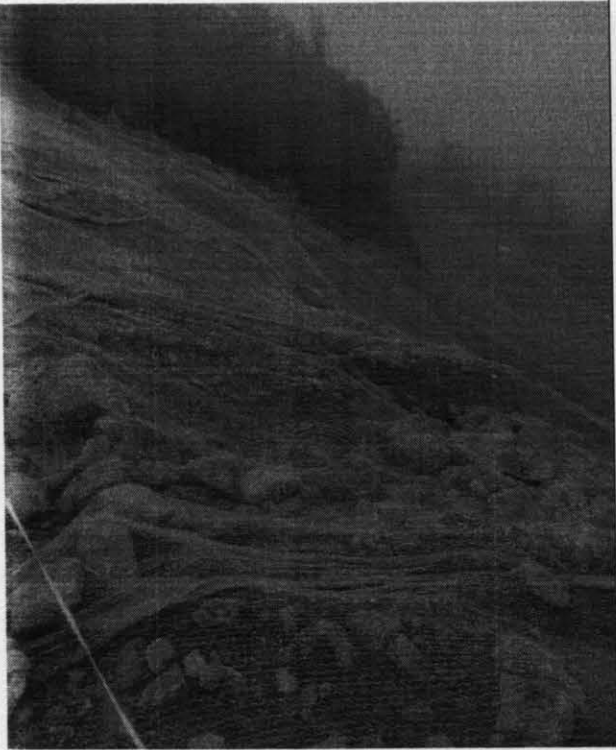
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

- 1、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述 图片	20210413 边坡绿网覆盖	20210414 山体开挖及土石方倒运
		
文字描述 图片	20210415 铁塔组装	20210416 周例会
	
