

宁明桐棉风电场工程项目

监 理 周 报

第 10 期

编 制 时 间：2021.04.30

监理单位编制人：甄文波

监理单位审核人：徐耀生



常州正衡电力工程监理有限公司

宁明桐棉风电场工程项目监理部

项目名称：宁明桐棉风电场工程

建设单位：宁明县中汇新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：西安西电新能源有限公司

一、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周施工项目部主要完成：

- 1、风机平台：未施工。
- 2、检修道路：升压站入场道路开挖完成 100%；
6#道路本周开挖完成 100%； 3#道路本周开挖完成 100%；
5#道路本周开挖完成 100%； 4#道路本周开挖完成 100%；
7#K0+344-K0+965处路面检修完成；测量放线17#道路两边线完成1.5km。
- 3、外送线路：线路分坑：本周末施工；累计完成 108 基，完成总 96.4%；
基础开挖：本周完成 0 基；累计完成 109 基，完成总量 97.3%；
材料运输：本周末施工；累计完成 109 基，完成总量 97.3%；
钢筋绑扎：本周完成 0 基；累计完成 106 基，完成总量 95%；
模板安装：本周完成 0 基；累计完成 104 基，完成总量 93%；
基础浇筑：本周完成 0 基；累计完成 104 基，完成总量 93%；
接地敷设：本周完成 5 基；累计完成 101 基，完成总量 90.1%；
塔材转运：本周完成 5 基；累计完成 72 基，完成总量 64.2%；
杆塔组立：本周完成 9 基；累计完成 62 基， 完成总量 55.3%。
- 4. 拌和站：场地平整完成；水池模板支设浇筑完成；砖砌完成50%；罐体焊接完成；主机安装完成40%。

2、下周计划完成：

- 110kv 线路工程：
钢筋绑扎计划完成 2 基； 模板安装计划完成 2 基； 基础浇筑计划完成 2 基；
接地敷设计划完成 6 基；铁塔运输计划完成 20 基；塔组立计划完成 10 基。

开展接地验收工作；导线金具计划在 4 月 30 日到货、导线计划在 5 月 10 号到货、光缆计划在 5 月 15 日到货。

场内道路及风机平台工程：

7#风机平台开挖；防城港方向道路两侧边线点放样 1km。

拌和站： 搅拌站主体设备安装。

3、监理项目部监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的问题现场及时纠正、整改。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

工程项/事项	下周计划	累计完成	累计完成率	备注
接地敷设	6 基	101 基	90.1%	
外线分坑	0 基	108 基	96.4%	
外线基础开挖	0 基	109 基	97.3%	
钢筋绑扎	2 基	106 基	95%	
模板安装	2 基	104 基	93%	
外线基础浇筑	2 基	104 基	93%	
杆塔组立	10 基	62 基	55.3%	

四、 进场材料、设备

序号	名称	单位	总量	已到货量（或预计到货时间）	累计完成百分比
1	风机	台	13	6 月 30 日到 3 台； 7 月 30 日到 3 台； 8 月 30 日到 3 台； 9 月 30 日到 4 台。	0
2	塔筒	台	13	6 月 15 日到 5 台，后面按照风机时间	0
3	锚栓	套	13	5 月 5 日 5 套到场，后面按照风机时间	0
4	箱变	/	/	6 月 30 日到场	0
5	一次设备	/	/	6 月 30 每日陆续进场	0

6	二次设备	/	/	6 月 30 每日陆续进场	0
7	电缆	/	/	7 月 15 每日陆续进场	0

锚板第一批次 5 套已到场

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

 监理人员：苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平

2、施工单位：西安西电新能源有限公司

 (1) 项目经理：段燕

 (2) 现场负责人：周中祥

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、锚板到场 5 套	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
2	监理旁站项目	1、基塔基础浇筑	旁站记录表
		2、接地敷设	旁站记录表
		3、杆塔组立	旁站记录表
		4、	/
		5	/
3	施工质量检查记录	1、	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	/
		4、	/
		5	/
5	分部分项工程验收	1、	/
		2	/
		3	/

		4	/
		5	/
6	其他	1	/
		2	/
		3	/
		4	/

七、施工质量问题

上周问题整改情况：

110kv送出线路工程： 无。

场内道路及风机平台：无。

本周发现问题及整改方案：

110kv送出线路工程：无。

场内道路及风机平台：无。

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

上周问题整改情况：安全联合检查所发现的问题已进行整改。

本周发现问题及整改方案：无。

九、沟通协调

110kv 送出线路工程： 无。

场内道路及风机平台：17#风机场内道路，等待业主回复开工时间；7#风机道路k0+270 处 10kv 高压线需移除；防城港方向 17#风机道路已放样 1500 米，需业主组织村民清点树木。

拌和站及风机基础:无。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

十一、天气统计表。

日期 天气	24	25	26	27	28	29	30
晴							✓
雨		✓	✓	✓	✓		
阴	✓					✓	✓
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

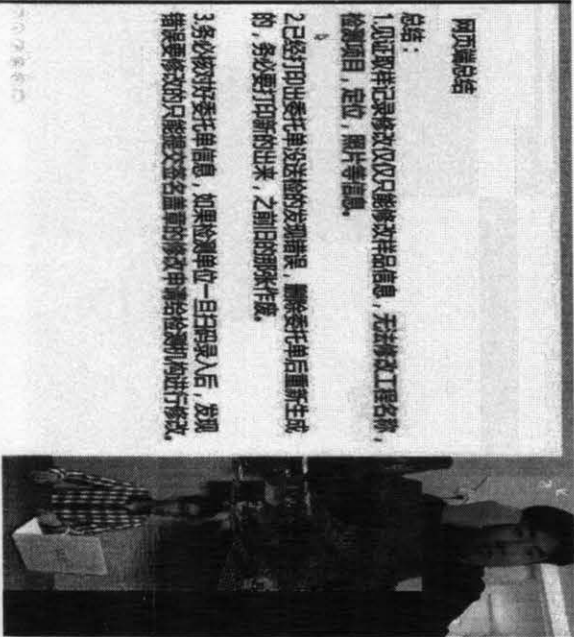
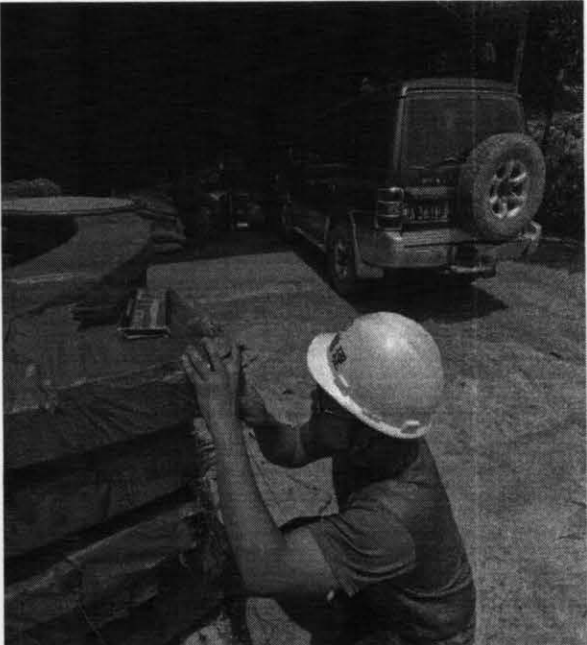
序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		1	11	
2	审批施工组织设计（方案）			1	
3	审核施工图纸			0	
4	发出监理通知		1	8	
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

1、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	20210426 见证员考试培训	20210427 锚板检验
图片		
文字描述	20210428 施工现场安全巡查	20210429 外线铁塔组立
图片	
