

星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报


第 三 期

（2021 年 03 月 28 日-2021 年 04 月 03 日）


工程名称	星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	建设单位	滁州嘉晖新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江西子联合工程有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 支架基础混凝土浇筑本周 2650 个 总共完成 8750 个 完成总量的 80%，本周钢筋笼焊接完成 20%，完成总量的 96%，本周屋顶防水卷材铺设完成 25%，完成总量的 93%，本周支架安装完成 30%，完成总量的 30%。箱变基础开挖完成，其余工作未开展。		
下周计划	支架基础混凝土浇筑全部完成（包括不符合要求的），钢筋笼焊接全部完成，屋顶防水卷材铺设全部完成，支架安装完成 60%。箱变完成 50%。		
安全文明施工情况	正常		
施工质量	部分支架基础混凝土水泥墩依然未整改到位，我监理单位已严格把控，令其整改。		
设备材料进场情况	已进场 282 个组串支架材料 到场材料总量的 40%。		
人员机械情况	施工人员;22 人，泵车 1 辆，吊车 1 辆，手推车 4 辆，铁锹 4 把，振捣棒 1 个。		



支架基础混凝土水泥墩浇筑

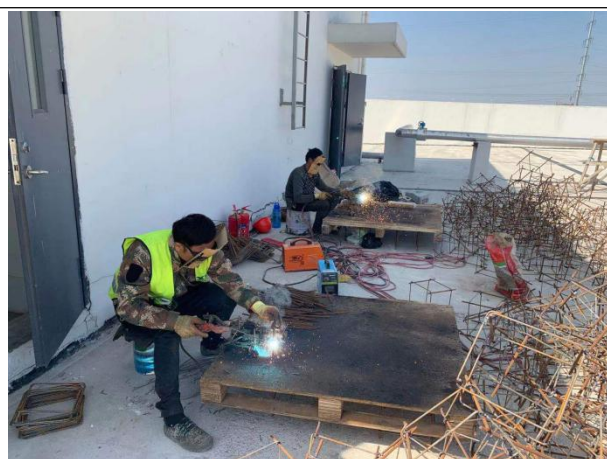

钢筋笼焊接

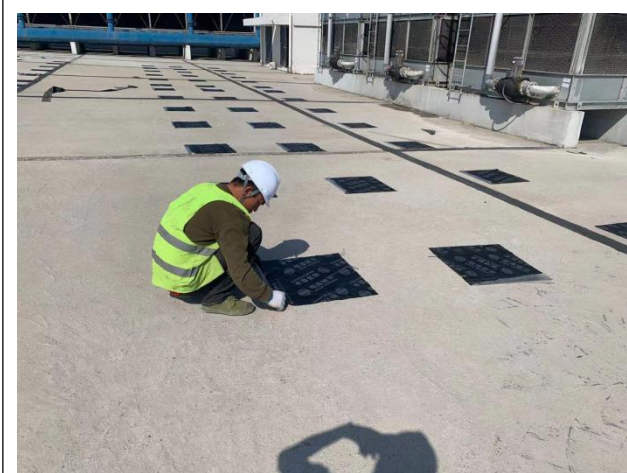

防水材料铺设



支架安装检查



第二次会议



B1 拆模
