

星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 四 期

（2021 年 04 月 04 日-2021 年 04 月 10 日）


工程名称	星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	建设单位	滁州嘉晖新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江西子联合工程有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 支架基础混凝土浇筑完成总量的 80%，本周钢筋笼焊接完成 4%，完成总量的 100%，本周屋顶防水卷材铺设完成 7%，完成总量的 100%，本周支架安装完成 10%，完成总量的 40%。箱变基础完成 40%，其余工作未开展。		
下周计划	支架基础混凝土浇筑全部完成（包括不符合要求的），开始组件安装，支架安装完成 60%。箱变基础完成 50%。		
安全文明施工情况	正常		
施工质量	1、部分支架基础混凝土水泥墩依然未整改到位，我监理单位已严格把控，令其整改。 2、支架连接件壁厚要求不低于 3mm，实测 2.5mm，不符合要求。 3、支架基础摆放不到位，需放在防水材料中心点。 4、现场支架材料有喷自喷镀锌情况，影响工程质量。 5、钢筋笼锈蚀严重，影响工程质量。		
设备材料进场情况	已进场 564 个组串支架材料 到场材料总量的 80%。		
人员机械情况	施工人员;22 人，泵车 1 辆，吊车 1 辆，手推车 4 辆，铁锹 4 把，振捣棒 1 个。		



检查箱变基础




箱变基础砌筑

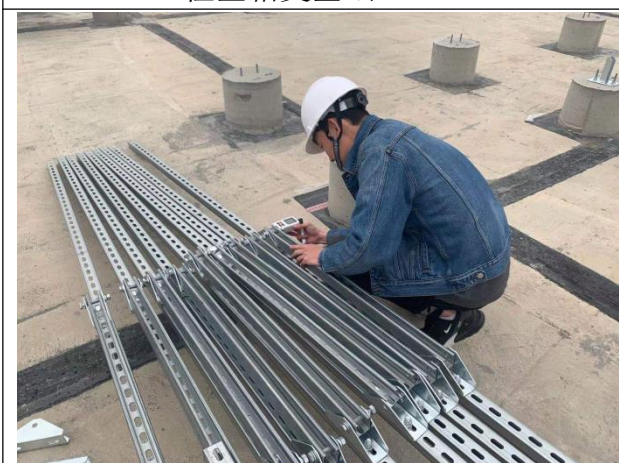

检测支架材料镀锌



检查支架材料厚度

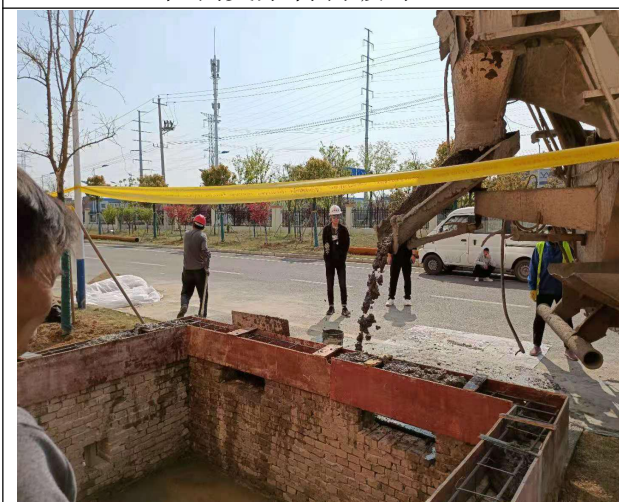

箱变基础浇筑



建设单位对现场检查
