

星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
目

监 理 周 报

第 五 期

（2021年 04 月 11 日-2021年 04 月 17 日）

工程名称	星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	建设单位	滁州嘉晖新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江西子联合工程有限公司		
本周施工内容及进度	<p>本周施工内容如下：</p> <p>本周支架基础混凝土浇筑 2050，已全部完成，钢筋笼焊接已全部完成。屋顶防水卷材铺设已全部完成，支架安装完成 55%，完成总量的 95%。箱变基础完成 40%，本周完成总量的 80%，本周逆变器安装已全部完成，本周平方线敷设完成 15%。其余工作未开展。</p>		
下周计划	开始组件安装，支架安装全部完成，箱变基础完成 100%。箱变就位，桥架安装 80%。		
安全文明施工情况	正常		
施工质量	<ol style="list-style-type: none"> 1、箱变基础接地扁铁镀锌及尺寸不符合要求。 2、箱变基础预埋件未预埋，严重影响施工质量。 3、箱变基础有变更，需出具设计变更。 		
设备材料进场情况	已进场 705 个组串支架材料 到场材料总量的 100%，交直流电缆进场 100%。		
人员机械情况	施工人员;27 人，泵车 1 辆，吊车 1 辆，叉车 1 辆，手推车 4 辆，铁锹 4 把，振捣棒 1 个。		



支架基础浇筑




箱变基础抹灰




吊装支架材料



检查支架材料厚度

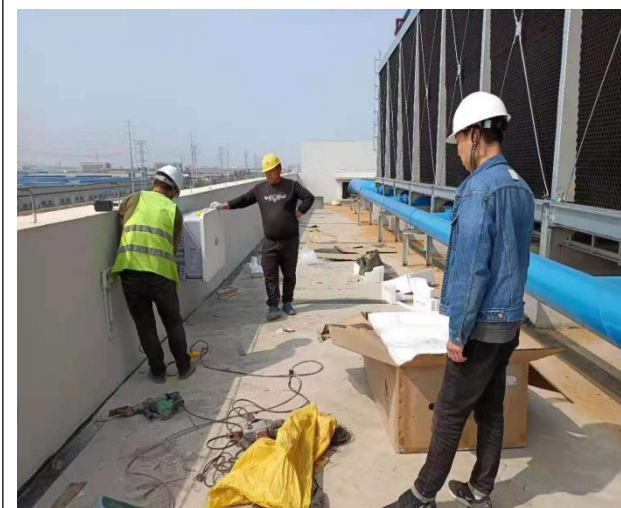

逆变器安装检查

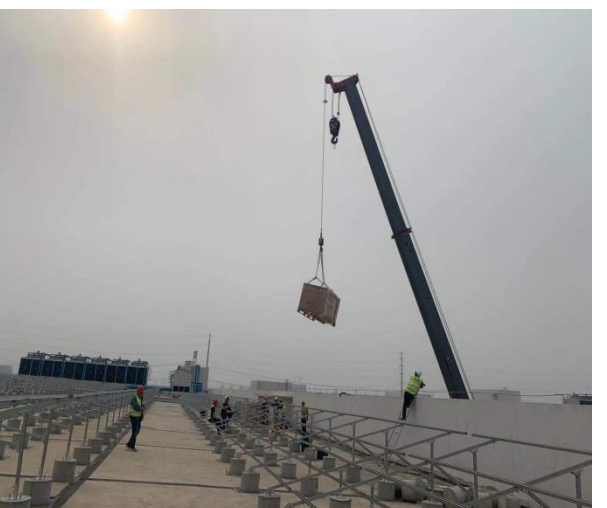

吊装组件
