


星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 六 期

（2021 年 04 月 18 日-2021 年 04 月 24 日）

工程名称	星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	建设单位	滁州嘉晖新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江西子联合工程有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 本周支架基础混凝土浇筑已全部完成，钢筋笼焊接已全部完成。屋顶防水卷材铺设已全部完成，支架安装已全部完成，箱变基础完成总量的 80%，逆变器安装已全部完成，本周 1×4 平方线敷设完成 55%，本周桥架安装 55%，本周组件安装 8%。其余工作未开展。		
下周计划	组件安装 30%，箱变基础完成 100%。箱变就位，桥架安装 80%，1×4 平方线敷设 80%。		
安全文明施工情况	不佩戴安全帽		
施工质量	1、组件存在肩扛、肢体踩压等野蛮施工情况。 2、组件安装不在同一平面上，观感差。		
设备材料进场情况	已进场 705 个组串支架材料 到场材料总量的 100%，交直流电缆进场 100%。桥架进场 95%。		
人员机械情况	施工人员;27 人，泵车 1 辆，吊车 1 辆，叉车 1 辆，手推车 4 辆，铁锹 4 把，振捣棒 1 个。		

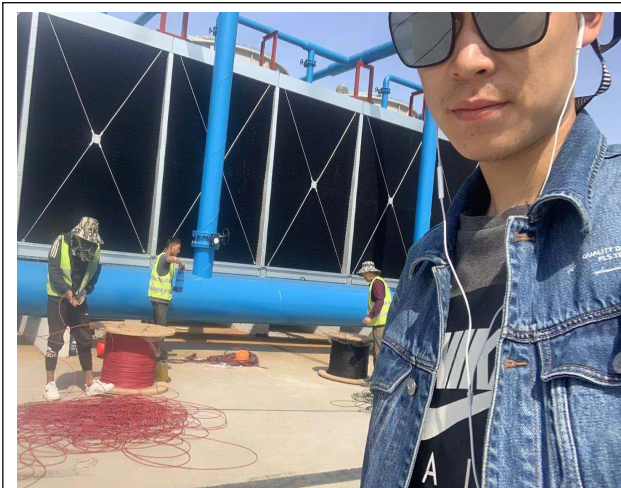

1×4 平方线敷设检查




桥架测量




与业主检查配电室



测量组件高度

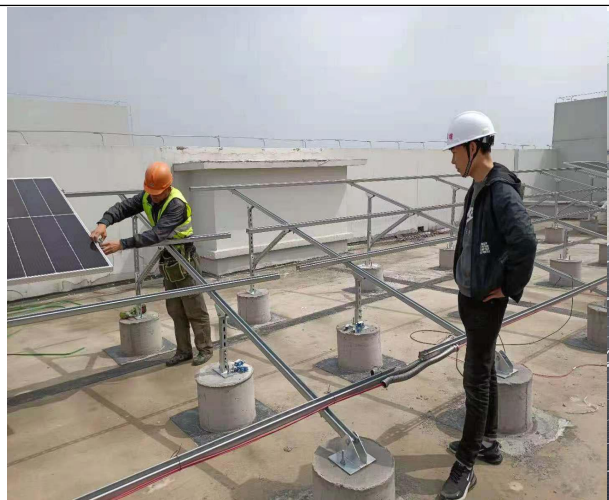

组件安装

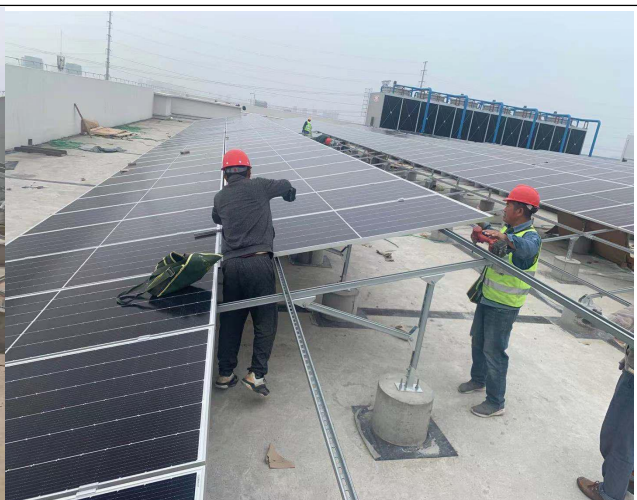

组件安装
