


星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第九期

（2021 年 05 月 09 日-2021 年 05 月 15 日）

工程名称	星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	建设单位	滁州嘉晖新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江西子联合工程有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 本周支架基础混凝土浇筑已全部完成，钢筋笼焊接已全部完成。屋顶防水卷材铺设已全部完成，支架安装已全部完成，箱变基础完成总量的 95%，逆变器安装已全部完成，本周 1×4 平方线敷设全部完成，本周桥架安装 90%，本周组件安装全部完成。箱变就位 高压电缆敷设完成 MC4 接头制作 35%，其余工作未开展。		
下周计划	完成高压侧电缆头制作。MC4 接头制作全部完成。交流电缆敷设全部完成，接地施工完成。		
安全文明施工情况	不佩戴安全帽		
施工质量	1、接地焊接，焊接面烧伤严重，焊接质量较差。 2、支架基础整改不到位。 3、桥架成品保护不到位。		
设备材料进场情况	已进场 705 个组串支架材料 到场材料总量的 100%，交直流电缆进场 100%。桥架进场 100%。		
人员机械情况	施工人员;27 人，泵车 1 辆，吊车 1 辆，叉车 1 辆，手推车 4 辆，铁锹 4 把，振捣棒 1 个。		

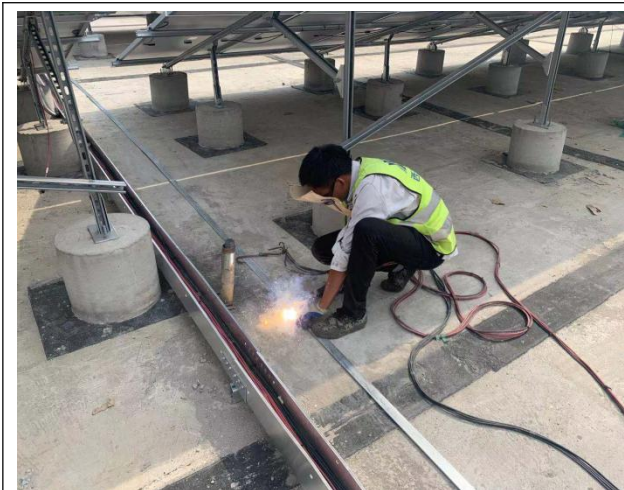

接地扁铁焊接



高压电缆头制作



交流电缆敷设



1×4 平方线整改



接地小黄线安装



交流电缆敷设检查
