

来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程
项目

监 理 周 报


第 一 期

(2021 年 05 月 28 日-2021 年 06 月 04 日)


工程名称	来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目	建设单位	华基新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	天津华焰科技有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 顶管施工完成百分之百，导轨铺设百分之十，其余工作未开展。		
下周计划	导轨铺设全部完成，运维通道全部完成。		
安全文明施工情况	未见文明施工标志标牌 未做临边防护 爬梯未按要求做防护网、个别爬梯不牢固		
施工质量	无		
设备材料进场情况	组件进场 70%、导轨 6.25m 6.35m 到货 100%、夹具到货 100%。		
人员机械情况	施工人员;12 人；		




第一次会议

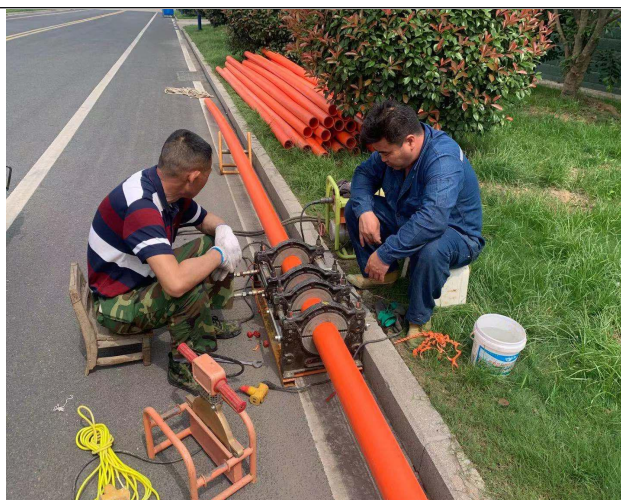

顶管熔接

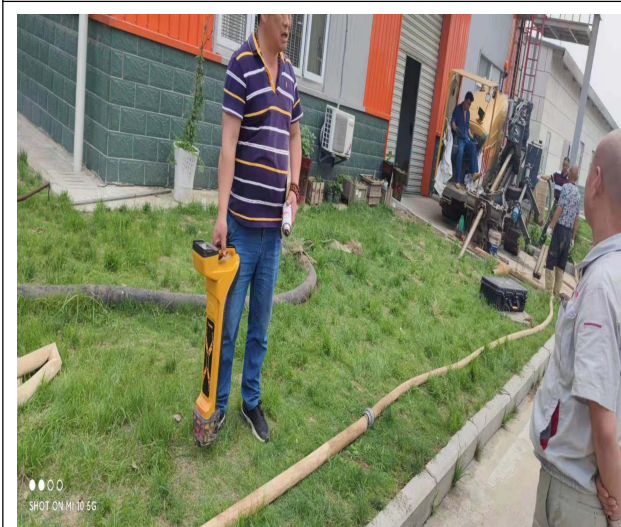

顶管施工

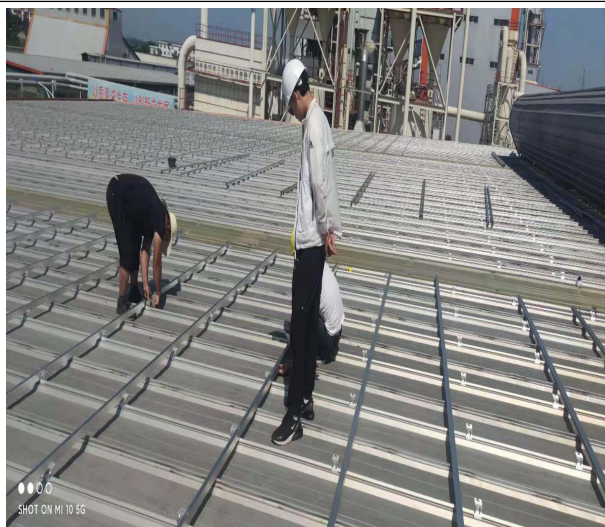

检查导轨铺设



材料检测
