

来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程
项目

监 理 周 报


第 八 期

(2021 年 07 月 17 日-2021 年 07 月 23 日)

工程名称	来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目	建设单位	华基新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	天津华焰科技有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 顶管施工完成百分之百，导轨铺设百分之百，整改导轨安装，运维通道安装百分之百，吊装组件百分之三十。		
下周计划	组件安装完成、电缆敷设 50%。		
安全文明施工情况	无		
施工质量	无		
设备材料进场情况	组件进场 90%、导轨 6.25m 6.35m 到货 100%、夹具到货 100%。逆变器进场 100%，并网柜到货 100%，运维材料到货 100%		
人员机械情况	施工人员;15 人		



运维通道安装

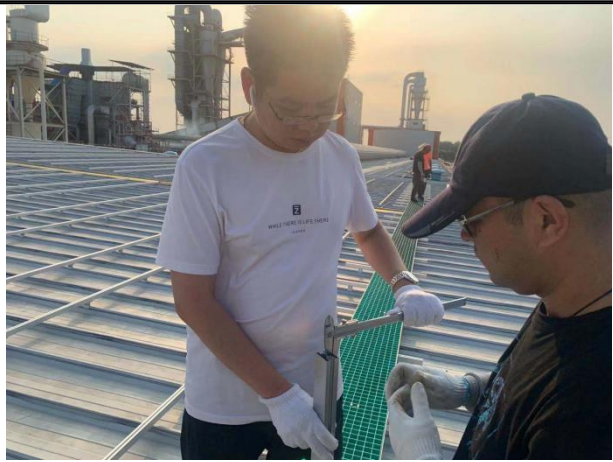

业主对导轨检测




吊装组件



吊装组件安全旁站



协同业主对桥架材料到货检查

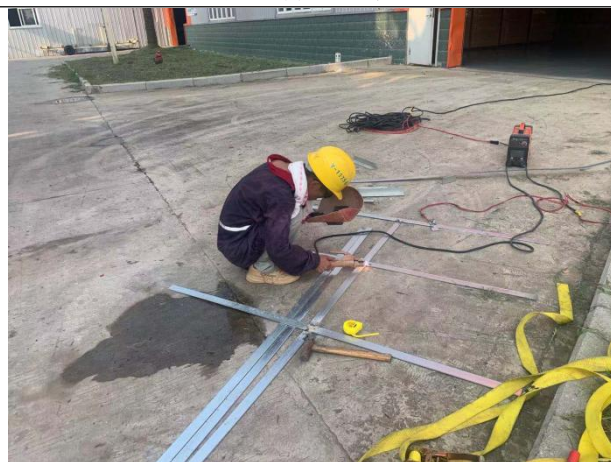

焊接爬梯防护
