



工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

监 理 周 报

2022 年 第 33 期

常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2022.01.10—2022.01.16



监 理 周 报

2022 年 第 033 期

项目名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

填报周期：2022.01.10-2022.01.16

1、2022 年 01 月 10 日到 2022 年 01 月 16 日每天编写监理日记、监理检查记录等；每天对施工现场进行监督管理，履行《监理合同》的责任。

2、编辑打印监理旁站、监理检查记录、审批施工监理资料等。

3、本周（2022.01.10-2022.01.16）天气

日 期	01 月 10 日 星期一	01 月 11 日 星期二	01 月 12 日 星期三	01 月 13 日 星期四	01 月 14 日 星期五	01 月 15 日 星期六	01 月 16 日 星期日
天气情况	晴	多云	多云	多云	多云	多云	多云
施工状态	施工	施工	施工	施工	施工	施工	施工

5、施工进度：

风场道路施工：

风场道路施工全部完成

5.1 风机基础：风机基础累计完成 36 基（共 36 基）、完成 100%。箱变基础累计完成 36 基（共 36 基）、完成 100%。

5.2 送出线路施工：

铁塔基础累计完成 85 基（共 85 基）、完成 100%。铁塔组立累计完成 85 基（共 85 基）、完成 100%。
导线架设累计完成 26km（共 26km）、完成 100%。

5.3 集电线路施工：

箱变安装完成 36 台（共 36 台）；防火封堵完成 36 台（共 36 台）

5.4 升压站电气安装：继保室盘柜二次接线完成。

5.5 风机吊装施工：

（1）风机吊装累计完成 36 台（共 36 台）。

（2）风机电装：累计完成 36 台（共 36 台）。

（3）风机验收：累计完成 32 台（共 36 台）。吊装 1 队完成 23 台（C37 C44 C19 C20 C52 C11 C34 C14 C12 C13 C03 C09 C02 C10 C01 C45 C35 C46 C51 N02 C50 C21 L15），吊装 2 队完成 9 台（C28 C26 C27 C30 C29 N09 N12 L08 N06）。

（4）风机调试：累计完成 32 台（共 36 台）。吊装 1 队完成 23 台（C37 C44 C19 C20 C52 C11 C14 C12



C13 C03 C09 C02 C10 C34 C01 C35 C45 C46 C51 N02 C50 C21 L15), 吊装 2 队完成 9 台 (C28 C27 N09 N12 N06 C30 C29 L08 C26)。

5.6 项目整体进度完成 98.1%。

6、本周施工情况

6.1 现场人员情况:

(1) 项目管理人员: 14 人。

(2) 总人数合计 24 人。

6.2 本周完成情况:

1、升压站施工:

(1) 消缺;

(2) 主控室显示屏安装数据线;

(3) 厨房安装明配电箱。

2、集电线路施工:

(1) 消缺。

3、送出线路施工:

(1) 已带电。

4、风机吊装施工:

(1) N04 C36 机位电装。

(2) 消缺。

7、材料及设备进场情况:

(1) 升压站到货设备: 一次设备全部到货; 二次设备全部到货。

(2) 风机: 塔筒全部到货; 机舱全部到货; 轮毂全部到货; 叶片全部到货。

8、监理项目部本周的工作:

(1)、现场 4 回路箱变测控检查; 监理归档资料收集和整理, 进行查缺补漏;

(2)、现场集电线路 5 回路 26、27、29、30 通信维修; 6 回路箱变, 风机通信维修检查;

(3)、现场集电线路 4.5.6. 回路箱变光纤整理巡查;

(4)、今日在升压站会议室召开现场遗留问题整改协调会议, 要求施工单位对现场整改问题做进度计划,

严格按照时完成;

(5)、对现场箱变相序、高压侧电缆进行检查;

9、下周监理工作计划:

(1) 隐蔽工程签证记录;


(2) 风机、升压站、集电线路消缺监理质量管控力度;



(3) 风机吊装、电气安装施工消缺、升压站电气消缺、集电线路消缺等工程质量管理力度;


(4) 对风机吊装、电气安装等施工消缺项目过程进行监督检查、督促全面做好安全防护警戒措施,做好高处作业个人防护监督检查。

(5) 工程管理资料的报审、完善监督管理。

10、 附现场工作照

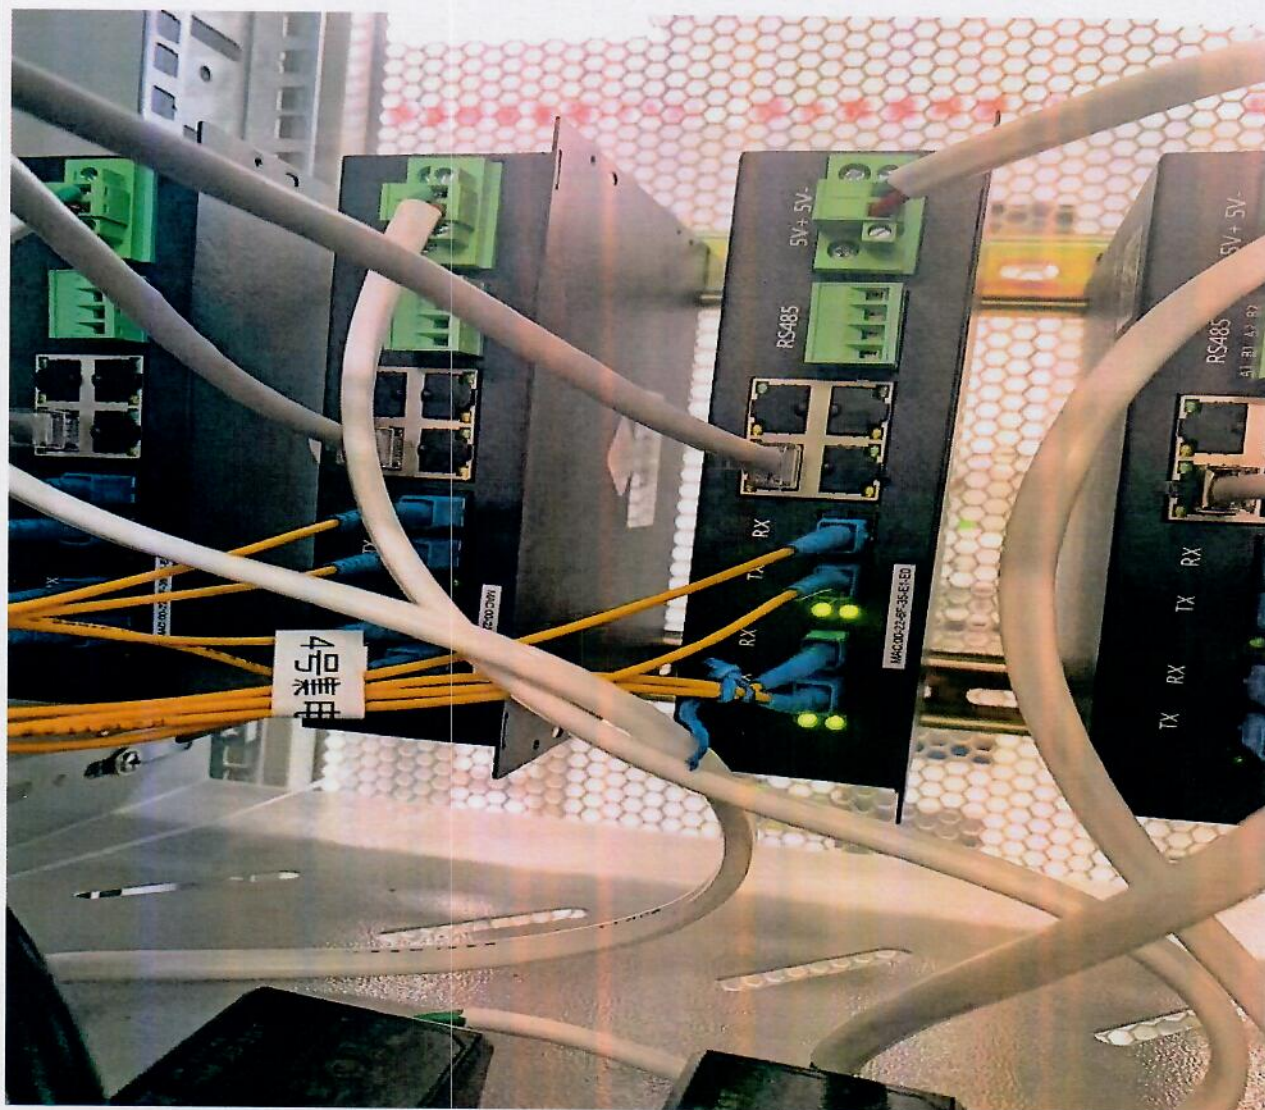

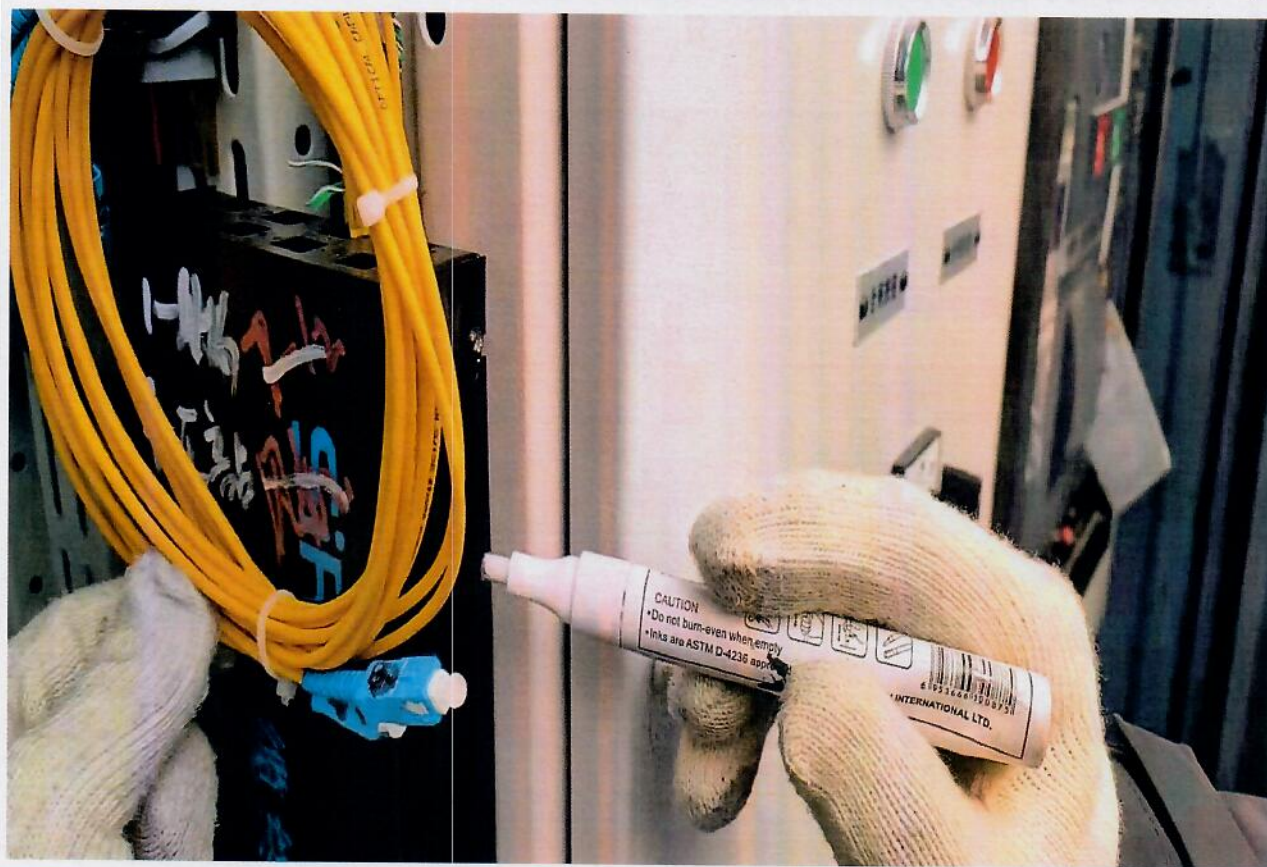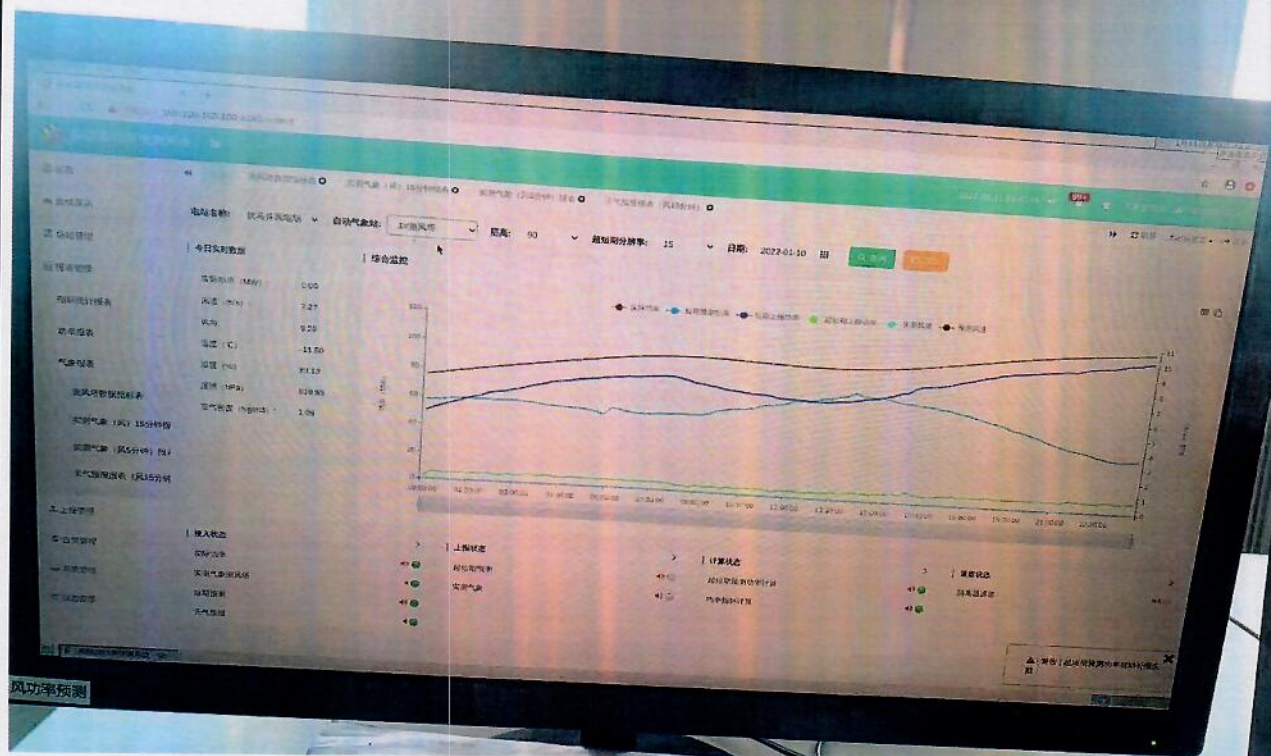

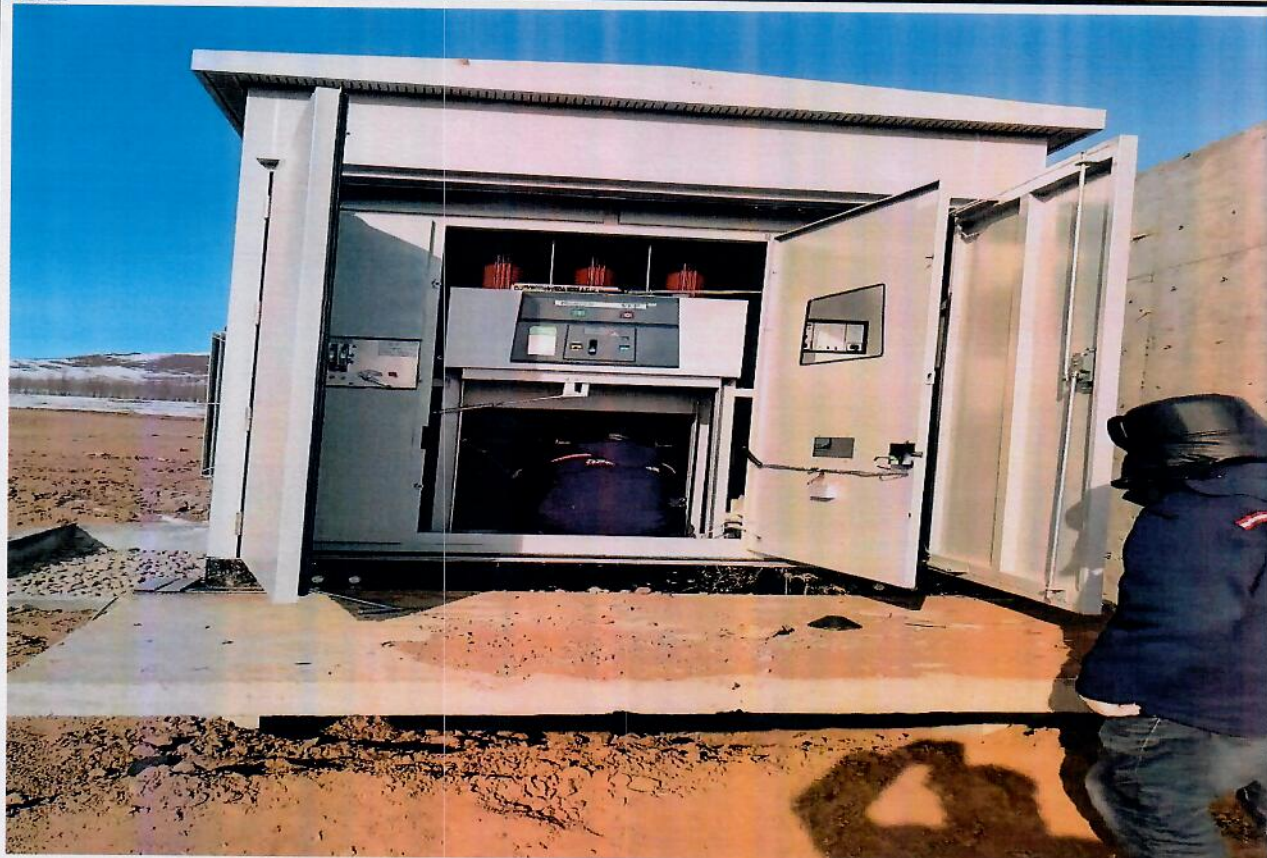

常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2022 年 01 月 16 日
