

合肥融捷能源材料有限公司 2.3MW 分布式光  
伏发电项目

# 监 理 周 报

## 第 六 期

(2021 年 8 月 10 日-2021 年 8 月 15 日)



扫描全能王 创建

|           |                                                                                                                            |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 工程名称      | 合肥融捷能源材料有限公司<br>2.3MW 分布式光伏发电项目                                                                                            | 建设单位 | 合肥微机新能源有限公司 |
| 监理单位      | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                             |      |             |
| 施工单位      | 浙江泰辉新能源科技有限公司                                                                                                              |      |             |
| 本周施工内容及进度 | 1、B8、9、10 直流线到货，B8、B9 组件安装完成。<br>2、逆变器接头制作，桥架安装。<br>3、总体完成 78%，导轨安装完成 100%，组件安装完成 93%，直流放线完成 100%，桥架安装完成 100%，交流电缆、并网柜未到货。 |      |             |
| 下周计划      | 1、B10 组件安装完成。<br>2、交流电缆到货，并网柜到货。<br>3、逆变器接头制作完成，接地系统连接完成。                                                                  |      |             |
| 安全文明施工情况  | 1、进场工人已进行安全三级教育。<br>2、进场工人已佩带好安全帽。<br>3、现场已竖立好安全文明标牌。                                                                      |      |             |
| 施工质量      | 1、对现场组件进行质量验收核对，符合要求。<br>2、检查导轨安装，运维走道敷设查看。<br>3、组件吊装旁站，无问题。                                                               |      |             |
| 设备材料进场情况  | 1、对组件安装进行检查。2、直流线到场。3、逆变器全部到场。                                                                                             |      |             |
| 人员机械情况    | 人员:10 人，管理人员 2 人。                                                                                                          |      |             |








B8 组件安装



B2 逆变器桥架安装

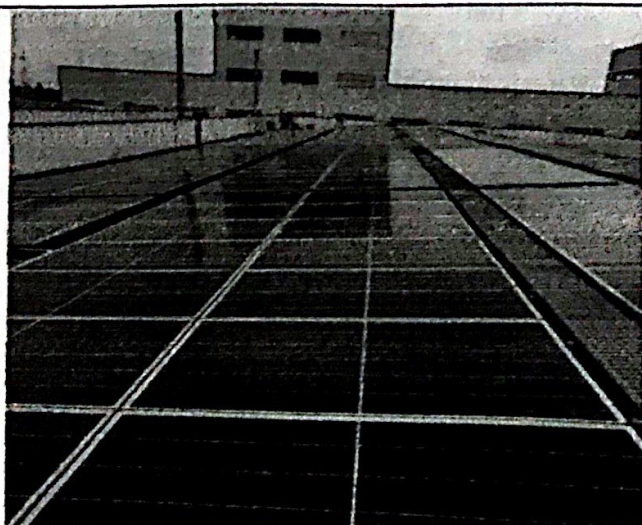

B8 组件安装完成



B2 直流线接头制作

