

# 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

## 监 理 周 报

### 第 5 期

编 制 时 间：2021.08.27

监理单位编制人：李双龙

监理单位审核人：王立杰



常州正衡电力工程监理有限公司

十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目监理部

项目法人：安达市众心新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

光伏区施工单位：博耳能源江苏有限公司

升压站施工单位：德幂能源有限公司

送出线路施工单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司

## 一、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

### 1、本周施工项目部主要完成：

#### （1）光伏区

- ① S5/S8/S9 区域共放点引孔、打桩 1600 根共完成 7310 根
- ② 桩头焊接完成 2100 个累计完成 4100 个
- ③ 箱逆变一体机：1#、2#/3#/4#/8#、砌砖完成，正在支构造柱模板，装备浇筑混凝土
- ④ 光伏支架安装完成 320 组，大组 2\*24 完成 284 组，小组 2\*12 完成 36 组累计完成 395 组

#### （2）升压站

- ① 综合楼顶板钢筋绑扎
- ② 室内电缆沟完成 50%
- ③ 消防水池基础支模钢筋绑扎

#### ④ （3）送出线路

- ① 基础浇筑完成 5#7#59#41#42#6#浇筑完成
- ② 组塔完成 72#72#3#73#

2、监理项目部监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的问题现场及时纠正、整改。

### 3、施工现场无重大安全隐患。

### 三、工程项目进度情况一览表

| 一  | 光伏区施工:              |       |     |      |          |
|----|---------------------|-------|-----|------|----------|
| 序号 | 名称                  | 总量    | 周完成 | 累计完成 | 完成比例 (%) |
| 1  | 道路 (KM)             | 4.2   | 0.2 | 3.7  | 90%      |
| 2  | 支架基础引孔 (MW)         | 55    | 300 | 8900 | 50%      |
| 3  | 支架基础管桩 (MW)         | 55    | 300 | 6600 | 37%      |
| 4  | 支架安装 (MW)           | 55    | 30  | 335  | 12%      |
| 5  | 组件安装 (MW)           | 55    |     |      | %        |
| 6  | 箱、逆变一体机基础浇筑 (台)     | 8     |     | 5    | 50%      |
| 7  | 箱变基础浇筑 (台)          | 6     |     |      | %        |
| 8  | 箱、逆变一体机安装 (台)       | 8     |     |      | %        |
| 9  | 箱变一体机安装 (台)         | 6     |     |      | %        |
| 10 | 汇流箱安装               |       |     |      | %        |
| 12 | 逆变器                 |       |     |      | %        |
| 13 | 35kV 集电线路电缆沟开挖 (km) | 6.775 |     |      | %        |
| 14 | 35kV 集电线路电缆敷设 (km)  | 6.775 |     |      | %        |
| 15 | 光伏 1*4 电缆铺设 (km)    | 60    |     |      | %        |
| 16 | 低压电缆铺设 (km)         |       |     |      | %        |
| 17 | 接地网开挖 (km)          |       |     |      | %        |
| 18 | 接地网焊接及铺设 (km)       |       |     |      | %        |
| 19 | 围栏安装 (km)           | 7     |     |      | %        |

| 二  | 升压站:           |    |     |      |          |
|----|----------------|----|-----|------|----------|
| 序号 | 名称             | 总量 | 周完成 | 累计完成 | 完成比例 (%) |
| 1  | 建筑楼基础降水        | 3  |     | 2    |          |
| 2  | 建筑楼基础开挖        | 3  |     | 2    |          |
| 3  | 建筑楼基础垫层浇筑      | 3  |     | 2    |          |
| 4  | 建筑楼基础承台浇筑      | 3  |     | 2    |          |
| 5  | 建筑楼基础立柱及圈梁绑筋支模 | 3  |     | 1    |          |
| 6  | 设备基础开挖         | 10 |     | 2    |          |
| 7  | 设备基础垫层浇筑       | 11 |     | 2    |          |
| 8  | 设备基础浇筑         | 11 |     | 1.5  |          |

| 三  | 送出线路: |    |     |      |          |
|----|-------|----|-----|------|----------|
| 序号 | 名称    | 总量 | 周完成 | 累计完成 | 完成比例 (%) |

|   |       |    |    |    |     |
|---|-------|----|----|----|-----|
| 1 | 定位放线  | 88 | 13 | 74 | 84% |
| 2 | 土方开挖  | 88 | 13 | 74 | 84% |
| 3 | 支模绑筋  | 88 | 13 | 74 | 84% |
| 4 | 混凝土浇筑 | 88 | 13 | 74 | 84% |
| 5 | 线路组塔  | 88 | 4  | 4  |     |

#### 四、进场材料、构配件、设备

##### 1、光伏区材料设备到场情况：

- ① 支架基础管桩累积到货情况：10560支
- ② 光伏支架到场大约40MW左右

##### 2、升压站材料设备到场情况：

暂无重要材料进场

##### 3、送出线路材料设备到场情况：

- ① 塔材到货情况：17基

#### 4、五、现场人员配置情况

##### 1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：王朝煊、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙

#### 六、施工质量检查情况

| 序号 | 检查验收内容        | 具体内容         | 对应形成文件名称                   |
|----|---------------|--------------|----------------------------|
| 1  | 材料、构配件、设备进场验收 | 1、管桩、立柱、支架   | /                          |
|    |               | 2、           | /                          |
|    |               | 3、           | /                          |
|    |               | 4、           | /                          |
|    |               | 5            | /                          |
| 2  | 监理旁站项目        | 1、送出线路塔基基础浇筑 | 旁站记表<br>61#62#63#64#65#66# |
|    |               | 2、光伏区箱逆变基础浇筑 | 旁站记录表 61#62#65#            |
|    |               | 3、光伏区支架基础打桩  | 旁站记录表 60#63#64#66#67#      |
|    |               | 4、           |                            |
|    |               | 5、           |                            |
| 3  | 施工质量检查记录      | 1、           |                            |
|    |               | 2、           |                            |
|    |               | 3、           |                            |
|    |               | 4、           |                            |

|   |          |         |                                                |
|---|----------|---------|------------------------------------------------|
|   |          | 5、      |                                                |
| 4 | 隐蔽工程质量验收 | 1、混凝土外观 | 平行检查记录 137.122                                 |
|   |          | 2、混凝土浇筑 | 平行检查记录<br>160#164#165#166#167#168#172#173#176# |
|   |          | 3、钢筋绑扎  | 162#163#169#170#171#174#175#177#               |
|   |          | 4、      | /                                              |
|   |          | 5       | /                                              |
| 5 | 分部分项工程验收 | 1、      | /                                              |
|   |          | 2       | /                                              |
|   |          | 3       | /                                              |
|   |          | 4       | /                                              |
|   |          | 5       | /                                              |
| 6 | 其他       | 1       | /                                              |
|   |          | 2       | /                                              |
|   |          | 3       | /                                              |
|   |          | 4       | /                                              |

## 七、施工质量问题

- 1、光伏区：施工质量在控制范围内
- 2、升压站：施工质量在控制范围内
- 3、送出线路：施工质量在控制范围内

## 八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

## 九、沟通协调

## 十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

## 十一、天气统计表。

| 日期<br>天气 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|
| 晴        |    | ✓  | ✓  |    |    |    |    |
| 雨        | ✓  |    |    |    | ✓  | ✓  |    |

|   |  |  |  |   |  |  |   |
|---|--|--|--|---|--|--|---|
| 阴 |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |
| 雾 |  |  |  |   |  |  |   |

## 十二、监理工作统计表：

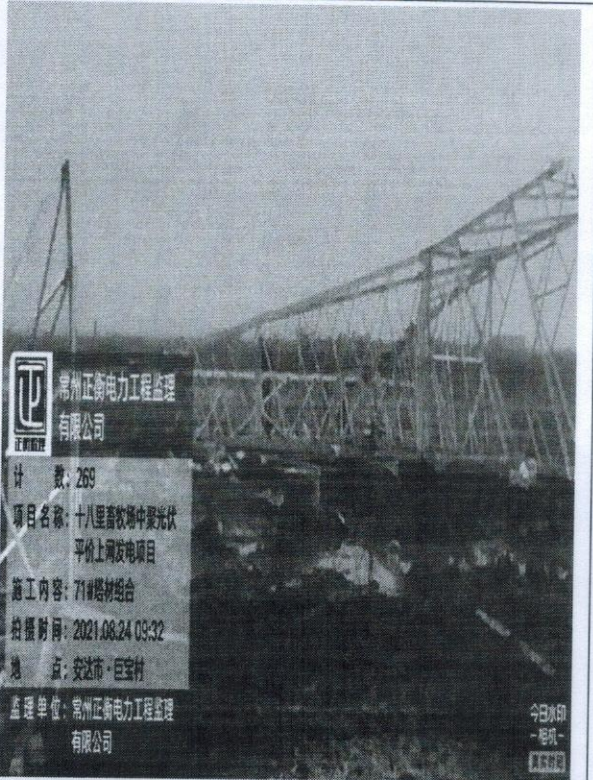
| 序号 | 工作项名称            | 单位 | 本周 | 累计 | 备注 |
|----|------------------|----|----|----|----|
| 1  | 监理会议             |    | 1  | 6  |    |
| 2  | 审批施工组织设计（方案）     |    |    | 1  |    |
| 3  | 审核施工图纸           |    |    | 2  |    |
| 4  | 发出监理通知           |    | 1  | 8  |    |
| 5  | 审批分包单位           |    |    | 1  |    |
| 6  | 原材料审批            |    |    | 2  |    |
| 7  | 构配件审批            |    |    |    |    |
| 8  | 设备审批             |    |    |    |    |
| 9  | 分项（检验批）工程质量验收    |    |    | 26 |    |
| 10 | 分部（子分部）工程质量验收    |    |    |    |    |
| 11 | 不合格项验收           |    |    |    |    |
| 12 | 监理抽查复试           |    |    |    |    |
| 13 | 监理见证取样           |    |    | 13 |    |
| 14 | 清退不合格建筑材料、构配件、设备 |    |    |    |    |

## 十三、本周监理工作小结：

- 1、光伏区在施工箱逆变基础、支架基础、支架安装施工总体质量在控制范围内，文明施工情况也较良好；
- 2、升压站在进行综合楼、电控楼、设备基础支模绑筋、混凝土浇筑施工质量良好，文明施工措施到位；
- 3、送出线路在进行线路基础浇筑施工总体质量在控制范围内。
- 4、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

# 项目监理周报影像文件

## 一、形象进度影像

|      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 20210824 焊接立柱                                                                                                                                                                                                        | 202108024 塔基组合                                                                                                                                                                                                                               |
| 图片   |  <p>常州正衡电力工程监理有限公司<br/>项目名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目<br/>施工内容: 七区焊接立柱<br/>拍摄时间: 2021.08.24 14:54<br/>天气: 多云 24℃<br/>地点: 安达市·Z687</p>    |  <p>常州正衡电力工程监理有限公司<br/>计数: 269<br/>项目名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目<br/>施工内容: 71#塔基组合<br/>拍摄时间: 2021.08.24 09:32<br/>地点: 安达市·巨宝村<br/>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p>     |
| 文字描述 | 20210825 支架安装                                                                                                                                                                                                        | 20210822 消防泵房开挖                                                                                                                                                                                                                              |
| 图片   |  <p>常州正衡电力工程监理有限公司<br/>项目名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目<br/>施工内容: 十四安装光伏支架<br/>拍摄时间: 2021.08.25 08:49<br/>天气: 多云 20℃<br/>地点: 安达市·Z687</p> |  <p>常州正衡电力工程监理有限公司<br/>项目名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目<br/>验收内容: 消防泵房基础开挖<br/>验收人: 贾金光<br/>拍摄时间: 2021.08.22 08:26<br/>地点: 安达市·Z687<br/>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> |

