

十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 周 报

第 10 期

编 制 时 间：2021.10.01

监理单位编制人：李双龙

监理单位审核人：王立杰



常州正衡电力工程监理有限公司

十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目监理部

项目法人：安达市众心新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

光伏区施工单位：博耳能源江苏有限公司

升压站施工单位：德幂能源有限公司

送出线路施工单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司

一、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周施工项目部主要完成：

（1）光伏区

- ① 打桩累计完成 16050 个，引孔累计完成 16050 个
- ② 桩头焊接累计完成 14420 个
- ③ 桩头防腐累计完成 3000 个
- ④ 光伏支架安装累计完成 1500 组
- ⑤ 组件安装 45 组累计完成 1545 组约 39MW
- ⑥ 箱逆变设备安装情况：2#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#吊装完成
- ⑦ 光伏厂区 1#2#3#场区排水
- ⑧ 汇流箱安装 24 个

（2）升压站

- ① SVG 接地变基础钢筋绑扎、浇筑完成
- ② 消防泵房水池墙板支模完成
- ③ GIS 基础钢筋绑扎、支模施工完成
- ④ 厂区北侧道路路基修补完成

（3）送出线路

- ① 基础浇筑完成：12#17#18
- ② 组塔完成 26#27#78#79#63#29#65#32#33#39#15#58#56#完成 15 基累计完成 60 基
- ③ 立塔完成 1#2#3#4#5#6#7#8#29#30#

2、监理项目部监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的问题现场及时纠正、整改。

3、施工现场无重大安全隐患。

三、工程项目进度情况一览表

一	光伏区施工：				
序号	名称	总量	周完成	累计完成	完成比例(%)
1	道路 (KM)	4.2		4.2	100%
2	支架基础引孔 (MW)	55	500	16150	92%
3	支架基础管桩 (MW)	55	300	15975	91%
4	支架安装 (MW)	55	24 组	1555 组	70%
5	组件安装 (MW)	55	80	262	11%
6	箱、逆变一体机基础浇筑 (台)	8		8	100%
7	箱变基础浇筑 (台)	6		6	100%
8	箱、逆变一体机安装 (台)	8		8	%
9	箱变一体机安装 (台)	6	2	4	%
10	汇流箱安装	96	24	24	25%
12	逆变器				%
13	35kV 集电线路电缆沟开挖 (km)	6.775			%
14	35kV 集电线路电缆敷设 (km)	6.775			%
15	光伏 1*4 电缆铺设 (km)	60			%
16	低压电缆铺设 (km)				%
17	接地网开挖 (km)				%
18	接地网焊接及铺设 (km)				%
19	围栏安装 (km)	7			%
二	升压站：				
序号	名称	总量	周完成	累计完成	完成比例(%)
1	建筑楼基础降水	3	1	3	
2	建筑楼基础开挖	3	1	3	
3	建筑楼基础垫层浇筑	3	1	3	
4	建筑楼基础承台浇筑	3	1	3	
5	建筑楼基础立柱及圈梁绑筋支模	3	1	2	
6	设备基础开挖	11	1	8	
7	设备基础垫层浇筑	11	4	9	
8	设备基础浇筑	11	3.5	8	

三	送出线路：				
---	-------	--	--	--	--

序号	名称	总量	周完成	累计完成	完成比例 (%)
1	定位放线	88	2	88	100%
2	土方开挖	88	2	88	100%
3	支模绑筋	88	2	88	100%
4	混凝土浇筑	88	2	88	100%
5	线路塔材组合	88	15	60	68.1%
6	立塔	88	10	10	

四、进场材料、构配件、设备

1、光伏区材料设备到场情况：

- ① 管桩累积到货：16620支
- ② 组件累积到货：11790片
- ③ 高低压电缆全部到场
- ④ 4200KVA箱变到场4个
- ⑤ 3125KVA一体机全部到场
- ⑥ 逆变器到场102台
- ⑦ 汇流箱到场96台
- ⑧ 围栏材料进场

2、升压站材料设备到场情况：

暂无重要材料进场

3、送出线路材料设备到场情况：

- 1、塔材累积到货78基
- 2、金具全部到货
- 3、光纤全部到货
- 4、绝缘子全部到货
- 5、导线到货130000米

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：王朝煊、李小忘、王磊、王道芳、李双龙

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场	1、管桩、立柱、支架、组件	/
		2、	/
		3、	/
		4、	/

	验收	5	/
2	监理旁站项目	1、升压站 SVG、基础接地变底板、GIS 基础浇筑	旁站记录表 SY018、019
		2、光伏区箱变吊装	旁站记录表 103、105、106、107、108
		3、送出线路立塔	旁站记录表 074
3	施工质量检查记录	1、线路对端间隔底板间距有偏差	检查记录表 XL016
		2、线路对端基础根部出现不同程度的麻面	检查记录表 XL017
		3 升压站隔离开关及进线电缆支架基础钢筋安装不符合图纸要求	检查记录表 SY014
		4、GIS 基础柱浇筑使用自拌混凝土并无混凝土配合比强度报告无砂石水泥材料送检报告	检查记录表 SY014
		5、光伏区预制桩根部孔洞回填质量下降与设计 requirements 不符	检查记录表 CQ005
4	隐蔽工程质量验收	1、混凝土外观	平行检查记录
		2、混凝土浇筑	平行检查记录
		3、钢筋绑扎	平行检查记录 202
		4、	/
		5	/
5	分部分项工程验收	1、	/
		2	/
		3	/
		4	/
		5	/

七、施工质量问题

八、安全文明施工

- 1、光伏区：施工质量在控制范围内
- 2、升压站：施工质量在控制范围内
- 3、送出线路：施工质量在控制范围内

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、工程签证：无

十一、天气统计表。

日期	25	26	27	28	29	30	01
天气							

晴	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
雨							
阴							
雾							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		1	10	
2	审批施工组织设计（方案）			27	
3	审核施工图纸			2	
4	发出监理通知		1	12	
5	审批分包单位			3	
6	原材料审批			3	
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收			195	
10	分部（子分部）工程质量验收			19	
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样			36	
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

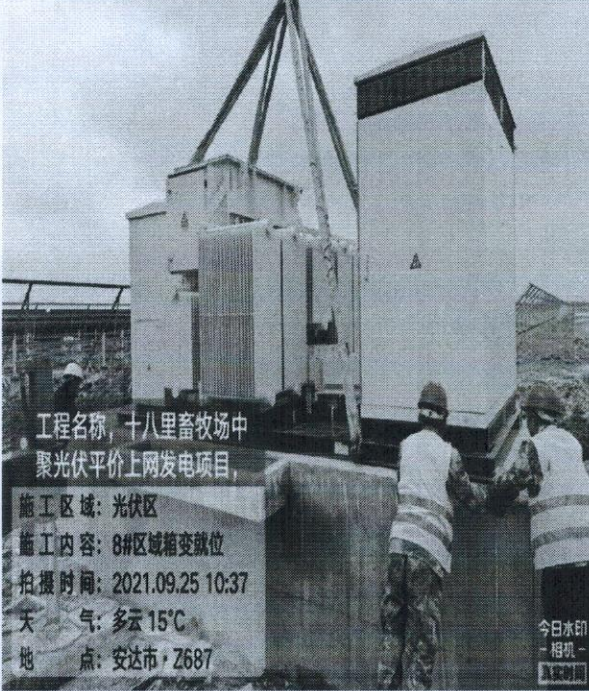
十三、本周监理工作小结：

- 1、光伏区在进行支架安装、组件安装、箱变就位、焊接立柱、打桩、引孔、桩头防腐施工总体质量在控制范围内，文明施工情况也较良好。
- 2、升压站在进行 SVG、接地变底板钢筋绑扎及浇筑完成，GIS 基础施工完成，消防泵房水池墙板支模完成，施工质量良好，文明施工措施到位。
- 3、送出线路在进行铁塔组装、立塔施工总体质量在控制范围内。
- 4、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件



一、形象进度影像

文字描述	光伏区箱变吊装就位	线路铁塔组立
图片	 工程名称：十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目， 施工区域：光伏区 施工内容：8#区域箱变就位 拍摄时间：2021.09.25 10:37 天气：多云 15℃ 地点：安达市·Z687 今日水印相机 真实时间	 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目 施工区域：架空线路 施工内容：线路1#铁塔组立 拍摄时间：2021.09.29 08:47 天气：多云 11℃ 地点：安达市·Z687 今日水印相机 真实时间
文字描述	光伏区组件安装	升压站 GIS 基础浇筑
图片	 工程名称：十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目， 施工区域：光伏区 施工内容：9区组件安装 拍摄时间：2021.09.29 天气：晴 20℃ 地点：我在这里 今日水印相机 真实时间	 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目 施工区域：升压站 施工内容：升压站GIS区域基础浇筑混凝土 拍摄时间：2021.09.29 09:05 天气：多云 12℃ 地点：安达市·Z687 今日水印相机 真实时间
