

江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光 伏发电项目


监 理 周 报

第 一 期


(2021 年 10 月 8 日-2021 年 10 月 10 日)



工程名称	江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目	建设单位	盱眙中恒新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司		
本周施工内容及进度	1、2#导轨安装完成,, 运维走道安装, 组件安装 40%。 2、3#导轨安装完成, 运维走道铺设。		
下周计划	1、2#组件安装完成, 3#组件吊装安装完成。 2、直流线缆敷设完成 70%。 3、运维通道安装完成。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场支架进行质量验收核对, 符合要求。 2、检查导轨安装, 运维走道敷设查看。		
设备材料进场情况	1、对导轨材料进行检查。2、直流线到场。3、桥架到场。		
人员机械情况	人员:10 人, 管理人员 1 人。		

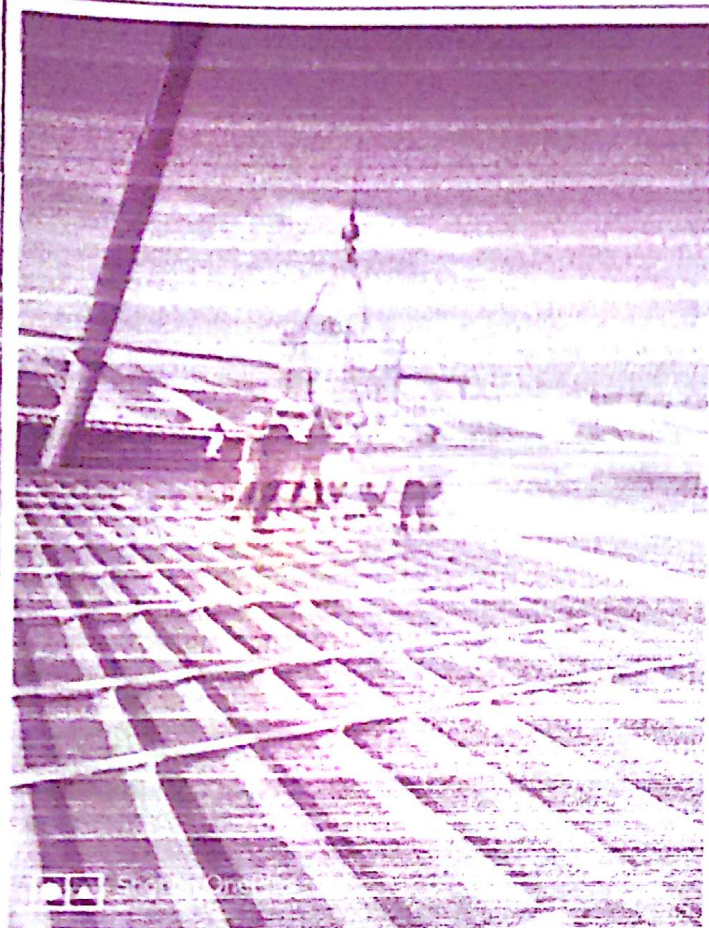


组件吊装

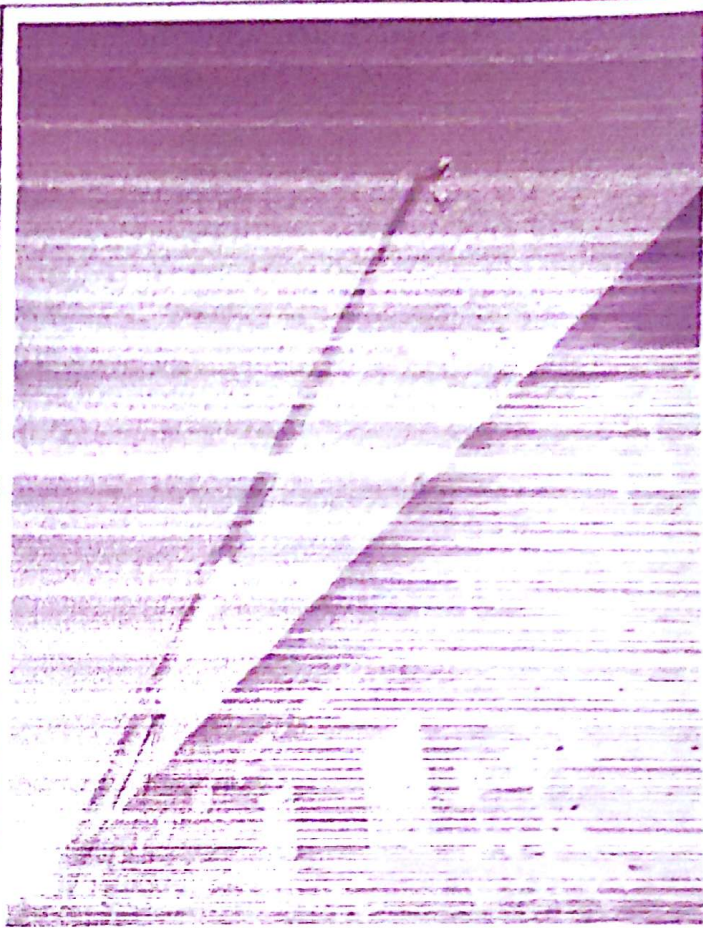

组件吊装



组件分散



组件分散
