

江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光
伏发电项目

监 理 周 报

第 四 期

(2021 年 10 月 25 日-2021 年 10 月 31 日)




工程名称	江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目	建设单位	盱眙中恒新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司		
本周施工内容及进度	1、2#运维走道安装完成 80%，组件安装完成，桥架安装。 2、3#交流桥架敷设；直流放线敷设完成 90%。 3、逆变器到货吊装至屋面。		
下周计划	1、2#运维走道安装完成，逆变器悬挂安装完成。 2、3#直流放线完成，逆变器安装完成。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩戴好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场支架进行质量验收核对，符合要求。 2、检查导轨安装，运维走道敷设查看。		
设备材料进场情况	1、直流线到场。2、桥架到场。3、逆变器到场		
人员机械情况	人员:8 人，管理人员 1 人。		




逆变器到货



3#屋面直流放线

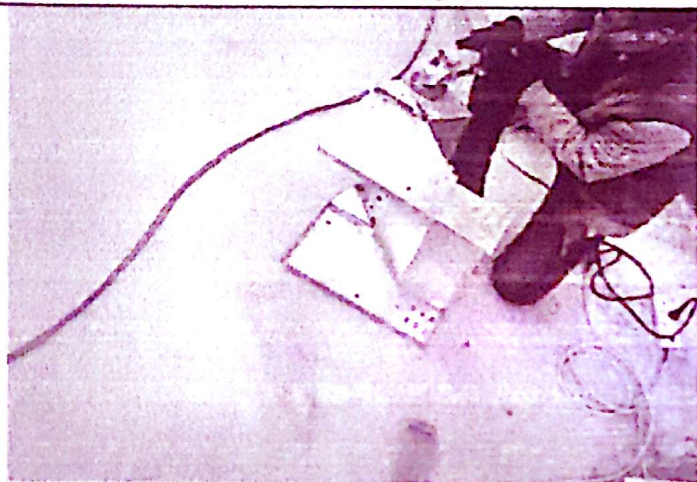

下墙桥架弯头制作

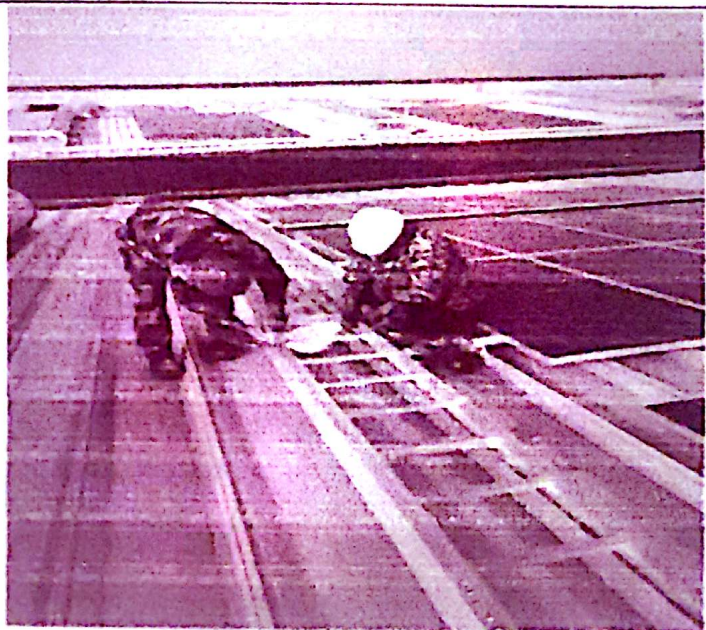

交流桥架安装
