

江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光
伏发电项目

监 理 周 报

第 五 期


(2021 年 11 月 01 日-2021 年 11 月 7 日)




工程名称	江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目	建设单位	盱眙中恒新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司		
本周施工内容及进度	1、2#运维走道安装完成，组件安装完成，直流桥架安装完成。 2、3#交流桥架敷设完成；直流放线敷设完成。 3、交流电缆敷设完成，逆变器悬挂安装完成。		
下周计划	1、2#逆变器悬挂安装完成，交流电缆接线。 2、3#直流组串接线完成，逆变器接线完成。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场支架进行质量验收核对，符合要求。 2、检查导轨安装，运维走道敷设查看。		
设备材料进场情况	1、直流线到场。2、桥架到场。3、逆变器到场		
人员机械情况	人员:6 人，管理人员 1 人。		



交流电缆放线

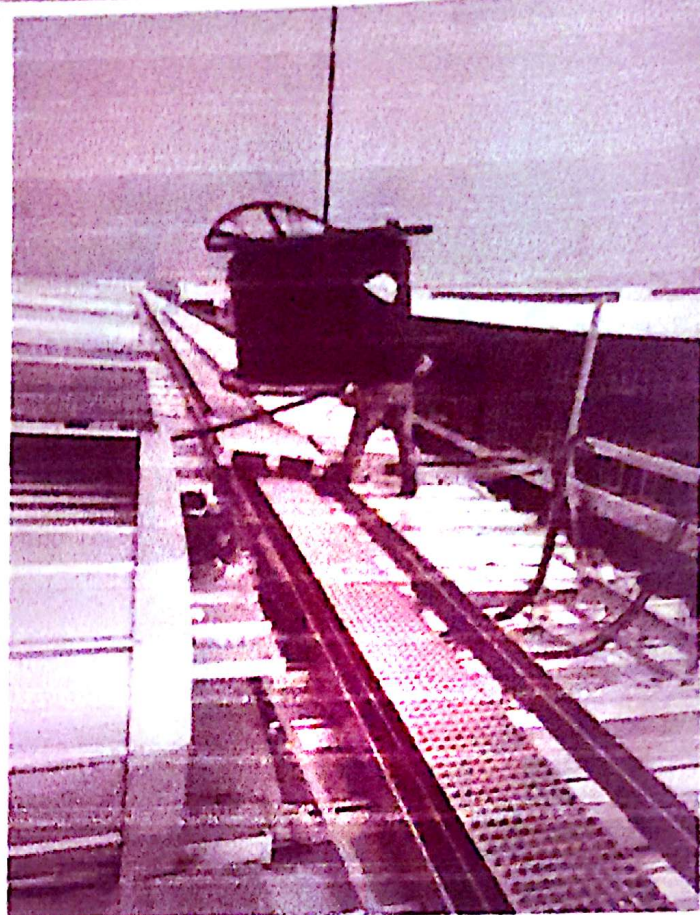

3#屋面交流电缆放线

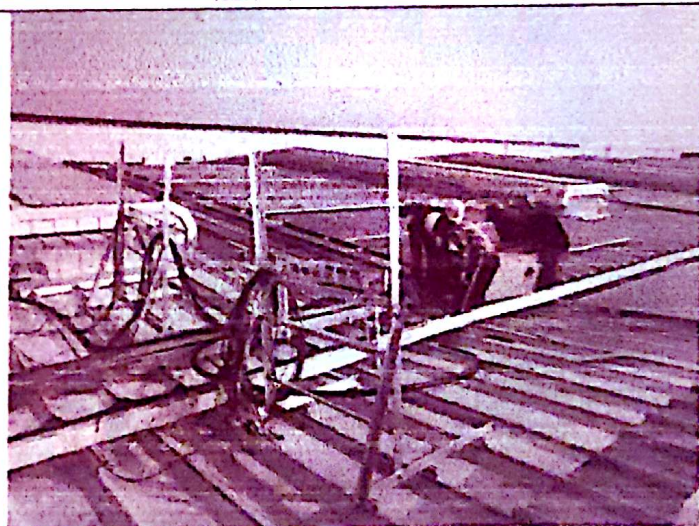

逆变器悬挂安装
