

江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光
伏发电项目


监 理 周 报

第
七
期


(2021 年 11 月 15 日-2021 年 11 月 21 日)



工程名称	江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目	建设单位	盱眙中恒新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司		
本周施工内容及进度	1、2#、3#运维走道安装完成，组件安装完成，桥架安装完成。 2、交流电缆敷设完成，逆变器接线完成。 3、2#、3#接地扁铁连接安装，组串线路绑扎。		
下周计划	1、逆变器防火封堵完成。 2、并网柜电表安装完成。 3、接地扁铁连接完成，组串绑扎完成。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩戴好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场支架进行质量验收核对，符合要求。 2、检查导轨安装，运维走道敷设查看。		
设备材料进场情况	1、直流线到场。2、桥架到场。3、逆变器到场		
人员机械情况	人员:4 人，管理人员 1 人。		

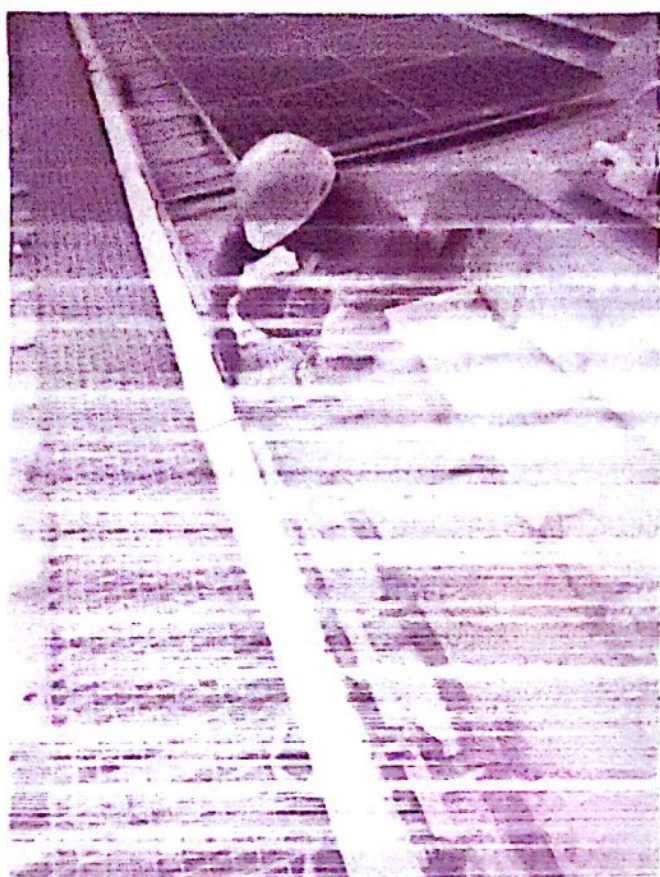

接地扁铁安装

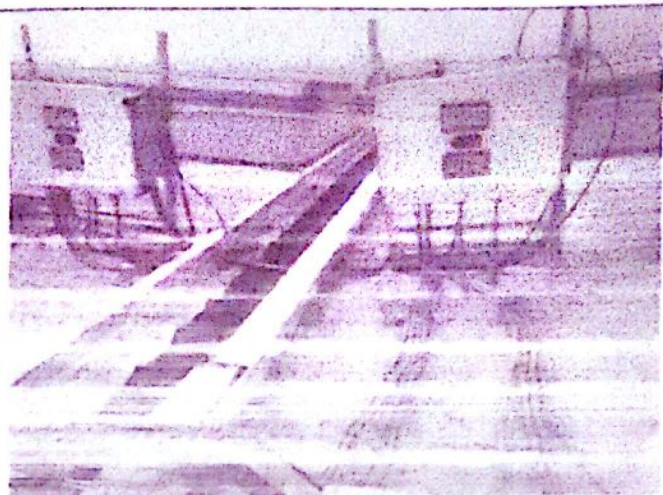

逆变器贴标识



接地扁铁打孔连接

