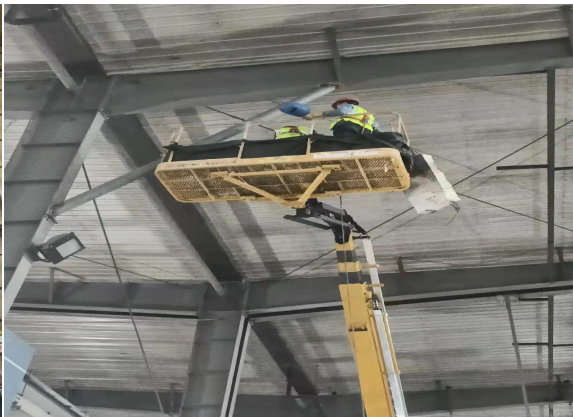
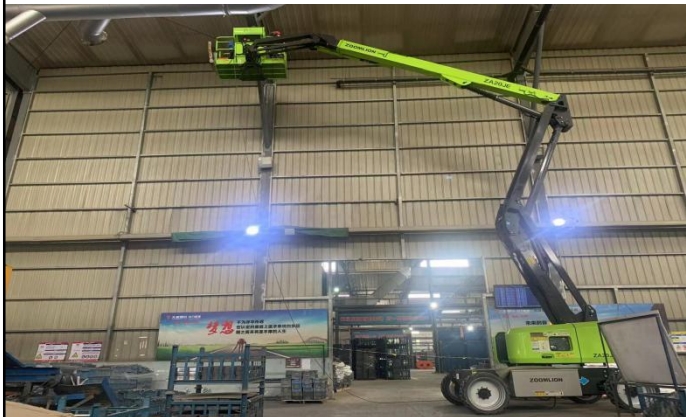


浙江天能动力能源有限公司吴山光储
5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一期）

监 理 周 报

第 二 期

（2021 年 10 月 23 日-2021 年 10 月 29 日）

工程名称	浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一期）	建设单位	长兴智旺新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	海宁科茂微电网技术有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 加固工程施工，本周已完成 45%, 已完成总量的 85%。		
下周计划	撑管加固全部完成。材料进场，组装夹具。		
安全文明施工情况	正常		
施工质量	无		
设备材料进场情况	无		
人员机械情况	施工人员;12 人，举臂车 2 辆。		
			
加固安装			

