

广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

监 理 周 报

（2021 年 10 月 26 日 至 2021 年 11 月 01 日）

第 002 期

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平
大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部

2021 年 11 月 01 日



监 理 周 报

一、参建单位信息

建设单位：连平光伏发电有限公司

设计单位：湖北省电力勘测设计院

总包单位：湖北省电力勘测设计院

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

本周主要工作是场地清表，清表已完成 80%，本项目 2021 年 10 月 30 日正式开工，管桩材料进场 180 根，21 区开始打桩，管桩施工累计完成 40 根，约 0.115MWP，总量 1110 根，累计完成 3.6%。


二、下周计划完成工作量

下周主要工作是场地清表、管桩施工，清表计划全部完成，管桩施工计划完成 300 根。

四、存在问题

因征地等原因，清表施工进度较缓慢，已督促相关单位抓紧协调，采取有效措施加快施工进度。

五、工程影像资料

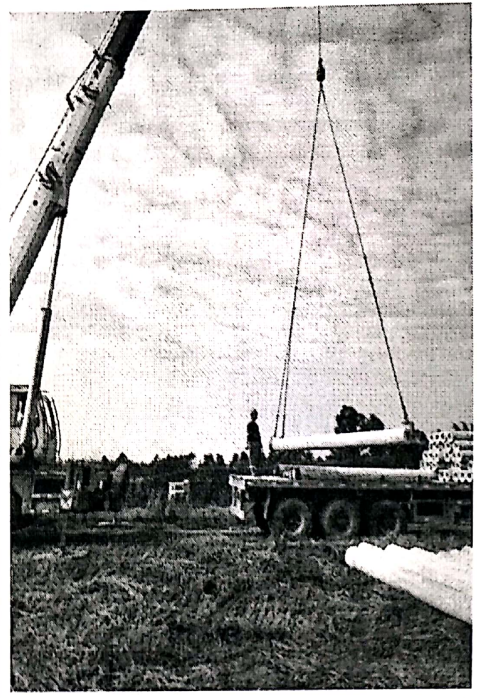
	
21#区打桩施工	进场管桩吊卸



图审和设计交底会议



项目开工仪式

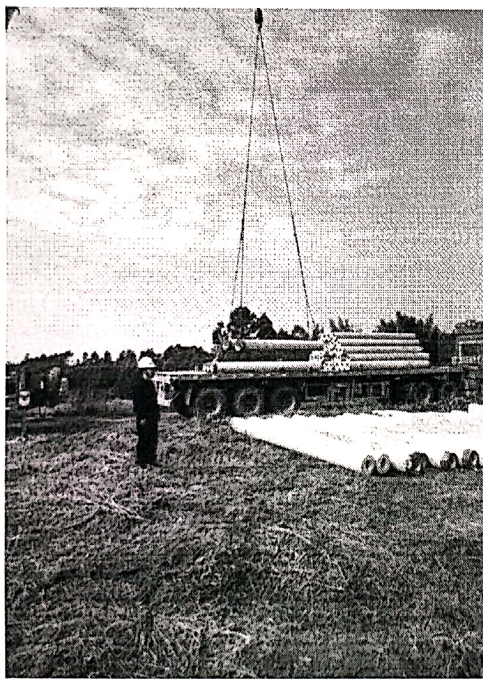

进场管桩吊卸旁站



进场管桩检查
