

广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目 监 理 周 报

（2021 年 11 月 09 日 至 2021 年 11 月 15 日）

第 004 期

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平
大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部

2021 年 11 月 15 日



监 理 周 报

一、参建单位信息

建设单位：连平光伏发电有限公司
设计单位：湖北省电力勘测设计院
总包单位：湖北省电力勘测设计院
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量


本周桩点放位，21#、22#、23#箱变吊装完成，22#、23#区打桩施工，累计完成 900 根，立柱焊接累计完成 500 个；管桩材料进场 960 根，支架材料进场 2.5MW。

下周主要工作是管桩施工、立柱焊接、支架安装，管桩施工全部完成。

四、存在问题

组件材料要尽快进场，已督促相关单位抓紧协调，采取有效措施加快材料进场进度。

五、工程影像资料

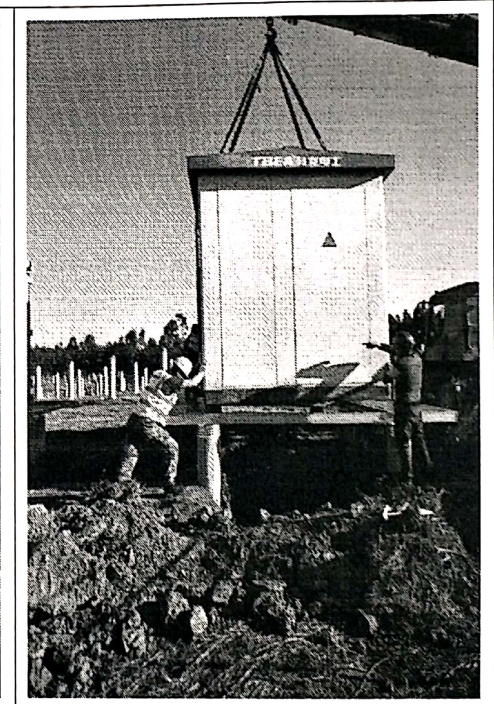
	
23#区打桩施工	22#去箱变吊装




23#区立柱焊接



22#区支架安装

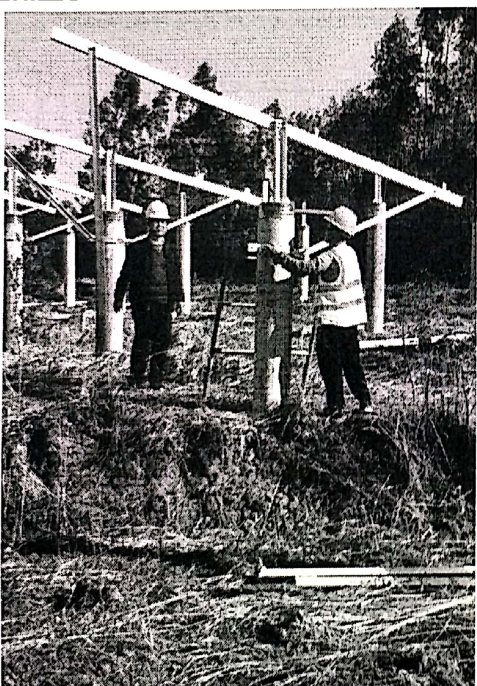

22#区支架安装检查

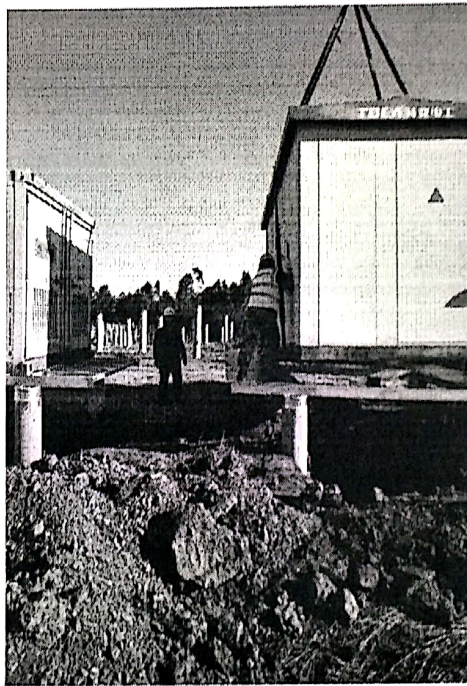

22#区箱变吊装旁站
