

广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

监 理 周 报

（2021 年 11 月 16 日 至 2021 年 11 月 22 日）

第 005 期

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平
大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部

2021 年 11 月 22 日



监 理 周 报

一、参建单位信息

建设单位：连平光伏发电有限公司

设计单位：湖北省电力勘测设计院

总包单位：湖北省电力勘测设计院

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

(1) 管桩施工全部完成；总共 1185 根，容量为 3.794MW；

(2) 支架安装已完成 21#、22#、23#区，总容量为 3.572MW；

(3) 21#、22#、23#箱逆变全部安装完毕及平台防腐施工完毕；

(4) 21#、22#、23#区汇流箱安装完毕；

(5) 21#接地沟开挖完成 40%；

(6) 21#电缆沟开挖完成 50%。

三、下周工作计划

下周主要工作是升压站水渠区域支架安装，光伏区 21#防雷接地扁铁安装，光伏区 21#交直流电缆敷设，集电线路电缆沟开挖。

四、存在问题

组件材料要尽快进场，已督促相关单位抓紧协调，采取有效措施加快材料进场进度。

五、工程影像资料




21#区打桩施工



23#区汇流箱安装施工




23#区立柱焊接

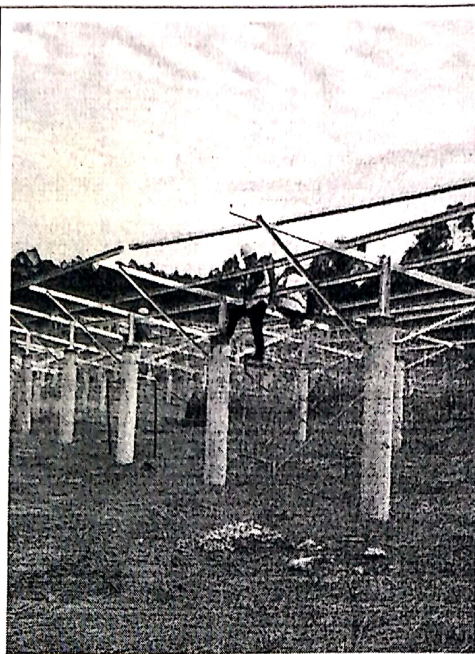

23#区支架安装



22#区接地网沟检查

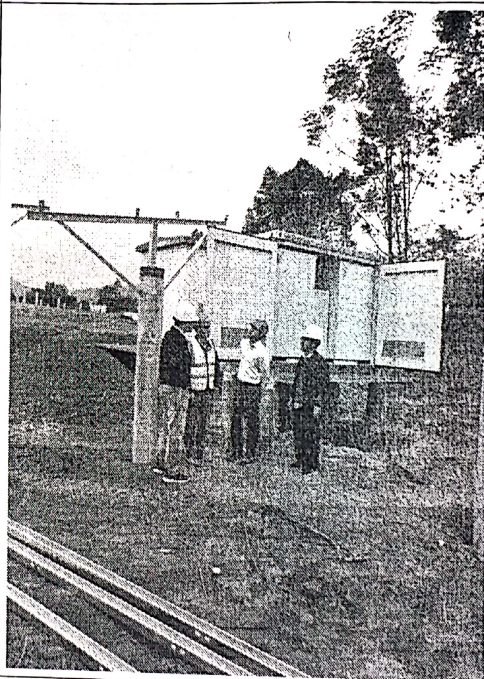

现场安全大检查
