

广州发展连平大湖（一期24MW）农业光伏发电项目

监 理 周 报

（2021年11月30日至2021年12月06日）

第007期

总监理工程师： 李俊平

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平

大湖（一期24MW）农业光伏发电项目监理项目部

2021年12月06日



监 理 周 报

一、参建单位信息

建设单位：连平广发光伏发电有限公司

设计单位：湖北省电力勘测设计院

总包单位：湖北省电力勘测设计院

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

- (1) 支架安装已完成;
- (2) 22#区组件安装, 累计完成 0.65MW;
- (3) 21#、22#逆变器-箱变低压电缆安装;
- (4) 22#接地沟、电缆沟开挖完成;
- (5) #21 区-1#高压电缆敷设完成;
- (6) 21#、23#接地沟开挖, 完成 20%。


三、下周工作计划

下周主要工作是 21#区、23#区的 2*50 的电缆和 485 电缆敷设完成。

四、存在问题


组件材料要尽快进场, 已督促相关单位抓紧协调, 采取有效措施加快材料进场进度。

五、工程影像资料

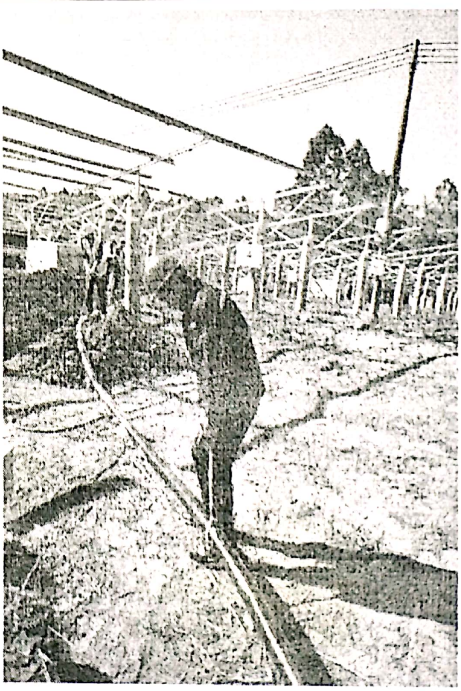
	
21#区-1#区箱变电缆沟开挖	21#区-1#区箱变电缆敷设




21#区-1#区箱变电缆沟铺砖

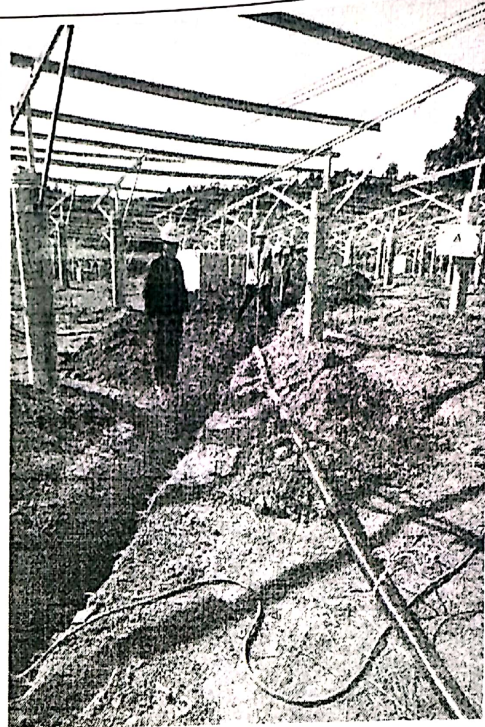

21#区-1#区箱变电缆敷设检查

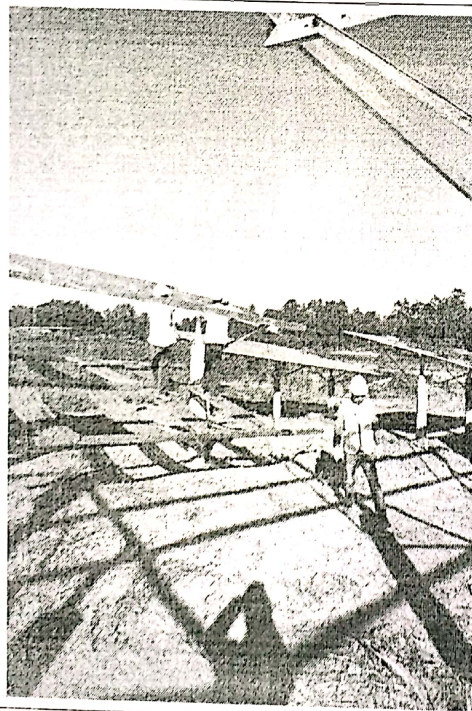

22#区支架檩条调整

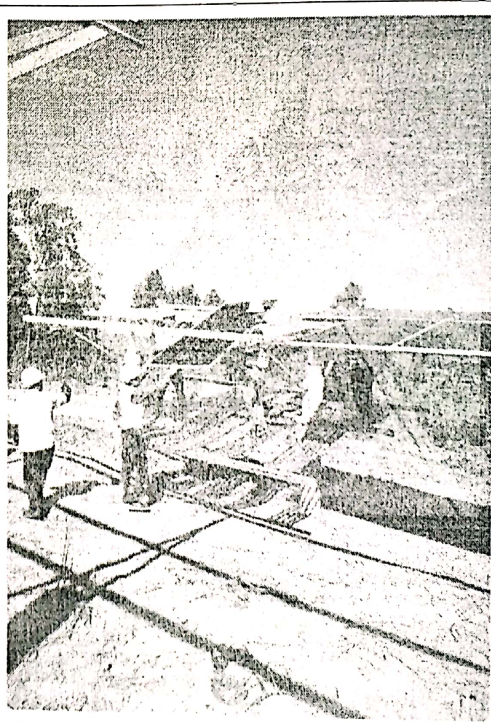

22#区组件安装
