

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

项目周报

(第二十七期)

2022 年 05 月 27 日

—

2022 年 06 月 02 日

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘
60MW 光伏发电项目监理项目部

2022 年 06 月 02 日

1、本周项目进展情况

1) 光伏区施工进度:

一标段光伏区:

1) 1区-18区、30区相关质量缺陷整改。2) 运维道路施工 30%。

二标段光伏区:

1) 运维道路正在修筑累计完成约 70%。2) 19#-29#光伏方阵支架、组件、电缆线消缺整改。

2) 升压站施工进度:

1) 综合楼二层墙面、地面砖施工。2、综合楼门窗安装 40%。

3) 线路施工进度:

1) 已全部施工完成。

4) 主材料、设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	PHC 管桩	24373 根	0 根	24373 根	广西建华、徐闻鼎力
2	640W 双玻组件	110940 块	0 块	110423 块	合肥通威
3	635W 双玻组件	38413 块	0 块	38413 块	合肥通威
4	645W 双玻组件	32282 块	0 块	32282 块	合肥通威
5	1*4 电缆线	743000 米	0 米	743000m	湖州上辐电线电缆高技术有限公司
6	低压交流电缆	66656 米	0 米	65226m	江苏长峰电缆有限公司
7	高压电缆	16509 米	0 米	16509 米	江苏长峰电缆有限公司
8	支架	115MW	0MW	115MW	江苏火蓝电气有限公司
9	逆变器	110 台	0 台	355 台	阳光电源、华为、特变
10	箱变	29 台	0 台	29 台	宁波奥克斯
11	主变	1 套	0 套	1 套	江苏华鹏
12	SVG	1 套	0 套	1 套	江苏天合清特
13	GIS	1 套	0 套	1 套	河南平高
14	接地变	1 台	0 台	1 台	山东泰开

15	站用变	1台	0台	1台	江苏明德
----	-----	----	----	----	------

5) 安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员个别人员未佩戴安全帽，经监理人员要求已佩戴整齐。升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

6) 阶段验收

本周无验收工作。

2、下周工作计划

1) 光伏区施工

一标段部分：

1) 1#-18#、30#方阵电气施工。2) 现场消缺整改。

二标段部分：

1) 19#-29#方阵消缺整改。运维道路施工。

升压站施工：

1) 综合楼二层地面砖完成 100%。2) 综合楼屋面施工完成。3) 相关装修材料等待进场。

3、存在问题及需要协调事宜

1、无。

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工	2021. 12. 15	
首个光伏发电单元开始安装	2022. 01. 23	
开关站基础平台开始施工	2022. 01. 03	
开关站受电	2022. 01. 23	
首个光伏发电单元发电	2022. 01. 23	
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行	/	
项目整体正式移交生产	/	


5、现场影像资料



一标段光伏区垃圾清理



二标段光伏区运维道路修建

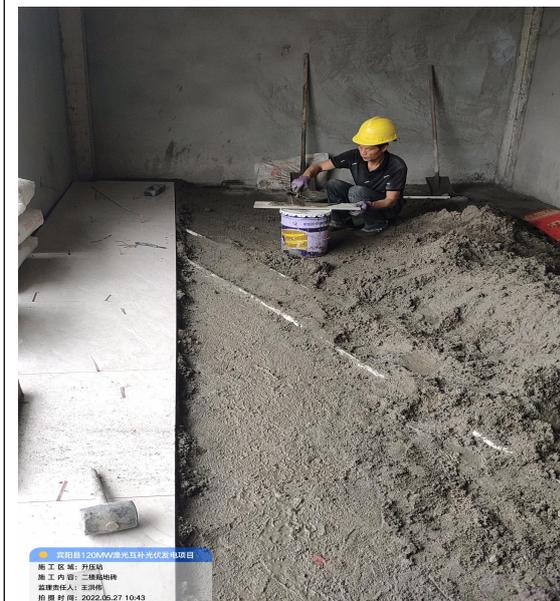

升压站综合楼二层地面砖施工



升压站综合楼卫生间防水施工
